

የፌዴራል ዋና አዲተር መስሪያ ቤት

**በኢትዮጵያ ፕላንና ልማት ሚኒስቴር
የመንግስት ፕሮጀክቶች ክትትልና ቁጥጥር
ሥርዓት አፈጻጸም ላይ የተከናወነ የክዋኔ
አዲት ሪፖርት**

የ ፌ ዴ ራ ል ዋ ና ኦ ዲ ተ ር መ / ቤ ት
Office of the Federal Auditor General

ሚያዝያ 2017

አዲስ አበባ

ማውጫ

ማውጫ	I
ክፍል አንድ.....	1
መግቢያ.....	1
የፕላንና ልማት ኮሚሽን አመሰራረት	1
የፕላንና ልማት ሚኒስቴር አመሰራረት	2
የፕላንና ልማት ሚኒስቴር የተቋቋመበት ዓላማ፣ ራዕይ እና ተልዕኮ	3
ራዕይ	3
ተልዕኮ	3
የፕላንና ልማት ሚኒስቴር ስልጣንና ተግባራት	4
የፕላንና ልማት ሚኒስቴር ድርጅታዊ መዋቅር እና የሰው ኃይል	6
ድርጅታዊ መዋቅር	6
የሰው ኃይል	6
የፋይናንስ ምንጭ	7
የአዲቱ አላማ	7
የአዲቱ ወሰን	7
የአዲቱ ዘዴ	7
ለክዋኔ አዲቱ የተመረጠው የአዲት አካባቢ	8
የአዲቱ የትኩረት አቅጣጫዎች (Audit Issues)	8
የአዲት መመዘኛ መስፈርት (Evaluative criteria)	9
ክፍል ሁለት	10
የአዲት ግኝቶች	10
የመንግስት ፕሮጀክቶች ወደ ትግበራ ከመግባታቸው በፊት የአዋጭነት ጥናት መደረጉን በተመለከተ	10
ፕሮጀክቶች ወደ ትግበራ ከመግባታቸው በፊት የአካባቢና የማህበራዊ ተጽዕኖ ግምገማ መደረጉን በተመለከተ:	14
እንዲተገበሩ ጥያቄ የሚቀርብላቸው ፕሮጀክቶች ዝርዝር የአዋጭነት ግምገማ መከናወኑን በተመለከተ:	17
ፕሮጀክቶች በበጀት ከመካተታቸው በፊት የፕሮጀክቶች አስፈጻሚ አካል የፊዚካልና የፋይናንሻል እቅድ መርሃ ግብር ማዘጋጀታቸውን በተመለከተ:	19
የመንግስት ፕሮጀክቶች በታቀደላቸው ጊዜ መጠናቀቃቸውን በተመለከተ	22
የመንግስት ፕሮጀክቶች በታቀደላቸው በጀት (ወጪ) መጠናቀቃቸውን በተመለከተ	25
የመንግስት ፕሮጀክቶችን በተመለከተ ክትትል እና ግምገማ ማድረጉን በተመለከተ	30

በአስፈጻሚ አካላት ዝቅተኛ አፈጻጸም ያላቸውን የመንግስት ፕሮጀክቶች በመገምገም ግብረመልስ መስጠቱን በተመለከተ	38
ማንኛውም የፌዴራል መንግስት ፕሮጀክት ከፕሮጀክት ከጽንሰ ሀሳብ ጀምሮ እስከ ሚጠናቀቅበት ድረስ ያለው መረጃ የሚይዝበትና ልውውጥ የሚደረግበት ዘመናዊ የመረጃ አያያዝ ሥርዓትና ቋት መዘጋጀቱን በተመለከተ.....	40
የመንግስት ፕሮጀክቶችንና ፕሮግራሞችን የሚመለከታቸውን ባለድርሻ አካላትን በማቀናጀትና በማሳተፍ በጋራ ሊገመገምና ግብረመልስ መስጠቱን በተመለከተ.....	41
ክፍል ሶስት.....	44
መደምደሚያ ሀሳብ.....	44
የማሻሻያ ሀሳብ.....	46
አባሪ አንድ: የመስሪያ ቤቱ ድርጅታዊ መዋቅር	i
አባሪ ሁለት: የመመዘኛ መስፈርቶች (Evaluative Criteria).....	ii
አባሪ 3 : የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት ከእቅድ በላይ የተከለሰ.....	v
አባሪ 4: ከመጀመሪያው ውል በላይ ተጨማሪ በጀት የተመደበላቸው መስኖ ፕሮጀክቶች	vii
አባሪ 6: ከመጀመሪያው ውል በላይ ተጨማሪ በጀት የተመደበላቸው አዲስ አበባ ዩንቨርሲቲ የግንባታ ፕሮጀክት	xi
አባሪ 7: ሳይከናወኑ ነገር ግን በጀት የተያዘላቸው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የግንባታ ፕሮጀክቶች ዝርዝር	xii
አባሪ 8.....	xiii
የድሬዳዋ ዩንቨርሲቲ ከ2014-2016 ዓ.ም ያልተከናወኑ ነገር ግን በጀት የተመደበላቸው የግንባታ ፕሮጀክቶች ብዛት	xiii
አባሪ 9.....	xiv
ከ2013-2016 ዓ.ም ከተጠናቀቁ ከአንድ አመት እስከ ሶስት አመት ለሆናቸው በጀት በየአመቱ የሚያዝላቸው የዋቻዎ ዩንቨርሲቲ የግንባታ ፕሮጀክቶች ዝርዝር	xiv
አባሪ 10.....	xvi
ከ2013-2016 ዓ.ም ከተጠናቀቁ ከአንድ አመት እስከ ሶስት አመት ለሆናቸው በጀት በየአመቱ የሚያዝላቸው የወላይታ ሶዶ ዩንቨርሲቲ የግንባታ ፕሮጀክቶች ዝርዝር	xvi
አባሪ 11: መጠናቀቅ ከሚገባቸው ግዜ በላይ ከ 1 እስከ 7 አመት የፈጁ የመንገድ ፕሮጀክቶች	xvii
አባሪ 12: የመስኖ ፕሮጀክት መጠናቀቅ ከሚገባቸው ግዜ በላይ የፈጁ እና መረጃ ያልቀረበ ፕሮጀክቶች ዝርዝር መረጃ.....	xxvii
አባሪ አስራ ሦስት የአሰራር ሥርዓት መግለጫ /Process Description/.....	xxx
አባሪ 14: የተከለሱ ዶክመንቶች.....	xxxii

የክዋኔ ኦዲቱ ዋና ዋና ግኝቶችና የማሻሻያ ሃሳቦች ማጠቃለያ (Executive Summery)

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት የመንግሥት ፕሮጀክቶች ክትትልና ቁጥጥር ሥርዓት አፈጻጸም ኢኮኖሚያዊና ቀልጣፋ በሆነ መልክ መከናወኑን እና ውጤታማ መሆኑን ማረጋገጥ እና የአሰራር ክፍተቶችን እና የችግሮችን መንስኤ በመለየት የማሻሻያ ሀሳቦችን በማቅረብ ተጠያቂነት እንዲጠናከር ለማድረግ ይህን የክዋኔ ኦዲት አካሂዷል፡፡

የክዋኔ ኦዲቱ የተከናወነው በአለም አቀፉ የዋና ኦዲተሮች ማህበር የተዘጋጀውን አለምአቀፍ የክዋኔ ኦዲት ስታንዳርዶች (ISSAI 300 እና 3000) እና ለመ/ቤታችን በአዋጅ ቁጥር 982/2008 በተሰጠው ስልጣን መሰረት ሲሆን፤ ዝርዝር ኦዲቱ የሸፈነው ከ2014 እስከ 2017 የሁለተኛ ሩብ ዓመት ድረስ ያሉ የሚኒስቴር መ/ቤቱና የፕሮጀክቶች የሥራ ክንውኖችን ላይ ነው፡፡

በመሆኑም በክዋኔ ኦዲቱ የታዩ ዋና ዋና ግኝቶችና የማሻሻያ ሃሳቦች እንደሚከተለው ቀርበዋል፡፡

- የፕላንና ልማት ሚኒስቴር የፕሮጀክቶችን አፈጻጸም የሚመለከቱ ተግባራትን በአዋጅ ቁጥር 1210/2012 እና በአዋጅ ቁጥር 1263/2014 ወደ እርሱ ሲተላለፍ ከገንዘብ ሚኒስቴር ፕሮጀክትን የሚመለከቱ ሰነዶችን ርክክብ አላደረገም


- ለሚያከናውኗቸው የግንባታ ፕሮጀክቶች የአዋጭነት ጥናት ያላከናወኑ አስፈጻሚ ተቋማት መገኘታቸው፤



- የፕሮጀክቶች አዋጭነት ለፕላን ሚኒስቴር ቀርቦ ይሁንታ አግኘተው በጀት እንዲመደብላቸው ለገንዘብ ሚኒስቴር ስለመተላለፋቸው ማሰረጃ ያልቀረበላቸው ፕሮጀክቶች መኖራቸው፤

- ከፕላን ሚኒስቴር ይሁንታ ሳያገኝ እና ቅደም ተከተል ውስጥ ሳይገቡ ነገር ግን ከገንዘብ ሚኒስቴር በጀት ተመድቦላቸው ወደ ትግበራ የገቡ ፕሮጀክቶች በኦዲቱ ወቅት መገኘታቸው፡፡

- የአካባቢ ተጽዕኖ ግምገማ ሳይሰራላቸው ወደ ትግበራ የገቡ ፕሮጀክቶች መኖራቸው፤


የአዋጭነት ጥናት ሳይከናወን እ.ኤ.አ. 2020 ጀምሮ የተጀመሩ የፕሮጀክት ብዛት



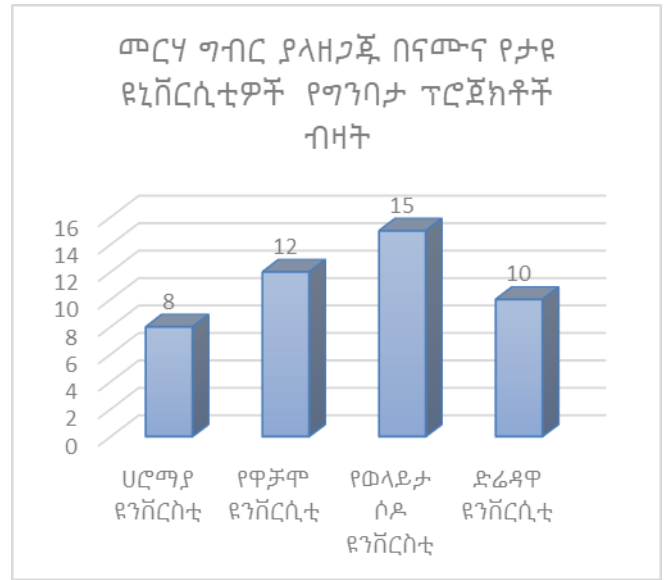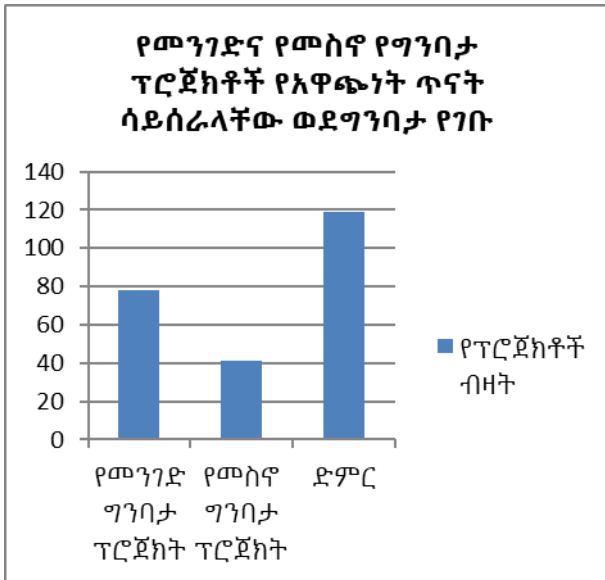


- 52 የመንገድ ፕሮጀክቶች፣ እና 42 የመስኖ ፕሮጀክቶች ለሚኒስቴር መ/ቤቱ ቀርበው የአዋጭነት ግምገማ ሳይደረግላቸው ይሁንታ ሳያገኙ ወደ ትግበራ የገቡ መኖራቸው፤ የኢትዮጵያ መንገድ አስተዳደር እና የመስኖ እና ቆላማ ሚኒስቴር ለሚመለከታቸው የስራ ሀላፊዎች ስለሁኔታው ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ ከ2015 ዓ.ም በፊት የተሰሩ ስራዎች የአዋጭነት ግምገማ ያልተደረገላቸው መሆኑን መግለጻቸው፤
- በኦዲቱ ወቅት በናሙና ከታዩ ዩኒቨርሲቲዎች በተገኘ መረጃ መሠረት 2013-2016 ዓ.ም. የተጀመሩ ሀሮማያ ዩኒቨርሲቲ 8 የግንባታ ፕሮጀክቶች፣ የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ 15 የግንባታ ፕሮጀክቶች፣ የዋቻሞ ዩኒቨርሲቲ 12 የግንባታ ፕሮጀክቶች፣ ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ 10 የግንባታ ፕሮጀክቶች፣ በድምሩ 45 ፕሮጀክቶች የፊዚካልና የፋይናንሺያል እቅድ መርሀ ግብር ያልተዘጋጀላቸው መሆኑን መግለጻቸው፤


- ከተከለሱ በናሙና ከታዩ ሰነዶች መረዳት እንደተቻለው ከ4 ዩኒቨርሲቲዎችና የመስኖ ፕሮጀክቶች 147 የሚሆኑ ፕሮጀክቶች ከአንድ አመት እስከ 7 አመት የዘገዩ መሆናቸው፤

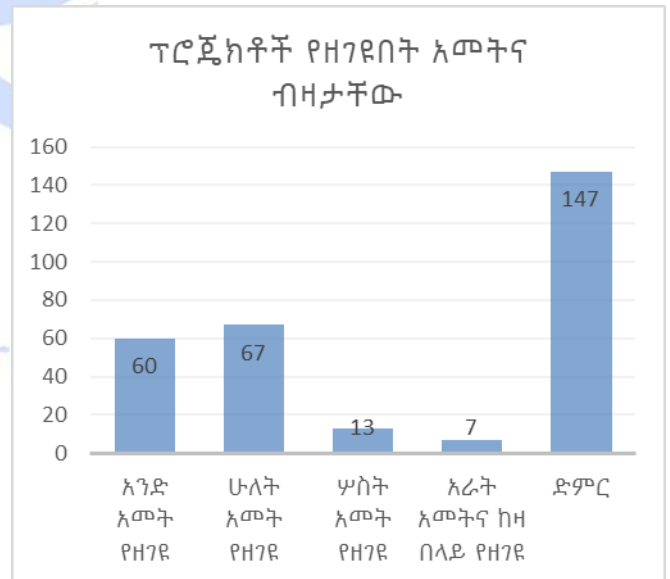

- በናሙና ከታዩ የመንገድ 296 ፕሮጀክቶች ውስጥ ውስጥ 58 ፕሮጀክቶች አንድ አመት፣ 62 ፕሮጀክቶች ሁለት አመት፣ 15 ፕሮጀክቶች ሶስት አመት፣ 17 ፕሮጀክቶች አራት አመትና ከዚያ በላይ የዘገዩ እና 127 ፕሮጀክቶች ያልበትን ደረጃ የሚያሳይ መረጃ ያልተገኘላቸው በድምሩ 279 መግኘታቸው፤

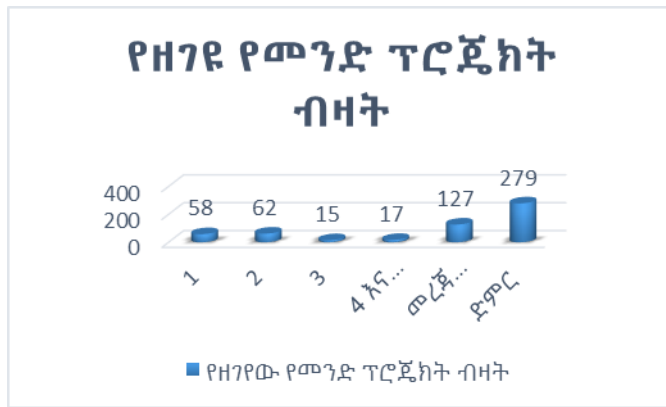


- ከ267 ቢሊዮን ብር በላይ ተጨማሪ በጀት የጠየቁ 20 የሚሆኑ የኤሌክትሪክ ኃይል ፕሮጀክቶች መኖራቸው እና ዘጠኙ ፕሮጀክቶች ከ 100% እስከ 200% ተጨማሪ በጀት መጠየቃቸው፤

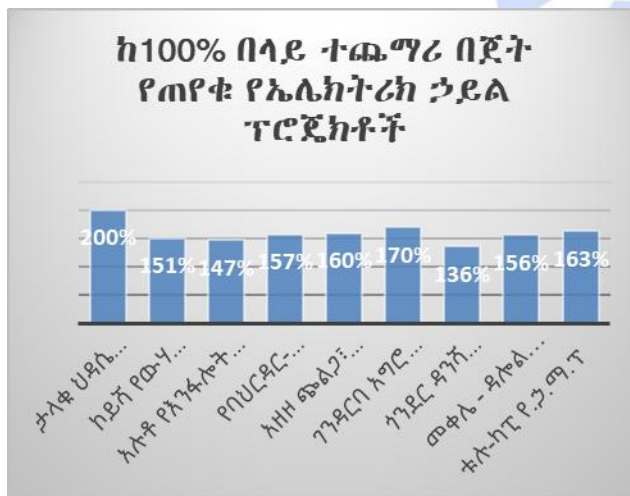

- መጀመሪያ ከተመደበላቸው በጀት ከ78% እስከ 760% ተጨማሪ ተደርጎ ብር 17,254,150,104 ተጨማሪ ገንዘብ የጠየቁ የመስኖና የዩኒቨርሲቲ ፕሮጀክቶች መኖራቸው፤




- በእቅድ ከተያዘ በጀት ብር 13,267.38 ቢሊዮን በላይ ተጨማሪ በጀት የወጣባቸው ከ180 በላይ የመንገድ ፕሮጀክቶች፤ መኖራቸው ከዚህ ውስጥ ከ75% በላይ ተጨማሪ ወጪ የወጣላቸው የመንገድ ፕሮጀክቶች መኖራቸው፤

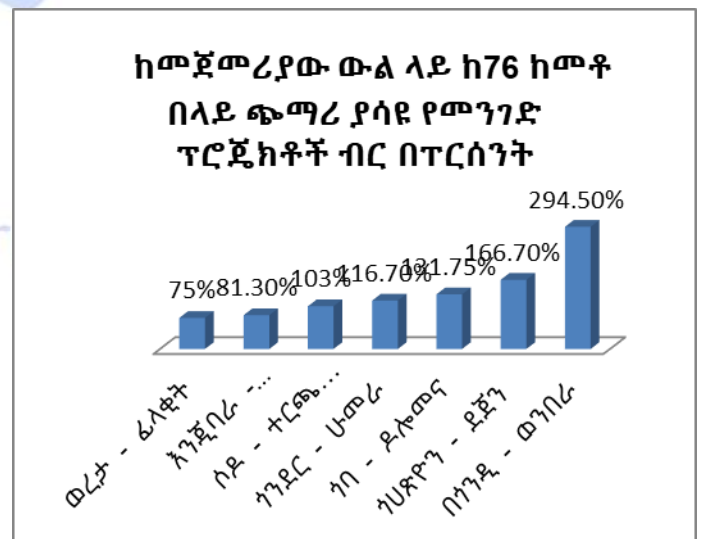

- በናሙና ከታዩ የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ፕሮጀክቶች ውስጥ በሁለት ዩኒቨርሲቲዎች ፕሮጀክቶች ተጠናቀው ሥራ ከጀመሩ በኋላ ብር 2,964,476,085.00 በጀት

የተመደበላቸውና የተለቀቀላቸው ፕሮጀክቶች እንዲሁም በአምስት የኒሽርሲቲዎች በጀት ተለቆላቸው ግን ገንዘቡ ለፕሮጀክቶቹ ሥራ ያልዋለባቸው ብር 1,110,208,910.22 በድምሩ ብር 4,074,684,995.22 ተመድቦ የተለቀቀላቸው መሆኑ ታውቋል፡፡

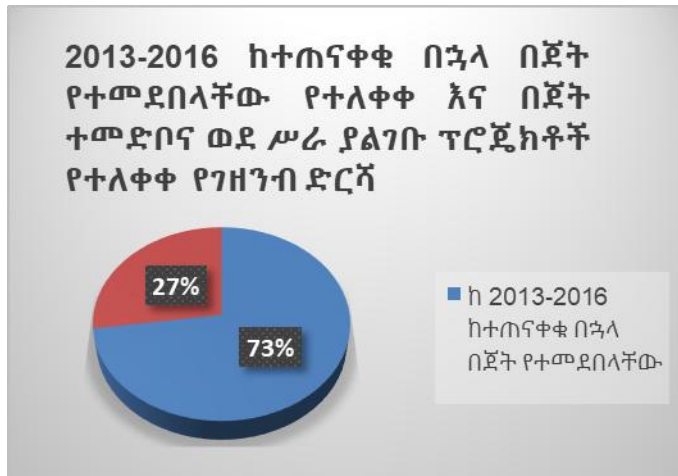

- የመንግስት ማንኛውንም ፕሮጀክቶች ከአስፈፃሚ አካላት የሚተላለፈውን ፕሮጀክት ከጽንሰ ሀሳብ ጀምሮ እስከ ትግበራ ድረስ የሚያሳይ ዝርዝር መረጃ የሚይዝበት፣ የመረጃ ልውውጥ የሚደረግበት ዘመናዊ የመረጃ አያያዝ ሥርዓትና የመረጃ ቋት (database) በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አለመኖሩ ፤

ታውቋል፡፡ በመሆኑም

- የፕላንና ልማት ሚኒስቴር አዋጅ ቁጥር 1210/2012 እና አዋጅ ቁጥር 1263/2014 ከመውጣታቸው በፊት የተጀመሩ ፕሮጀክቶችን የሚመለከቱ መረጃዎችን ከገንዘብ ሚኒስቴር ሊረከብና አደራጅቶ በመያዝ ተገቢውን የክትትልና የቁጥጥር ተግባር ማከናወን ይጠበቅበታል፡፡ በተጨማሪም ወደፊት የታቀዱ የመንግስት

ፕሮጀክቶች የአዋጭነት ጥናት እና የአካባቢ ተጽዕኖ ግምገማ በአስፈጻሚ ተቋማት መከናወናቸውን በማረጋገጥ የቀረበውን ጥናት በዝርዝር በመገምገም ውሳኔ ሊሰጥ ይገባል፡፡ እንዲተገበሩም የተመረጡ ፕሮጀክቶች የፊዚካል እና የፋይናንሻል የትግበራ መርሃ ግብር ማዘጋጀታቸውን ሊያረጋግጥ እና በመርሃ ግብሩ መሰረት እየተገበረ መሆኑን ሊከታተል ይገባል፡፡

- ሚኒስቴር መ/ቤቱ አሁን በመከናወን ላይ ያለ የመንግስት ፕሮጀክቶች ሆኑ ወደፊት የሚጀመሩ ፕሮጀክቶች በታቀደላቸው ጊዜ እና በጀት መሰረት መከናወናቸውንና መጠናቀቃቸውን ክትትልና ቁጥጥር በመደረግ ጠንካራ ፊዚካል ዲሲፕሊን የሚሰፍንበትን አሠራር ተግባራዊ ሊያደርግ ይገባል፡፡ በተለያዩ ምክንያት የዘገዩ እና ተጨማሪ ወጪ የጠየቁ ፕሮጀክቶችንም ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን ችግራቸው ተፈቶ የሚጠናቀቁበትንና ወደ ትግበራ የሚገቡበትን ስልት በመቀየስ ሊተገብር ይገባል፡፡

- ሚኒስቴር መ/ቤቱ ከገንዘብ ሚኒስቴር እና ከዘርፍ መ/ቤቶች ጋር በመሆን የፕሮጀክቶች ክትትልና ቁጥጥር ግምገማን በማጠናከር ፕሮጀክቶች ያለበትን ወቅታዊ ደረጃ የሚታወቅበትን ሥርዓት ሊዘረጋ፣ በየዓመቱ በጀት የሚመደብላቸው ፕሮጀክቶች በእርግጥ በግንባታ ሥራ ላይ መኖራቸውን ሊያረጋግጥና የተመደበው ገንዘብ ለፕሮጀክቶቹ መዋላቸውን ሊያረጋግጥ ይገባል፡፡

በተጨማሪም ለፕሮጀክቶች የተመደበ በጀትን ያለአግባብ ለሌላ ተግባር የሚያውሉት ላይ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን የተጠያቂነት ሥርዓት በመዘርጋት ተግባራዊ ሊያደርግ ይገባል፡፡

- ሚኒስቴር መ/ቤቱ በአዋጅ ቁጥር 1210/2012 በኋላ ለሚኒስቴር መ/ቤቱ የቀረቡ ፕሮጀክቶችን እንዲሁም ከአዋጁ በፊት በገንዘብ ሚኒስቴር በኩል የተጀመሩ ማንኛውም ፕሮጀክት የሚመለከቱ ከጽንሰ ሀሳብ ጀምሮ እስከ ትግበራ ድረስ የሚያሳይ ዝርዝር መረጃ የሚይዝበት ዘመናዊ መረጃ አያያዝና ልውውጥ ሥርዓት በመዘርጋት ተግባራዊ ሊያደርግና መረጃዎቹ የሚያዝበት ቋት (database) ማቋቋም ይጠበቅበታል፡፡

የ ፌዴራል ዋና ኮዲተር መ / ቤት
Office of the Federal Auditor General

ክፍል አንድ

መግቢያ

የፕላንና ልማት ኮሚሽን አመሰራረት

1. የልማት ዕቅድ የማዘጋጀት ልምድ በርካታ ዓመታትን ያስቆጠረ ቢሆንም በሀገራችን በተቀናጀ መልኩ ሥራ ላይ መዋል የጀመረው በ1940ዎቹ መጀመሪያ ላይ ነው። በሀገራችን በ1940ዎቹ መጀመሪያ ላይ እንደ እርሻና ደን፣ ኢንዱስትሪ ልማት፣ ትራንስፖርትና መገናኛ፣ ትምህርትና የውሀ ሀብት ልማት ለመሳሰሉት ቁልፍ የኢኮኖሚ ዘርፎች የተናጠል የልማት ዕቅዶች ተዘጋጅተው ሥራ ላይ ውለዋል። ሀገራችን ከ1949 እስከ 1965 በጀት ዓመት በነበረው ጊዜ የተለያዩ ዋና ዋና ዘርፎችን ያካተቱ ሶሦት ሀገራዊ የአምስት ዓመት የልማት ዕቅዶችን (የመጀመሪያው ከ1949-1954፣ ሁለተኛው ከ1955-1959፣ ሶስተኛው ከ1961-1965) በማዘጋጀት ሥራ ላይ አውላለች። አራተኛው የአምስት ዓመት የልማት ዕቅድ ከ1967-1971 በጀት ዓመት የነበሩትን ዓመታት እንዲሸፍን ሆኖ ቢዘጋጅም በሀገሪቱ የየካቲት 1966ቱን ሕዝባዊ ንቅናቄ ተከትሎ በተደረገው የኢኮኖሚና የፖለቲካ ሥርዓት ለውጥ ምክንያት ሳይተገበር ቀርቷል።
2. ከ1967 እስከ 1983 በነበሩት አሥራ ሰባት ዓመታት መንግስት ያራምድ በነበረው ከሀገሪቱ ነባራዊ ሁኔታ ጋር ያልተጣጣመ የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፖሊሲ እንዲሁም በሀገሪቱ በተደጋጋሚ ከደረሰው አስከፊ ድርቅ እና ከተካሄደው አውዳሚ ጦርነት ጋር ተዳምሮ ኢኮኖሚውን ወደ ባለ ቀውስ ደረጃ ላይ አድርሶት እንደነበር ይታወቃል።
3. በወቅቱ የነበረው የተማከለ የኢኮኖሚ አስተዳደር የመንግስትን ድርሻ ከጊዜ ወደ ጊዜ እንዲጠናከር በማድረግ ብቻ ሳይሆን የግሉን ክፍለ ኢኮኖሚ ሚና በሚያጠብ መልኩ የፖሊሲ እርምጃዎችን በመውሰድ ይመራ ነበር። በዚህ ረገድ በወቅቱ ከተወሰዱ የፖሊሲ እርምጃዎች ውስጥ መሬትን ጨምሮ ዋና ዋና የማምረቻ፣ የማከፋፈያና የፋይናንስ ተቋማትን በመንግስት ቁጥጥር ስር ማዋል፣ የግሉን ክፍለ ኢኮኖሚ የሚገድቡ አዋጆችንና መመሪያዎችን ማውጣትና የመሳሰሉት ይገኙበታል። ይሁን እንጂ ሀገሪቱ በዕዝ ኢኮኖሚ አመራርና አስተዳደር ሥርዓት ጥላ ሥር ሆናም ከ1966 ወዲህ የተለያዩ የረዥም ጊዜ ጠቋሚ እና የመካከለኛ ዘመን የልማት ዕቅዶችን በማዘጋጀት ለመተግበር መከራ አድርጋለች። በዚህም ሂደት ስድስት ዓመታዊ የልማት

ዕቅዶች (1971-1976) ተዘጋጅተው በሥራ ላይ ከመዋላቸውም በላይ አንድ የአሥር ዓመት የልማት ዕቅድም (1977-1986) ተዘጋጅቶ ነበር።

የፕላንና ልማት ሚኒስቴር አመሰራረት

4. በኢትዮጵያ ከሁለተኛው የአለም ጦርነት በኋላ ወጥ የሆነና የተቀናጀ ሳይሆን የተለያዩ የመንግስት ተቋማት የየራሳቸውን ፕሮግራሞችንና ዕቅዶች በተናጠል ያዘጋጁ ነበር። በመቀጠልም ወጥ የሆነ አገራዊ ዕቅድ ለማዘጋጀት ብሔራዊ ምክር ቤት በ1947/1948 ዓ.ም ተቋቋመ። ምክር ቤቱም የፕላን ቦርድ እና የቦርዱ ሴክሪቴሪያት ሲኖሩት ሴክሪቴሪያቱም ዋነኛው ሥራው ዕቅድ ማዘጋጀት ነበር።
5. በዚህም መሰረት ከ1950 ዓ.ም ጀምሮ የመጀመሪያውን እና ሁለተኛን የአምስት አመት የልማት ዕቅዶች አዘጋጅቷል። በመቀጠልም በትዕዛዝ ቁጥር 46 1958 የፕላንና ሚኒስቴር መ/ቤት ተብሎ በሚኒስቴር መ/ቤት ደረጃ ተቋቋመ። ሚኒስቴር መ/ቤቱ ከተሰጡት ተግባራት መካከል በሁለትዮሽ ሆነ በአለም አቀፍ ተቋማት ጋር የሚመጡ ፕሮጀክቶችን መደራደር እና ከሚመለከታቸው የሚኒስቴር መ/ቤቶች ጋር በመሆን አፈጻጸማቸውን ማስተባበር ነበር።
6. በ1967 ደርግ ወደ ሥልጣን ሲመጣ በፕላን ዘርፍ አዲስ አደረጃጀት ተጠንቶ ስራ ላይ እንዲውል አድርጓል። በዚህም መሰረት ከአራት አመት በኋላ በአዋጅ ቁጥር 156/1971 የፕላንና ኮሚሽን ዕ/ቤት በመባል ተቋቋሟል። በሚቀጥሉት አራት አመታት በአዋጅ ቁጥር 262/1976 እና በአዋጅ ቁጥር 7/1980 ዓ.ም የሰም ለውጥ ሳያደርግ በአዲስ አደረጃጀት የማዕከላዊ ፕላን ብሔራዊ ኮሚቴ ዕ/ቤት በመባል እየሰራ ቆየ።
7. የተነደፉት የልማት ዕቅዶች አገዛዙ ከሚከተለው ርእዮተ ዓለምና ፖሊሲ የተነሳ ለአገሪቱ ሁለንተናዊ የኢኮኖሚ እድገት ያበረከቱት አስተዋፅኦ እዚህ ግባ የሚባል ባይሆንም የፕላን ተቋማቱ ስለ ሀገራዊ ልማት ዕቅድ አስፈላጊነትና አሰራር መዳበር ያበረከቱት አስተዋፅኦ ቀላል አልነበረም።
8. የኢ.ፌ.ዴ.ሪ መንግስት ሁለንተናዊ ዘላቂ እድገትን ለማምጣትና ድህንነትንም ለማጥፋት በዕቅድ መመራት መሰረታዊ መሆኑን በመገንዘብ የልማት ዕቅድ የሚነድፉና የሚያስተባብሩ ተቋማትን በተለያዩ አወቃቀርና ስያሜ እንዲሁም ኃላፊነትና ተግባራት ሲያቋቁም ሲያሻሽልና ሲያጠናክር ቆይቷል። ያለፉት ሦስት አስር ዓመታትን ታሪክ እንኳን ብናይ ስያሜያቸው የተለያዩና ኃላፊነታቸው በዋነኛነት

የአገሪቱን የልማት እቅድ መንደፍና አፈፃፀማቸውን መከታተል የሆነ የተለያዩ ብሔራዊ የፕላን የሚመለከቱ መንግስታዊ ተቋማት አደራጅታለች፡፡ እነዚህም በሽግግሩ መንግስት ወቅት ከ1983-1987 ዓ.ም የፕላንና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር እንዲሁም ከ1988-1993 ዓ.ም የኢኮኖሚ ልማትና ትብብር ሚኒስቴር እንዲሁም ከ1994-2005 ዓ.ም በገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ነበሩ፡፡ የብሔራዊ የፕላን ኮሚሽንን በየካቲት 2005 ዓ.ም የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 281/2005 እንዲቋቋም አድርጓል፡፡

9. የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የፌደራል መንግስት አስፈፃሚ አካላትን ስልጣንና ተግባር ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 1097/2010 አንቀጽ 32/19 የፕላንና ልማት ኮሚሽን ተባለ፡፡
10. በመጨረሻም በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የፌደራል መንግስት አስፈፃሚ አካላትን ስልጣንና ተግባር ለመወሰን የወጣ አዋጅ ቁጥር 1263/2014 መሰረት የፕላንና ልማት ሚኒስቴር በድጋሚ ተቋቋመ፡፡

የፕላንና ልማት ሚኒስቴር የተቋቋመበት ዓላማ፣ ራእይ እና ተልዕኮ

ራዕይ

11. በ2022 ዓ.ም ኢትዮጵያን የአፍሪካ የብልጽግና ተምሳሌት ሆና ማየት ፣ የህዝቦቿ ምኞትና ህልም እውን የሆነባት፣ እያንዳንዱ ዜጋ የተሻለ ኑሮ የሚኖርባት እንድትሆን ማድረግ ነው፡፡

ተልዕኮ

12. **ሚኒስትር መ/ቤቱ የሚከተሉት ተልእኮዎች አሉት**
 - በሀገሪቱ ሁለገብ ልማት ላይ አስፈላጊውን የፖሊሲ ትንተና፣ መመሪያ እና ድጋፍ መስጠት፡፡
 - የዘርፍ ሚኒስቴሮችን እና የሚመለከታቸውን የመንግስት አካላት በማስተባበር የመካከለኛና የረዥም ጊዜ ሀገራዊ የልማት እቅድ ማዘጋጀት፡፡
 - የመንግስት ኢንቨስትመንት አስተዳደር እና አስተዳደር ብቃትን ለማዳበር ፖሊሲዎችን፣ ፕሮግራሞችን እና የልማት ፕሮጀክቶችን ቀልጣፋ ግምገማ ማድረግ ፣ መምረጥ እና ቅድሚያ መስጠት፡፡
 - የልማት ዕቅዶች፣ ፖሊሲዎችና ፕሮግራሞች፣ እና የልማት ፕሮጀክቶች ወቅታዊ ክትትልና ግምገማ (monetring and evaluation) ማካሄድ፡፡

የፕላንና ልማት ሚኒስቴር ስልጣንና ተግባራት

13. የአስፈጻሚ አካላትን ስልጣንና ተግባር ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁ.1263/2014 መሰረት የሚከተሉት ስልጣንና ተግባራት ለፕላንና ልማት ሚኒስቴር ተሰጥተዋል፡

- ✚ የልማት፣ የሀገራዊ የስታስቲክስ፣ የሥነ-ሕዝብ፣ የአየር ንብረት ለውጥንና አካባቢን የሚመለከቱ ፖሊሲዎች፣ ስትራቴጂዎችና ሕጎችን ያመነጫል፤ ለአፈጻጸሙ ከሀገራዊ የልማት አቅጣጫ ጋር የተጣጣመ ዝርዝር መርሀ-ግብር ያዘጋጃል፤ በሚመለከተው አካል ሲጸድቅም ተግባራዊ ያደርጋል፤
- ✚ ሀገራዊ የረጅም ዘመን አመላካች የልማት ፕላን ያዘጋጃል፤ በዚህም ላይ ተመስርቶ የሀገሪቱን የአጭርና የመካከለኛ ዘመን የልማት ፕላንና ፕሮግራም ያዘጋጃል፤ ሥራ ላይ እንዲውል ይመራል፤
- ✚ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር የልማት ፕላን አካል የሆነውን ሀገራዊ የኢኮኖሚ እድገት ትንበያና የማክሮ ኢኮኖሚ ማዕቀፍ ያዘጋጃል፤ ከማክሮ ኢኮኖሚ ማዕቀፉ የተጣጣሙ የቁጠባ፣ የኢንቨስትመንት እና የወጪና የገቢ ንግድ የማክሮ ኢኮኖሚ ግቦችን ያዘጋጃል፤
- ✚ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር በመላ ሀገሪቱ የተመጣጠነ ልማት እና ውጤታማ የመሬት አጠቃቀምን ለማሳካት ሀገራዊ የስፓሻል ፕላን ያዘጋጃል፤ ተግባራዊነቱን ይከታተላል፤
- ✚ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር የክልሎችንና የዜጎችን ፍትሐዊ የመልማትና የልማት ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የሚያግዝ ሥርዓት ይዘረጋል፤ ተግባራዊነቱን ይከታተላል፤
- ✚ የኢኮኖሚና የልማት ፖሊሲ ትንተናና ጥናቶች ያካሂዳል፤ ስትራቴጂካዊ የሶሺዮ-ኢኮኖሚ ጉዳዮችን ይለያል፤ በትንተናና ጥናቶች በሚገኙ ውጤቶች መሠረት የፖሊሲ ምክረ ሀሳቦችን ለሚመለከተው የመንግሥት አካል ያቀርባል፤ በተለያዩ አካላት የሚመነጩ የልማት ፖሊሲዎችን የተጣጣሙ መሆናቸውን ያረጋግጣል፤
- ✚ የፖሊሲ ጥናትና ምርምር ሥራዎችን ያስተባብራል፤
- ✚ የልማት ፕላንን ለማሳካት እንዲሁም የመንግስት የማስፈጸም አቅም ለማጠናከርና ቀጣይነት ያለው ተቋማዊ አቅም እንዲፈጠር የአስፈጻሚ ተቋማት ሪፎርም እና የሥርዓት ማሻሻያ ጥናት ያካሂዳል፤ በጥናቱ ላይ ተመስርቶ

የፌዴራል መንግስት ተቋማትን ዓላማ፣ ተልዕኮ፣ ሥልጣንና ኃላፊነትን፣ በተመለከተ የውሳኔ ሀሳብ ለመንግስት ያቀርባል፤

✚ በመንግሥት በጀት፣ በመንግስት ዋስትና ብድር እንዲሁም በሌሎች ተመሳሳይ የበጀት ምንጮች እንዲከናወኑ የታቀዱ የፌዴራል መንግስት የልማት ፕሮጀክቶች ላይ የአዋጭነትና አስፈላጊነት ግምገማ ያካሄዳል፤ የልማት ፕሮጀክቶችን ቅደም ተከተል ያስይዛል፤ የልማት ፕሮጀክቶችን የሱፐርሺዥን ሥራ ይመራል፤ አፈጻጸማቸውንም ይከታተላል፤ ይገመግማል፤

✚ የሀገሪቱን የልማት ፕላን ለማስፈጸም የሚያግዙ የልማት ፕሮጀክቶችን በመለየትና በመቅረጽ በሚመለከታቸው አስፈጻሚ አካላት ተጨማሪ ዝግጅቶች ተደርጎባቸው ተግባራዊ እንዲደረጉ ድጋፍና ክትትል ያደርጋል፤

✚ የልማት ፕላን፣ ፕሮግራም እና ፕሮጀክቶች አዘገጃጀት ሥርዓት ይዘረጋል፤ ሥራ ላይ እንዲውል ያደርጋል፤ የቴክኒካል ምክር አገልግሎትና የአቅም ግንባታ ድጋፍ ይሰጣል፤

✚ ሀገራዊ የልማት ፕላን፣ ፕሮግራም እና ፕሮጀክቶች አፈጻጸም በየጊዜው ይከታተላል፤ ይገመግማል፤ የሀገራዊ የልማት ሥራዎች አፈጻጸም ሪፖርት በማዘጋጀት ለመንግሥት ያቀርባል፤

✚ የልማት ፕላን፣ ፕሮግራም እና ፕሮጀክቶች የአፈጻጸም ክትትል እና ግምገማ ሥርዓት እና አጋዥ መሠረተ ልማት ይዘረጋል፤ ሥራ ላይ እንዲውል ያደርጋል፤ የቴክኒካል ምክር አገልግሎትና የአቅም ግንባታ ድጋፍ ይሰጣል፤

✚ የሌሎች ተቋማት መረጃ የመሰብሰብ ተግባራት ይቆጣጠራል፤ የአሠራር ስታንዳርድ እና የናሙና ዘዴያቸውን ያጸድቃል፤ የትክክለኝነት ማረጋገጫ ይሰጣል፤ የሚሉት ናቸው፡፡

በአዋጅ ቁጥር 2010/2012 አንቀጽ 18 መሰረት ደግሞ ሚኒስቴር መ/ቤቱ

- 18/2 በመካከለኛ እና ከፍተኛ ፕሮጀክቶች ላይ ገለልተኛ የአዋጭነት ግምገማ ያደርጋል
- 18/4 የአዋጭነት ግምገማተደርጎባቸው አዋጭነታቸው የተረጋገጡ አዳዲስ ፕሮጀክቶች ወደ ካፒታል በጀት እንዲገቡ በሀገሪቱ የልማት ዕቅድ እና በገንዘብ ሚኒስቴር ሙያዊ ምክር መሰረት ይመርጣል፤ ቅደም ተከተል በማስያዝ ምክረ ሃሳብ ለገንዘብ ሚኒስቴር ያቀርባል

- 18/5 በመካከለኛ እና የረጅም ዘመን የልማት ዕቅድ ክትትልና ግምገማ ማዕቀፍ በተመረጡ ስትራቴጂክ ፕሮጀክቶች ላይ ክትትልና ግምገማ ያደርጋል፤ በፕሮጀክት አፈጻጸም ላይ የታዩ ተሞክሮዎችን በመቀመር የልምድ ልውውጥ ያደርጋል፤ ተግባራዊ መደረጋቸውን ያረጋግጣል፤
- 18/6 መካከለኛና ከፍተኛ ፕሮጀክቶች ሲከለሱ በህግ ከተደነገገው በላይ በፕሮጀክቱ በጀት ላይ ለውጥ የሚያስከትሉ ሲሆን የአዋቂነት ግምገማ በማድረግ ለገንዘብ ሚኒስቴር ያቀርባል
- 18/8 የፕሮጀክት ዕንሰሰሳብ፣ አዋቂነት ጥናት፣ አዋቂነት ግምገማ፣ የትግበራ ዕቅድ፣ አፈጻጸም፣ ክትትልና ግምገማ፣ ክለሳና ድህረ ትግበራ ግምገማን በሚመለከት መመሪያዎች ያወጣል፤ በፕሮጀክት ዑደት ውስጥ መመሪያዎቹ በአግባቡ ተፈፃሚ መሆናቸውን ያረጋግጣል
- 18/9 ፕሮጀክቶችን የሚመለከቱ ማዕከላዊ የመረጃ ቋት የሚደራጁበትን፣ የሚጠናቀሩበትና የሚሰራጨበት ሥርዓትና ይዘት ከገንዘብ ሚኒስቴር ጋር ያዘጋጃል፣ ይወስናል፣ ተግባራዊነታቸውን ይከታተላል፤
- 18/10 ዋና ዋና የፕሮጀክት መረጃዎች ተደራሽ በሆኑ የመገናኛ አግባቦች ድህረ ገጾችን ጨምሮ ወቅታዊነታቸውን ጠብቀው ለህዝብ ይፋ እንዲሆን ያደርጋል፤

የፕላንና ልማት ሚኒስቴር ድርጅታዊ መዋቅር እና የሰው ኃይል

ድርጅታዊ መዋቅር

14. ፕላንና ልማት ሚኒስቴር አንድ ሚኒስቴር፣ ሁለት ሚኒስቴር ደኤታዎች፣ የሚኒስትር ጽ/ቤት ኃላፊ፣ የሥራ አመራር ዋና ሥራ አስፈጻሚ፣ አስር ሥራ አስፈጻሚዎች እና በ6 ዋና ሥራ አስፈጻሚዎች ተደራጅቷል፡፡ ድርጅታዊ መዋቅር በአባሪ አንድ ተያይዟል

የሰው ኃይል

የፕላንና ልማት ሚኒስቴር የሰው ሀይል 280 የተፈቀደለት የሰው ኃይል ሲኖረው 2016 ዓ.ም. 96 ወንድ እና 52 ሴት በድምሩ 148 ሠራተኞች ያሉት ሲሆኑ 132 ያልተቀጠሩ መሆኑ፡

የፋይናንስ ምንጭ

15. የፕላንና ልማት ሚኒስቴር ከመንግስት ከሚመደብ በጀት የሚጠቀም ሲሆን የበጀት አጠቃቀም ከ2013-2017 ዓ.ም ጥር ወር

የመደበኛ በጀት					
ተ.ቁ	የበጀት አመት	የተመደበ	ስራ ላይ የዋለ	ስራ ላይ ያልዋለ	ስራ ላይ ያልዋለ በመቶኛ
1	2013	114,125,284.35	107,130,006.32	6,995,278.03	6
2	2014	102,459,132.82	96,332,257.24	6,126,875.58	5.9
3	2015	94,459,527.01	93,723,558.24	735,968.77	.07
4	2016	62,608,121.43	36,720,903.39	25,887,218.04	41.3
5	2017 የስድስት ወር	103,281,597.77	47,095,118.11	56,192,479.66	54.4%

የአዲቱ አላማ

16. የክዋኔ አዲቱ አላማ የመንግስት ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች ክትትልና ቁጥጥር ሥርዓት አፈጻጸም ኢኮኖሚያዊ ቀልጣፋና ውጤታማ ስለመሆኑ ለማረጋገጥ የሚያስችል የአሰራር ሥርዓት መዘርጋቱን እና የተዘረጋው የአሰራር ሥርዓት ተፈፃሚ መደረጉን በመገምገም በዚህ ጉዳይ ላይ የአሠራር ግድፈቶች ካሉ መንስኤያቸውን በመለየት የማሻሻያ ሀሳብ ማቅረብና ተጠያቂነትን ማጠናከር ነው፡፡

የአዲቱ ወሰን

17. አዲቱ የተከናወነው የመንግስት ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች ክትትልና ቁጥጥር ሥርዓት አፈጻጸም በተመለከተ ሲሆን አዲቱ የሚሸፍነው በዋነኝነት ከ2013 ዓ/ም እስከ 2016 ዓ/ም ጊዜ የተከናወኑ ሥራዎችን ሲሆን፡፡ እንደ አስፈላጊነቱ ወደ ኋላ እና ወደ ፊት ያሉ ዓመታትን የሥራ አፈጻጸም ለመገምገም ተሞክሯል፡፡

የአዲቱ ዘዴ

18. በአዲቱ ወቅት ከአዲት አካባቢው ጋር ተያያዥነት ያላቸው አዋጆች፣ ደንቦች፣ መመሪያዎች፣ በፕላንና ልማት ሚኒስቴር ክትትልና ቁጥጥር የሚደረግባቸው ፕሮጀክቶች ባለቤት የሚገኙ ሚኒስቴር መ/ቤቶች እና የሚመለከታቸው የፕላን እና ልማት ሚኒስቴር የስራ ክፍሎች ቃለ-ጉባኤዎች፣ የፕላንና የመንግስት ኢንቨስትመንት

ዋና ሥራ አስፈጻሚ የአሰራር ስርዓት መግለጫ፤ ከተለያዩ ለጋሽ ድርጅቶች ጋር የተደረጉ ውሎች፤ ለመንግስት ፕሮጀክቶች የተመደቡ በጀቶች እና ስራ ላይ የዋለው የገንዘብ መጠንን የሚያሳይ ሰነድ ከገንዘብ ሚኒስቴር፤ የመንግስት ፕሮጀክቶች አሁን የሚገኙበትን የአፈጻጸም ደረጃ የሚያሳይ ሰነድ በሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች፤ በፕሮጀክቶች ክትትልና ቁጥጥር ሂደቱ አፈጻጸም ያጋጠሙ ችግሮችን የሚያሳዩ የተለያዩ የሰነድ ማስረጃዎች፤ እና የፕላንና ልማት ምኒስቴር የተለያዩ ክፍሎች በናሙና በተመረጡ በሆሳዕና፣በወላይታ ሶዶ፣በሀረር፣ድሬዳዋ እና በሃዋሳ ከተማዎች በመስክ አዲት ቃለ-መጠይቅ በማድረግ የተሰበሰቡ ማስረጃዎች በአዲት ቡድኑ ተከልሰው ትንተና ተሰርቶ አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎች እና ማስረጃዎች ተሰብስበዋል፡፡

ለክዋኔ አዲቱ የተመረጠው የአዲት አካባቢ

- 19. ለክዋኔ አዲቱ የተመረጠው የአዲት አካባቢ የመንግስት ፕሮጀክቶች ክትትልና ቁጥጥር ሥርዓት አፈጻጸም ኢኮኖሚያዊና ቀልጣፋ በሆነ መልክ መከናወኑን እና ውጤታማ መሆኑን ማረጋገጥ የሚል ነው፡፡

የአዲቱ የትኩረት አቅጣጫዎች (Audit Issues)

- 20. ከላይ ለተመረጠው የአዲት አካባቢ (Audit area) ሶስት የአዲት የትኩረት አቅጣጫዎች (Audit Issues) ተዘጋጅተዋል፡፡ እነርሱም፡-
 - 1. ሚኒስቴር መ/ቤቱ የመንግስት ፕሮጀክትና ፕሮግራሞች ወደ ትግበራ ከመግባታቸው በፊት የቅድመ አዋቂነት ጥናት፤ አዋቂነት ጥናት፤ በገለልተኛ አካል አዋቂነት ጥናት እና ፕሮጀክቶች በቅደም ተከተል መሰረት በጀት የተተከለላቸው መሆኑን የሚያረጋግጥ የአሰራር ስርዓት የዘረጋ እና ተግባራዊ ያደረገ መሆኑን መገምገም፤
 - 2. ሚኒስቴር መ/ቤቱ በፕሮጀክቶች የታቀዱ ተግባራት በታቀደው ጊዜ ፣ወጭ፤ መጠን መከናወናቸውን ለማረጋገጥ ወቅታዊ ወይም ተከታታይ የትግበራ አፈፃፀም ክትትል የሚደረግበት የአሰራር ስርዓት መዘርጋቱን እና ተግባራዊ መደረጉን መገምገም፡፡
 - 3. ሚኒስቴር መ/ቤቱ የመንግስት ፕሮግራሞች እና ፕሮጀክቶች ቀልጣፋ እና ውጤታማ አፈጻጸም እንዲኖራቸው ከሚመለከታቸው ባለድርሻ ጋር ተቀንጅቶ ለመስራት የሚያስችል የአሰራር ስርዓት መዘረጋታቱን እና መረጃዎችን በቴክኖሎጂ በመታገዝ አደራጅቶ መያዙንና ተደራሽ ማድረጉን መገምገም፡፡

የሚሉ ናቸው፡፡

የአዲት መመዘኛ መስፈርት (Evaluative criteria)

21. በአዲት ቡድኑ የተመረጡትን ሶስት የአዲት ትኩረት አቅጣጫዎች ለመመዘን የሚረዱ 24 የአዲት መመዘኛ መስፈርቶች (Evaluative criteria) ተዘጋጅተዋል፡፡ እነዚህን የአዲት መመዘኛ መስፈርቶችን ለማዘጋጀት መሰረት የሆኑት የፌዴራል መንግስት አስፈፃሚ አካላት ስልጣንና ተግባር መወሰኛ አዋጅ ቁጥር 1263/2014፤ ዓ.ም - የፌዴራል መንግስት ፕሮጀክቶች አስተዳደር እና አመራር ስርዓትን ለመደንገግ የወጣ አዋጅ ቁጥር 1210/2012 ዓ.ም የሚኒስቴር መ/ቤቱ የአስር አመት ስትራቴጂክ ዕቅድ፤ አገራዊ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ የሚኒስቴሮች ምክር ቤት የአፈጻጸም ክትትልና ግምገማ መመሪያ ጥር 9/2018 ዓ.ም ሚኒስቴር መ/ቤቱ ከ2013-2016 ዓ.ም ካዘጋጀው አመታዊ እቅድና የእቅድ ክንውን ሪፖርት፤ የተለያዩ ሀገራት የፕሮጀክቶች ክትትልና ቁጥጥር መልካም ተሞክሮ እና በገንዘብ ሚኒስቴር በተዘጋጁ የፕሮጀክቶች አዘጋጃጀት አተገባበር መመሪያ የ2002 ዓ.ም ተጠቅሟል፡፡ መመዘኛ መስፈርቱ ለሚኒስቴር መ/ቤቱ ተልኮ አስተያየት ተሰጥቶበታል፡፡ ዝርዝሩ በአባሪ 2 ተያይዟል


የ ፌ ዴ ራ ል ዋ ና ኦ ዲ ተ ር መ / ቤ ት
Office of the Federal Auditor General

ክፍል ሁለት


የአዲት ግኝቶች

የመንግስት ፕሮጀክቶች ወደ ትግበራ ከመግባታቸው በፊት የአዋቂነት ጥናት መደረጉን በተመለከተ

22. የፕላንና ልማት ሚኒስቴር መ/ቤት በጀት ተመድቦላቸው እንዲተገበሩ ጥያቄ የሚቀርብላቸው የመንግስት ፕሮጀክቶች የፍላጎት፣ ለአገር እና ለተጠቃሚዎች የሚያስገኘው ፋይዳን የሚያሳይ ዝርዝር የአዋቂነት ጥናት በአስፈጻሚ ተቋም መከናወኑን ሊያረጋግጥ እና ቅደም ተከተል በመስጠት በጀት እንዲመደብላቸው ለገንዘብ ሚኒስቴር ሊያሳውቅ ይገባል፡፡
23. ይሁን እንጂ በአዲቱ ወቅት፤
- በናሙና በታዩ የመንግስት ፕሮጀክቶች
- ለሚያከናውኗቸው የግንባታ ፕሮጀክቶች የአዋቂነት ጥናት ያላከናወኑ አስፈጻሚ ተቋማት መገኘታቸው፤
 - የፕሮጀክቶቹ አዋቂነት ለፕላን ሚኒስቴር ቀርቦ ይሁንታ አግኝተው በጀት እንዲመደብላቸው ለገንዘብ ሚኒስቴር ስለመተላለፋቸው ማሰረጃ ያልቀረበላቸው ፕሮጀክቶች መኖራቸው፤
 - ከፕላን ሚኒስቴር ይሁንታ ሳያገኝ እና ቅደም ተከተል ውስጥ ሳይገቡ ነገር ግን ከገንዘብ ሚኒስቴር በጀት ተመድቦላቸው ወደ ትግበራ የገቡ ፕሮጀክቶች በአዲቱ ወቅት መገኘታቸው፤
- ለአብነት፡
- በአራት ዩኒቨርሲቲዎች 56 የግንባታ ፕሮጀክቶች፤

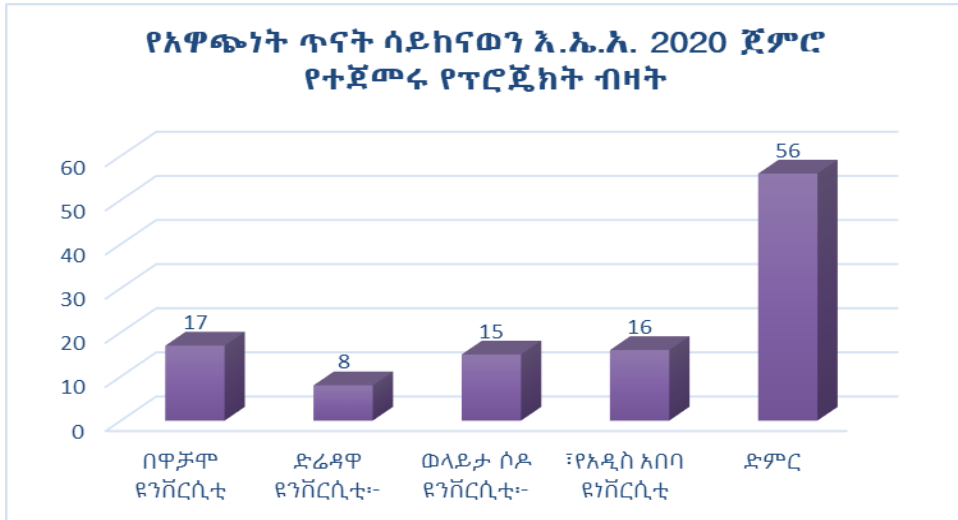

- አሁን በትግበራ ላይ ያሉ ከ42 በላይ የመስኖ ግንባታ ፕሮጀክቶች የአዋቂነት ጥናት ያልተሰራላቸው መሆኑ ከመስኖና ቆላማ ሚኒስቴር እና ከገንዘብ ሚኒስቴር የተገኘ ማስረጃ የሚያሳይ መሆኑ፤
- የፌደራል መንገዶች አስተዳደር የመንገድ ፕሮጀክቶችን በተመለከተ ከ2015 ዓ.ም በፊት ያሉ ፕሮጀክቶች በሙሉ አዋቂነት ጥናት ያልተሰራላቸው መሆኑን የኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር መግለጹ፤

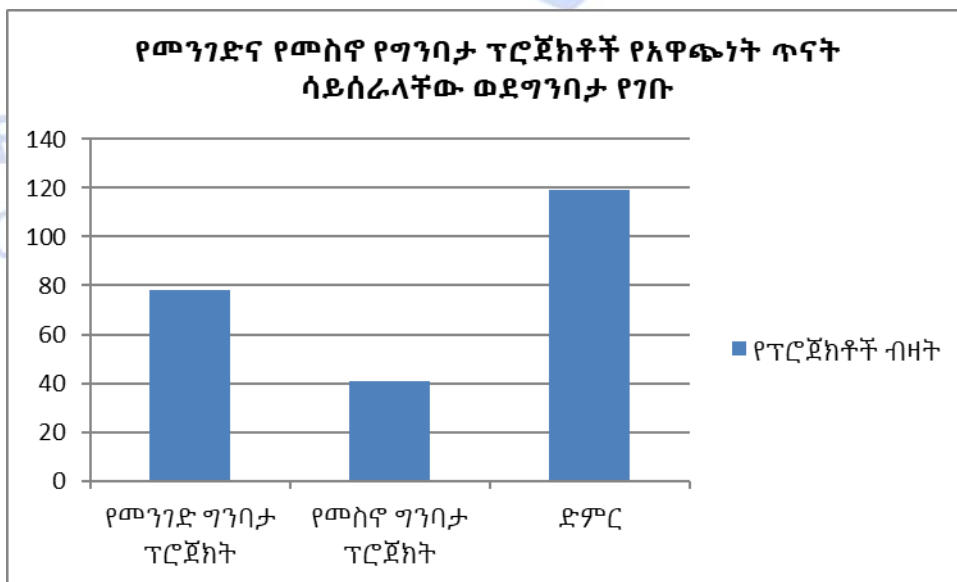

በአዲቱ ወቅት ከተከለሱ ማስረጃዎች፣ የአካል ምልከታዎች እና ከቀረቡ ቃለ-መጠይቆች ታውቋል። የፕሮጀክቶቹ ዝርዝር መረጃ አባሪ 4 እና 5 ላይ ተያይዟል)

24. ስለሁኔታው የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የሚመለከታቸው የስራ ሃላፊዎች ለቀረበላቸው መጠይቅ እና ለተላካቸው በነባራዊ መግለጫ፣ ለረቂቅ ሪፖርቱ በጽሁፍ እና በመውጫ ስብሰባ ወቅት በሰጡት ምላሽ

- አዋጅ 1210/2012 በሀምሌ 2012 የፀደቀ በመሆኑ እና የ2013 በጀት አመት ዝግጅት ቀድሞ የተጠናቀቀ በመሆኑ የአዋጁ ትግበራ በተጨማሪም የጀመረው በ2014 በጀት አመት ላይ መሆኑን፤
- ማንኛውም ፕሮጀክት አዋጅ 1021/2012 ከወጣ በኋላ በአንቀፅ 8 ንዑስ አንቀፅ 3 መሰረት ወደ ቅድመ አዋቂነት፣ ወይም አዋቂነት ጥናት፣ ቅደም ተከተል ማስያዝና ወደ መረጣ ዑደት ሊተላለፍ የሚችለው በፕላንና ልማት ሚኒስቴር በፕሮጀክቶች ገለልተኛ አዋቂነት ግምገማ መሰረት ተቀባይነት ካገኘ ብቻ መሆኑ፤
- የተገለፁት ፕሮጀክቶች ላይ የፕላንና ልማት ሚኒስቴር ተሳተፎ ያደረገ ባለመሆኑ ወደ በጀት የገቡበትን ምክንያት ለማብራራት የማይችሉ መሆኑን፤
- ይህ እንደተጠበቀ ሆነ የሚከተሉት ፕሮጀክቶች ላይ የፕላንና ልማት ሚኒስቴር በሂደት በመገምገም የቅድመ ፕሮጀክቶች መረጣ እና ግምገማ እንዲሁም የአዋቂነት ግምገማ በማከናወን ስለ ፕሮጀክቶች ምክረ ሀሳብ ማቅረቡን፤ አዋጅ 1210/2012 ከወጣ ጀምሮ በዋናነት ተግባራዊ እየተደረገ ያለው የመስኖ ፕሮጀክቶች ላይ መሆኑን እና አዋቂነት ጥናት ሳያከናውንበት ወደትግበራ የገባ የመስኖ ፕሮጀክት አለመኖሩን፤
- አዋጅ 1210/2012 ከተተገበረ በኋላ በአግባቡ ሳይጠናኑ እና በፕላንና ልማት ሚኒስቴር ሳይገመገም እና ሁሉንም ሂደቶች ሳያልፉ ወደ ቀጣይ ትግበራ ሂደት ወደ ትግበራ ለማስገባት በጨረታ ሂደት የነበሩ ስድስት የመስኖ ፕሮጀክቶችን የፕላንና ልማት ሚኒስቴር ደርሶበት የግዢ ኤጀንሲ ጨረታውን እንዲቋርጥ የማድረግ ስራ መሰራቱን፤
- በሀገራችን ባለፉት አመታት ተግባራዊ እየተረጉ ያሉ የመንገድ ፕሮጀክቶች ከዚህ በፊት በበጀት ውስጥ ታቅፈው የቀጠሉ እና አንዳንዶቹ በበጀት ውስጥ ለረዥም ዘመናት የቀዩ ሆኖም ግን ያልተጀመሩ በመሆናቸው እንደ አዲስ ፕሮጀክት የሚታዩ ባለመሆናቸው በአዋጅ 1210/2012 ውስጥ የሚካተቱ አለመሆናቸው፤

- በአብዛኛው መንግስት አዋጅ ቁጥር 1210/2012 ስራ ላይ ከመዋሉ በፊት በበጀት ውስጥ ቃል ተገብቶላቸው ያልተጀመሩ እና ተጀምረው ያልተጠናቀቁ ፕሮጀክቶችን እንዲጠናቀቁ ማድረግ ላይ ትኩረት እድርጎ እየሰሩ መሆናቸውን፤
- እስካሁን ባለው ሁኔታ የመንገድ ፕሮጀክቶች ጥናት ሳይደረግባቸው ወደ ተግባር የገባ ፕሮጀክት አለመኖሩን፤ የፕላንና ልማት ሚኒስቴር በቀጣይ የመንግድ ፕሮጀክቶች በአግባቡ እንዲመሩ የመንገድ ፕሮጀክቶች የራሱ የሆነ ልዩ ባህሪ ያለው በመሆኑ ዘርፉን መሰረት ያደረገ ዘርፍ ተኮር የአዋቂነት ጥናት መመሪያ የማውጣት ስራ በመስራት ወደተግባር ለመግባትም አስፈላጊው የተግባር ላይ ስልጠናዎች ይህም ለ15 ቀን የመንገድ ኤክስፐርቶች ብቻ ከአለም ባንክ ጋር በመሆን መሰጠቱን፤
- አሁንም ለሚኒስቴር መ/ቤቱ 60 የመንገድ ፕሮጀክቶች ዝርዝር የአዋቂነት ጥናታቸውን ለማስጠናት መጀመሪያ የፕሮጀክት ፅንሰ ሀሳብ ለፕላንና ልማት ሚኒስቴር ቀርበው እየታዩ እንደሚገኙ፤
- በመስኖ ፕሮጀክት ምንም አይነት ፕሮጀክት የአዋቂነት ጥናት ሳይደረግ ወደ ስራ የገባ ፕሮጀክት ስለመኖሩ መረጃ የሌላቸው መሆኑን፤ የመንገድ ፕሮጀክቶችም ላይ የተጀመሩት ባለመጠናቀቃቸው እነርሱን ለማጠናቀቅ ነው የትኩረት አቅጣጫ የተቀመጠው ስለዚህ አዳዲስ ፕሮጀክቶች የገቡበት ሁኔታ አናሳ መሆኑን ግን ከፍህታዊነት ጋር በተያያዘ ከፍተኛ ስልጣን በተሰጠው አካል የተመጣጠነ እድገትን ከማረጋገጥ አንጻር የገቡበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል በማለት

ገልጸዋል፡፡

25. የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የፕሮጀክቱ ኃላፊዎች ይህንን ቢሉም

- የፕሮጀክቶች ማስፈጸሚያ መመሪያ (የፕሮጀክት አዘጋጃጀት መመሪያ (Project preparation) 2006 ፣ የፕሮጀክት ቅድመ ትግበራ መገምገሚያ መመሪያ ጥቅምት 1997 ዓ.ም. (Appraisal guideline for public sector projects) (October 2004) የፕሮጀክቶች መከታተያና መገምገሚያ መመሪያ ሰኔ 2000 ዓ.ም (Guidelines for monitoring and evaluation of public sector projects June 2008) በገንዘብ ሚኒስቴር በማዘጋጀቱ
- በጨረታ ሂደት የነበሩ ስድስት የመስኖ ፕሮጀክቶችን የፕላንና ልማት ሚኒስቴር ደርሶበት የግዢ ኤጀንሲ ጨረታውን እንዲቋርጥ የተደረገ ስለመሆኑ ማስረጃ ባለመቅረባቸው፤

- አዋጅ ቁጥር 1210/2012 ከወጣበት ከ2012 ዓ.ም በኋላ የተጀመሩ ፕሮጀክቶች መኖራቸውን ከገንዘብ ሚኒስቴርና ፕሮጀክቱን የሚያስፈጽሙ አካላት የተሰበሰቡ ማስረጃዎች ስለሚያሳዩ፤
 - የፕላንና ልማት ሚኒስቴር የፕሮጀክቶችን አፈጻጸም የሚመለከቱ ተግባራትን በአዋጅ ቁጥር 1210/2012 እና በአዋጅ ቁጥር 1263/2014 ወደ እርሱ ሲተላለፍ ከገንዘብ ሚኒስቴር የተሟላ ፕሮጀክት ሰነዶችን ርክክብ ማድረግ ስለነበረበት፤
- የተሰጠውን ምላሽ ለመቀበል ያስቸገራል፡፡

26. የኦዲት ቡድኑ እንደምክንያት ያያቸው ችግሮች የፕላንና ልማት ሚኒስቴር የፕሮጀክቶችን አፈጻጸም ከገንዘብ ሚኒስቴር ሲረከብ የተሟላ የፕሮጀክት ሰነዶችን ርክክብ አለማድረግ፤ የገንዘብ ሚኒስቴርም ሆነ የፕላንና ልማት ሚኒስቴር ከ1997 ጀምሮ የፕሮጀክት መረጣን አስመልክቶ ከ1997 ጀምሮ የወጡ መመሪያዎችን ሥራ ላይ አለማዋላቸው፤ በየአመቱ የካፒታል ፕሮጀክቶች በጀት ለማወጅ ውይይት ሲደረግ በሚኒስቴር መ/ቤቱ በኩል ስለማለፉ አለመረጋገጡ፤ በየሩብ አመቱ ክትትልና ቁጥጥር በማድረግ የአዋጭነት ጥናት ሳያሰሩ ወደትግበራ የገቡ ተቋማት ላይ በቅርበት ክትትል አለማድረግ፤ ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡
27. በመሆኑም የታቀዱ የመንግስት ፕሮጀክቶች የአዋጭነት ጥናት ሳይከናወንላቸው በቀጥታ ወደ ሥራ በመግባታቸው ፕሮጀክቶች እንዲዘገዩ ያደረገ፤ በእርግጥ ምን ዓላማ ለማሳካት እንደተጀመሩ እና ለፕሮጀክቶቹ የሚያስፈልገው ትክክለኛው በበጀት በጥናት እንዳይታወቅ በማድረግ መንግስትን ለተጨማሪ ወጪ እንዲያወጣ ከማድረጉም በተጨማሪ ከፕሮጀክቶቹ አፈጻጸም እቅድ በፊት እንደ ገንዘብ፤ ጉልበት እና አስፈላጊ ሀብቶች እንዳይባክኑ ለመወሰን ችግር ፈጥሯል፡፡

ፕሮጀክቶች ወደ ትግበራ ከመግባታቸው በፊት የአካባቢና የማህበራዊ ተጽዕኖ ግምገማ መደረጉን በተመለከተ፡

28. ሚኒስቴር መ/ቤቱ ለእያንዳንዱ ፕሮጀክት ተግባራዊ ከመደረጉ በፊት በአስፈጻሚ ተቋማት የአካባቢና የማህበራዊ ተጽዕኖ ግምገማ መደረጉን ክትትል ሊያደርግ ይገባል፡
29. ይሁን እንጂ በኦዲቱ ወቅት፡ በናሙና ተመርጠው በታዩ በዋቻሞ፤ በወላይታ ሶዶ በድሬዳዋ፤ በሃዋሳ እና በሃሮማያ ዩኒቨርሲቲ ከ2013-2016 ዓ.ም የተከናወኑ የግንባታ ፕሮጀክቶች የአካባቢና የማህበራዊ ተጽዕኖ ግምገማ ሳይደረግላቸው ወደ ትግበራ የገቡ መሆኑ፤ ለአብነት፡-

- የወላይታ ሶዶ ዩንቨርሲቲ፣ ዋቻዋ ዩንቨርሲቲ፣ ሃሮማያ፣ ሀዋሳ እና ድሬዳዋ ዩንቨርሲቲዎች በሚደረጉ የግንባታ ስራዎች የአካባቢ ተፅኖ ግምገማ የማያሰሩ መሆኑን፤
- በተጨማሪም ከ2015 ዓ.ም በፊት/ ለዩንቨርሲቲ፣ ለመንገድና የመስኖ ግንባታዎች/ የአካባቢ ተፅኖ ግምገማ ስለመደረጉ መረጃ የለሌላቸው መሆኑን የፌዴራል አካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን መ/ቤት የሥራ ኃላፊዎች ለቀረበላቸው መጠይቅ መግለጻቸው፤ በኦዲቱ ወቅት ከተከለሱ ማስረጃዎች፣ የአካል ምልክታዎች እና ከቀረቡ ቃለ-መጠይቆች ለማወቅ ተችሏል፡፡

30. ስለሁኔታው የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ኃላፊዎች ለቀረበላቸው መጠይቅ፣ ለተላከላቸው የነባራዊ ሁኔታ መግለጫ፣ ለረቀቂ ሪፖርቱ በጽሁፍ እና በመውጫ ስብሰባ በሰጡት ምላሽ

- ከላይ በናሙናነት የተጠቀሱት ዩንቨርሲቲዎች ምንም አይነት ፕሮጀክት ወደ ፕላንና ልማት ሚኒስቴር ያልተላከ መሆኑን፤
- የፕላንና ልማት ሚኒስቴር የአካባቢ ተፅኖን ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ የመንግስት ኢንቨስትመንት በአየር ንብረት ለውጥ ሊመጣ የሚችለውን ተፅዕኖን በተገቢው መንገድ አስፈፃሚ ተቋማት ይዘውት አንዲሰሩ ለማድረግና የአየር ንብረት ተፅዕኖን ተግባራዊ እንዲያደርጉ እና የገለልተኛ አዋቂነት ጥናቱም በዚሁ መልኩ ለመቃኘት እና የአየር ንብረት ለውጥ ተፅዕኖን ለመቀነስ የሚያስችል የመንግስት ፕሮጀክቶች የአየር ንብረት ለውጥ በፕሮጀክት ውስጥ የሚያካትቱበት መመሪያ በመዘጋጀት ላይ እንደሚገኝ፤

ገልጸዋል ፡፡

31. የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ይህንን ምላሽ ቢሰጡም በኦዲቱ ወቅት

- የፌዴራል አካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን የመስኖ እና የመንገድ የግንባታ ፕሮጀክቶች እስከ 2015 ዓ.ም የዩንቨርሲቲዎች የግንባታ ፕሮጀክቶች የአካባቢ ተፅኖ ግምገማ ለማስደረግ እኛጋ የመጣ መረጃ የለም በማለት በማረጋገጣቸው፤
- አዋጅ ቁጥር 22010/2012 ከወጣ በኋላ የተጀመሩ ፕሮጀክቶችም የአካባቢ ተፅዕኖ ግምገማ ሳያደርጉ እንዲተገበሩ የተፈቀደላቸው ፕሮጀክቶች በመኖራቸው፤
- አሁን ለሚኒስቴር መ/ቤቱ ተጠሪ የተደረገው የአካባቢ ጥበቃ ባለሥልጣን አዋጅ ቁጥር 299/1995 ተግባራዊ መደረጉን መከታተልና ማረጋገጥ ስለነበረበት፤

ፕሮጀክቶች እንዲፈጸሙ ወደ ሚኒስቴር መ/ቤቱ ሲመጡ በሥራ ላይ ባሉ ህጎች መሰረት የአካባቢ ተጽዕኖ ግምገማ ስለመከናወኑ መረጃው ተያይዞ እንዲቀርብ ማድረግ ስለሚጠበቅበት፤

- ሚኒስቴር መ/ቤቱ ፕሮጀክቶችን ቅድመ ግምገማ ማድረግ፣ ማጽደቅን እና መከታተልን እንዲሁም መቆጣጠርን ሥልጣን ሲሰጠው ከዚህ በፊት ይህንን ተግባር ሲሰራ ከነበረው ከገንዘብ ሚኒስቴር ጋር የፕሮጀክት መረጃዎችን አስመልክቶ ርክክብ ያላደረገ በመሆኑ፤

የሰጡትን ምላሽ ለመቀበል ያስቸግራል፡፡

32. ከላይ ለታዩት ክፍተቶች ፕሮጀክት አስፈጻሚ መ/ቤቶች በአካባቢ ተጽዕኖ ግምገማ አዋጅ ቁጥር 299/1995 መሰረት ለሚያከናውኑት ፕሮጀክቶች የአካባቢ ተጽዕኖ ግምገማ አከናውኑ ለሚመለከተው ባለሥልጣን መ/ቤት በመላክ አለማጸደቃቸው ፕሮጀክቶችን የሚያፈቅዱና በጀት የሚፈቅዱ አካላት ግምገማ ስለመከናወኑ አለማረጋገጣቸው፤ የፕላንና ልማት ሚኒስቴር በአዋጅ ቁጥር 1263/2014 እና አዋጅ ቁጥር 2010/2012 መሠረት የፕሮጀክቶችን አፈጻጸም ከገንዘብ ሚኒስቴር ሲረከብ የተሟላ የፕሮጀክት ሰነዶችን ርክክብ አለማድረግ፤ የገንዘብ ሚኒስቴርም ሆነ የፕላንና ልማት ሚኒስቴር ከ1997 ጀምሮ የፕሮጀክት መረጣን አስመልክቶ ከ1997 ጀምሮ የወጡ መመሪያዎችን ሥራ ላይ አለማዋላቸው፤ እንዲሁም የፕሮጀክት አስፈጻሚ አካላት ለመተግበር የፈለጉት ፕሮጀክቶችን በተቀመጠው የህግ አግባብና ሥርዓት መሠረት አዘጋጅተው ሳያቀርቡ ፕሮጀክቶች እንዲፈጸሙባቸው የሚጠይቁና የሚፈቀዱላቸው በመሆኑ፤ በ1995 ዓ.ም የወጣው የአካባቢ ተጽዕኖ ግምገማ አዋጅ ቁጥር 299/1995 ተግባራዊነቱን የአካባቢ ጥበቃ ባለሥልጣን አለመከታተሉ እንደ ዋነኛ ምክንያትነት ተወስደዋል፡፡


33. የአካባቢ ተጽዕኖ ግምገማ ጥናት ሳይከናወንላቸው በቀጥታ ወደ ሥራ በመግባታቸው ፕሮጀክቶች በአካባቢ ላይ የሚያደርሱት ይህ ሊሆን ባለመቻሉ በጥናቱ ወቅት በእጽዋት፣ በእንስሳት እና በተፈጥሮ መኖሪያዎች በባህላዊ ቅርስ ቦታዎች ላይ ማንኛቸውም የመሬት ገጽታ እና ምስላዊ ተፅዕኖዎች ላይ ሊደርስ የሚችለውን ኪሳራ ወይም ጉዳት ለመለየት እና ለመለካት፣ የሚፈጠሩትን እድገቶች በሚገነቡበት እና በሚሰሩበት ወቅት የሚያስከትሉትን አሉታዊ ተፅዕኖዎች በመለየት የመሠረተ ልማት አቅርቦትን ወይም የመቀነስ እርምጃዎችን ሀሳብ ማቅረብ እንዳይቻል አድርጓል፡፡

እንዲተገበሩ ጥያቄ የሚቀርብላቸው ፕሮጀክቶች ዝርዝር የአዋቂነት ግምገማ መከናወኑን በተመለከተ፤

34. የፕላንና ልማት ሚኒስቴር መ/ቤቱ በጀት ተመድቦላቸው እንዲተገበሩ ጥያቄ የሚቀርብላቸው የመንግስት ፕሮጀክቶች የፍላጎት፣ ለአገር እና ለተጠቃሚዎች የሚያስገኘው ዝርዝር ፋይዳን የሚያሳይ ዝርዝር የአዋቂነት ግምገማ ሊከናወን ይገባል፡፡

35. ይሁን እንጂ በአዲቱ ወቅት፡-

- በጀት ተመድቦላቸው እንዲተገበሩ ጥያቄ የሚቀርብላቸው የመንግስት ፕሮጀክቶች የፍላጎት፣ ለአገር እና ለተጠቃሚዎች የሚያስገኘው ዝርዝር ፋይዳን የሚያሳይ ዝርዝር የአዋቂነት ግምገማ ጥናት የፌዴራል መንግስት ፕሮጀክቶች አስተዳደር እና አመራር ስርአትን ለመደንገግ የወጣ አዋጁ ቁጥር 1210/2012 ዓ.ም አንቀፅ 10 ንዑስ አንቀጽ 1 የሚያዝ ቢሆንም ዝርዝር ፋይዳን የሚያሳይ ዝርዝር የአዋቂነት ግምገማ ሳይደረግላቸው ወደትግበራ የገቡ መሆኑ ፡ ለአብነት
- በአዲቱ ወቅት በናሙና በታዩ በወላይታ ሶዶ፣ በዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ፣ በዋቸሞ እና በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ብዛታቸው 33 የሆኑ ፕሮጀክቶች የአዋቂነት ግምገማ ሳይከናወንላቸው ወደ ትግበራ የገቡ መሆኑ፤

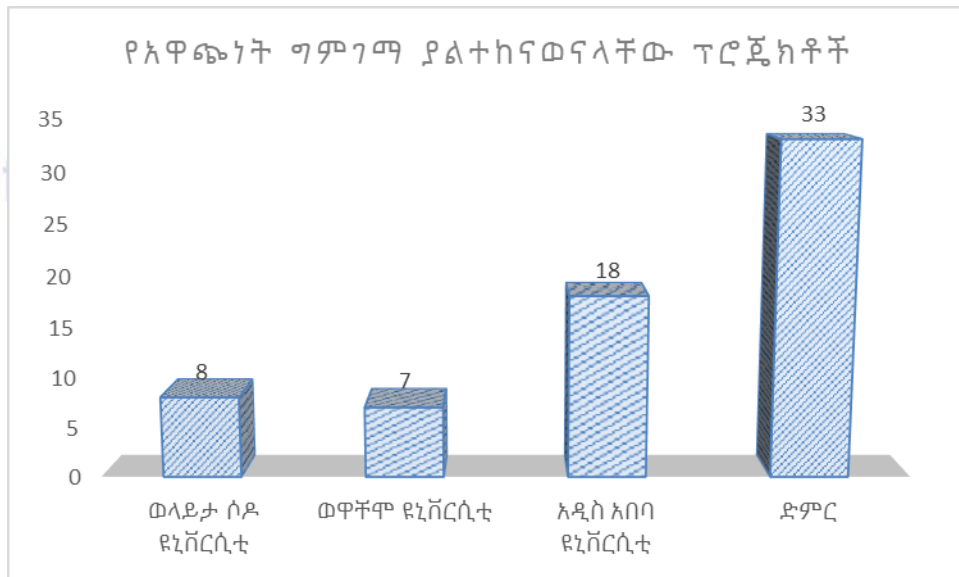

- 52 የመንገድ ፕሮጀክቶች፣ እና 42 የመስኖ ፕሮጀክቶች የአዋቂነት ግምገማ ሳይደረግላቸው ወደ ትግበራ የገቡ መኖራቸው፤ ፡ የኢትዮጵያ መንገድ አስተዳደር እና የመስኖ እና ቆላማ ሚኒስቴር ለሚመለከታቸው የስራ ሀላፊዎች ስለሁኔታው

ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ ከ2015 ዓ.ም በፊት የተሰሩ ስራዎች የአዋቂነት ግምገማ ያልተደረገላቸው መሆኑን መግለጻቸው፤ (አባሪ ፣ 3፣ 4፣ 5፣ 6፣ 7፣ 8፣ 9፣ 10)

በአዲቱ ወቅት ከተከለሱ ማስረጃዎች እና ከቀረቡ ቃለ-መጠይቆች ለማወቅ ተችሏል፡፡

36. ስለጉዳዩ የሚኒስቴር መ/ቤቱ በማጠቃለያ ቃለ መጠይቅ ወቅት የፕሮጀክቶች አስተባባሪው ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ

- አዋጅ 1210/2012 በህምሌ 2012 የፀደቀ በመሆኑ እና የ2013 በጀት አመት ዝግጅት ቀድሞ የተጠናቀቀ በመሆኑ የአዋጁ ትግበራ በተጨማሪም የጀመረው በ2014 በጀት አመት ላይ በመሆኑ፤
- ከየካቲት 2013 ዓ.ም ጀምሮ የፕላንና ልማት ሚኒስቴር ለ2014 በጀት አመት ዘርፎች ፕሮጀክቶችን በመለየት በፅንሰ ሀሳብ ደረጃ በተዘጋጀው ቅፅ እንዲያቀርቡ በተጠየቀው መሰረት ሴክተሮች የፕሮጀክት ፅንሰ ሀሳቦችን ለግምገማ መላካቸውን፤
- በተከታታይ ፕሮጀክቶችን በሚቀርቡበት አግባብ በመገምገም ግብረ መልስ እና የግምገማ ውሳኔ መስጠቱን፤ ተሰጥቷል።
- አዋጁ ከወጣ በኋላ ትግበራ የገቡ ፕሮጀክቶችን በተመለከተ በሁለት መንገድ ምክንያቱን ማየት ተገቢ ይሆናል፡፡ የመጀመሪያው የኒቨርሲቲዎችን በተመለከተ የኒቨርሲቲ ፕሮጀክቶች ለመስሪያ ቤታችን ቀርበው የሚገመገሙበት ሁኔታ መኖሩን፤ ለዚህም ማሳያ የሚሆን አዋጁ ከወጣ ጀምሮ የተገመገሙ ፕሮጀክቶች ውስጥ የኒቨርሲቲ ፕሮጀክቶች እንደሚገኙበት መረጃ ማቅረብ የሚችሉ መሆኑን፤ ነገር ግን የመንግስት አሰራርን ተከትለው የኒቨርሲቲዎች ወደ ፕላንና ልማት ሚኒስቴር ሳይልኩ ቀጥታ ወደ በጀት ልከው ከሆነ ፕሮጀክቱን የሚተገብረው የኒቨርሲቲ ትምህርት ሚኒስቴርና በጀት የመደበለት አካልን መጠየቅ ተገቢ መሆኑን፤

ገልጸዋል፡፡

37. የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የፕሮጀክቱ ኃላፊዎች ይህንን ቢሉም በአዲቱ ወቅት በሆሳዕና፤ በወላይታ ሶዶ፤ በሃዋሳ፤ በሀረር፤ በድሬዳዋ ከተማዎች በሚገኙ የፌዴራል መንግስት የልማት ፕሮጀክቶችን በሚያስፈጽሙ ተቋማት ከተደረገ ሰነድ ክለሳ እና ጉዳዩ ለሚመለከታቸው ኃላፊዎች ከቀረበ ቃለ መጠይቅ በተገኙ መረጃዎች ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የአዋቂነት ጥናት ግምገማ የማያደርግ መሆኑን፤ የሚኒስቴር መስሪያ

ቤቱ ግምገማ ስለማከናወኑ የሚያሳይ ማስረጃዎቻው ተጠይቆ ለኦዲቱ ያልቀረበ በመሆኑ የተሰጠውን ምላሽ ለመቀበል ያስቸግራል፡፡

38. ከላይ ለተጠቀሱት ሁኔታዎች እንደምክንያት ያያቸው ችግሮች የፕላንና ልማት ሚኒስቴር መ/ቤቱ የመንግስት የልማት ፕሮጀክቶችን በሚያስፈጽሙ ተቋማት በዕቅድ ላይ የተመሰረተ ክትትልና ቁጥጥር አለማድረግ፣ የአዋቂነት ጥናት ግምገማ ሳያሰሩ ወደትግበራ የገቡ ተቋማት ላይ ክትትል በማድረግ በአዋጁ እና በመመሪያው መሰረት የእርምት እርምጃ እንዲወስዱ አለማድረግ፣ ሚኒስቴር መ/ቤቱ በአዋጅ ቁጥር 1210/2012 እንዲሁም በአዋጅ ቁጥር 1263/2014 ፕሮጀክቶችን ቅድመ ግምገማ ማድረግን፣ ማጽደቅን እና መከታተልን እንዲሁም መቆጣጠርን በአዋጅ ሥልጣን ሲሰጠው አዋጆቹ ከመውጣታቸው በፊት የተጀመሩ ፕሮጀክቶችን በተመለከተ ከዚህ በፊት ይህንን ተግባር ሲሰራ ከነበረው ከገንዘብ ሚኒስቴር ጋር ከፕሮጀክት ጋር የተያያዙ መረጃዎችን አስመልክቶ ርክክብ ያላደረገ በመሆኑና ለፕሮጀክቶች በጀት ሲጠየቅ ከገንዘብ ሚኒስቴር ጋር መረጃ ልውውጥ አለማድረጋቸው በዋነኛ ችግሩ እንዲፈጠር አድርገዋል፡

39. በመሆኑም የኢኮኖሚ አዋቂነት ጥናት ግምገማ ሳይከናወንላቸው ፕሮጀክቶች ወደ ሥራ መግባታቸው የበጀት ጫና እንዲፈጠር፣ ያስከተለ መሆኑ፣ የታቀደው የግንባታ ፕሮጀክት የቴክኒካል አዋቂነት ጥናት ያለምንም ቴክኒካዊ ጉዳዮች መጠናቀቅ ስለመቻሉ እንዳይወሰን፣ የአካባቢ ተጽዕኖና ማህበራዊ ሁኔታዎች በዚህ የአዋቂነት ጥናት ውስጥ መካተታቸውን ማረጋገጥ እንዳይቻልና ፕሮጀክቶች በታቀደላቸው ጊዜ፣ እና በጀት እንዳይጠናቀቁ አድርጓል፡፡

ፕሮጀክቶች በበጀት ከመካተታቸው በፊት የፕሮጀክቶች አስፈጻሚ አካል የፊዚካልና የፋይናንሻል እቅድ መርሃ ግብር ማዘጋጀታቸውን በተመለከተ፡


40. የፕላንና ልማት ሚኒስትር መ/ቤቱ አዋቂነታቸው ተረጋግጦ፣ ተመርጠው እና ቅደም ተከተል ተይዞላቸው በበጀት ላይ እንዲካተቱ የተመረጡ ፕሮጀክቶች በበጀት ከመካተታቸው በፊት በፕሮጀክት አስፈጻሚ አካል የፊዚካልና የፋይናንሻል እቅድ መርሃ ግብር የተዘጋጀላቸው ስለመሆኑ ሊያረጋግጥ ይገባል፡፡

41. ይሁን እንጂ በኦዲቱ ወቅት፡-

➤ አዋቂነታቸው ተረጋግጦ፣ ተመርጠው እና ቅደም ተከተል ተይዞላቸው በበጀት ላይ እንዲካተቱ የተመረጡ ፕሮጀክቶች በበጀት ከመካተታቸው በፊት የፊዚካልና

ፋይናንሺያል እቅድ በፕሮጀክት አስፈጻሚ አካል የተዘጋጀ መርሀ ግብር የሌላቸው መሆኑ፤ ለአብነት፦

- በኦዲቱ ወቅት በናሙና ከታዩ የንብርሲዎች በተገኘ መረጃ መሠረት 2013-2016 ዓ.ም. የተጀመሩ ሀሮማያ የንብርሲቱ 8 የግንባታ ፕሮጀክቶች፤ የወላይታ ሶዶ የንብርሲቱ 15 የግንባታ ፕሮጀክቶች፤ የዋቻዋ የንብርሲቱ 12 የግንባታ ፕሮጀክቶች፤ ድሬዳዋ የንብርሲቱ 10 የግንባታ ፕሮጀክቶች፤ በድምሩ 45 ፕሮጀክቶች የፊዚካልና የፋይናንሺያል እቅድ መርሀ ግብር ያልተዘጋጀላቸው መሆኑን መግለጻቸው፤

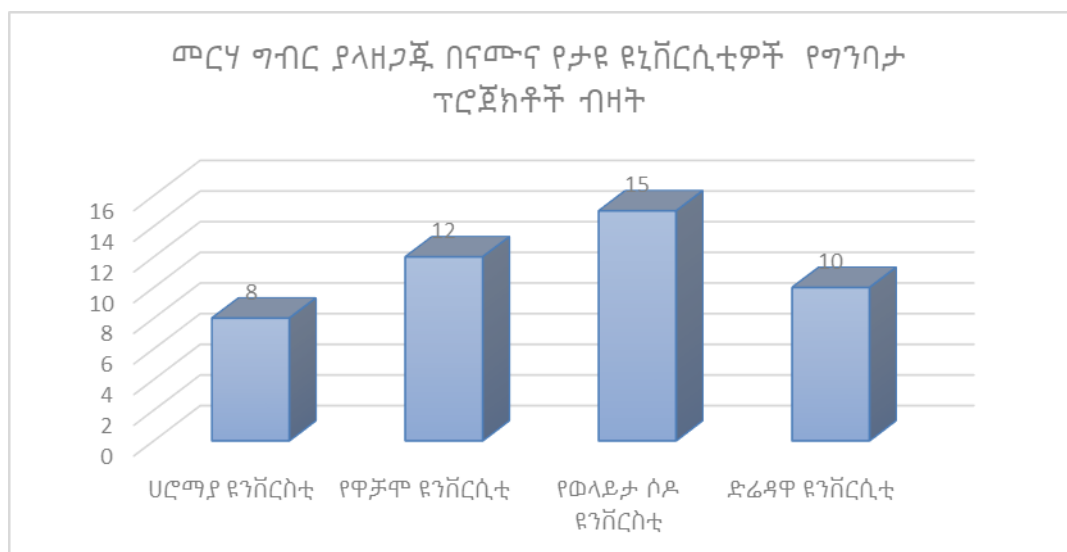

- ሚኒስቴር መ/ቤቱን የግንባታ ፕሮጀክቶች የፋይናንሺያልና ፊዚካል አፈጻጸም መረጃ እንዲያቀርብ በኦዲቱ ወቅት ተጠይቆ አለማቅረቡ፤

42. ስለሁኔታው የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ኃላፊዎች በነባራዊ ሁኔታ መግለጫ ፣ በምክንያታዊ ሁኔታ ብረቂቅ ሪፖርት እና በመውጫ ስብሰባ ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ

- እነዚህ የተጠቀሱ ፕሮጀክቶች በአዋጁ መሰረት ለፕላንና ልማት ሚኒስቴር ቀርበው የመጀመሪያ ደረጃ ግምገማና መረጣ በመቀጠልም የአዋቂነት ግምገማ ያልተከናወነባቸው መሆኑን፤ ፕሮጀክቶች በበጀት ውስጥ የታቀፉበትን ሁኔታ የማያወቁ መሆኑን፤
- አብዛኛዎቹ የንብርሲዎች የተመሰረቱት አስፈላጊው እቅድ ተዘጋጅቶላቸው እና የሚያስፈልጋቸው መሰረተ ልማት በግልፅ ተለይቶና የተሟላ ጥናት ተዘጋጅቶላቸው የተከናወኑ ባለመሆኑ አንዳንድ ፕሮጀክቶች አዋጅ 1210/2012 ከመጀመሩ በፊት

ተጀምረው እስካሁን የቀጠሉ በተለይ በአንዱ አካል ከተሰራ በኋላ ቀጣይ ክፍላቸው በበጀት ውስጥ እንደ አዲስ የሚታይበት ሁኔታ ሊታይ የሚችልበት ሁኔታ መኖሩና የተጠቀሱት ፕሮጀክቶች አዳዲስ ፕሮጀክቶች መሆናቸውን ማረጋገጥ እንደሚያስፈልግ፣ በአንዳንድ ሁኔታ አንድ የነበረን ፕሮጀክት ለበጀት አስተዳደር ተበትነው የሚቀርቡበት ሁኔታ በመኖሩ በጀት ላይ ሲታየ አዳዲስ ፕሮጀክቶች የሚመስልበት ሁኔታ መኖሩን፣ ገልጸዋል፡፡

43. የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ኃላፊዎች ይህንን ቢሉም በናሙና በታዩ የመስኖ ፕሮጀክቶች በዋቻዎ፣ በወላይታ ሶዶ፣ በድሬዳዋ እና በሀረር ዩኒቨርሲቲዎች በአዲቱ ወቅት በተደረገ ዶክመንት ክለሳ እና ቃለ-መጠይቅ በተገኙ መረጃዎች የፌዚካልና ፋይናንሻል እቅድ መረጃ ለማግኘት አልተቻለም፡፡ ያለፈበትን ምክንያት ለማጣር በተጨማሪ ገንዘብ ሚኒስቴር መረጃ ሊሰጥ ይገባል በማለት ለመለሱት ምላሽ አዋጅ ቁጥር 1210/2012 በፊት የተጀመሩ ፕሮጀክቶችን ሚኒስቴር መ/ቤቱ ፕሮጀክቶችን ቅድመ ግምገማ ማድረግ፣ ማጽደቅ እና መከታተልን እንዲሁም መቆጣጠርን በአዋጅ ሥልጣን ሲሰጠው ከዚህ በፊት ይህንን ተግባር ሲሰራ ከነበረው ከገንዘብ ሚኒስቴር ጋር ከፕሮጀክት ጋር የተያያዙ መረጃዎችን አስመልክቶ ርክክብ ማድረግ ስለነበረበት፣ በመሆኑ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የሰጠውን ምላሽ ለመቀበል ያስቸግራል፡፡
44. የአዲት ቡድኑ እንደምክንያት ያያቸው ችግሮች የፕላንና ልማት ሚኒስቴር መ/ቤቱ የመንግስት የልማት ፕሮጀክቶችን ለሚያከናውኗቸው ፕሮጀክቶች የሚሠራውን ሥራ የፌዚካልና የፋይናንሻል ዕቅድ መኖሩንና ሥራውም በመርሃ ግብሩ መሰረቱን አለማረጋገጡ፣ አዋጅ ቁጥር 1210/2012 በፊት የተጀመሩ ፕሮጀክቶችን በተመለከተ ሚኒስቴር መ/ቤቱ ፕሮጀክቶችን ቅድመ ግምገማ ማድረግ፣ ማጽደቅ እና መከታተልን እንዲሁም መቆጣጠርን በአዋጅ ሥልጣን ሲሰጠው ከዚህ በፊት ይህንን ተግባር ሲሰራ ከነበረው ከገንዘብ ሚኒስቴር ጋር ከፕሮጀክት ጋር የተያያዙ መረጃዎችን አስመልክቶ ርክክብ ያላደረገ በመሆኑና ለፕሮጀክቶች በጀት ሲጠየቅ ከገንዘብ ሚኒስቴር ጋር መረጃ ልውውጥ አለማድረጋቸው፣ ለችግሩ መንስኤነት በዋናነት ተወስደዋል፡፡
45. በመሆኑም የመንግስትን ፕሮጀክት የሚያስፈጽሙ ተቋማት ፕሮጀክቶቻቸው በጀት የተያዘላቸው በመሆኑ የተመደበላቸውን የበጀት አፈጻጸም ከፌዚካል አፈጻጸማቸው ጋር እንዳይጣጣም አድርጓል ይህ ማለት በየበጀት አመቱ የሚመደብላቸው በጀት ከ2-3 አመት ተጠናቆ የቆየ እና በጀት ተያዘለት ነገር ግን ተግባራዊ ያልሆኑ ፕሮጀክቶች


እንዲፈጠሩ አድርጓል፤ የፊዚካልና የፋይናንሻል አፈፃፀም መረጃ በበቂ ሁኔታ ተዘጋጅቶ በየአመቱ ትክክለኛ መረጃን የያዘ ሪፖርት ለሚመለከተው አካል እንዳይቀርብ አድርጓል፤

የመንግስት ፕሮጀክቶች በታቀደላቸው ጊዜ መጠናቀቃቸውን በተመለከተ


46. የፕላንና ልማት ሚኒስትር መ/ቤቱ የመንግስት ፕሮጀክቶች በታቀደላቸው ጊዜ መጠናቀቃቸውን ክትትልና ቁጥጥር ሊያደርግ ይገባል፡፡

47. ይሁን እንጂ በአዲሱ ወቅት

- ከተከለሱ በኋላና ከታዩ ሰነዶች መረዳት እንደተቻለው ከ4 የንብርስቲዎችና የመስኖ ፕሮጀክቶች 147 የሚሆኑ ፕሮጀክቶች ከአንድ አመት እስከ 7 አመት የዘገዩ መሆናቸው፤ (አባሪ 12)

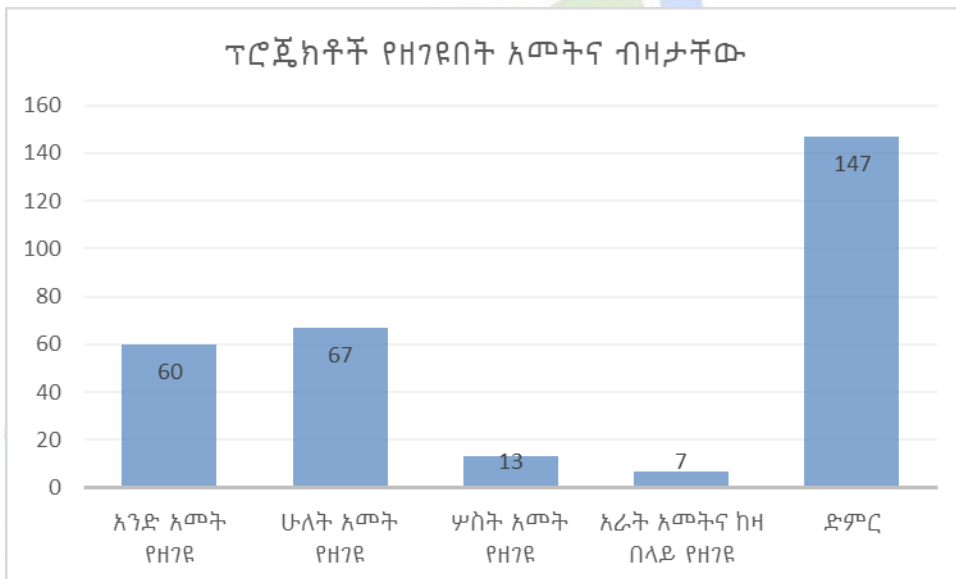

በኋላውና ከታዩ የመንገድ 296 ፕሮጀክቶች ውስጥ ውስጥ 58 ፕሮጀክቶች አንድ አመት፣ 62 ፕሮጀክቶች ሁለት አመት፣ 15 ፕሮጀክቶች ሶስት አመት፣ 17 ፕሮጀክቶች አራት አመትና ከዚያ በላይ የዘገዩ እና 127 ፕሮጀክቶች ያሉበትን ደረጃ የሚያሳይ መረጃ ያልተገኘላቸው በድምሩ 279 ናቸው፤ (ዝርዝር መረጃው በአባሪ 11 ይመልከቱ)

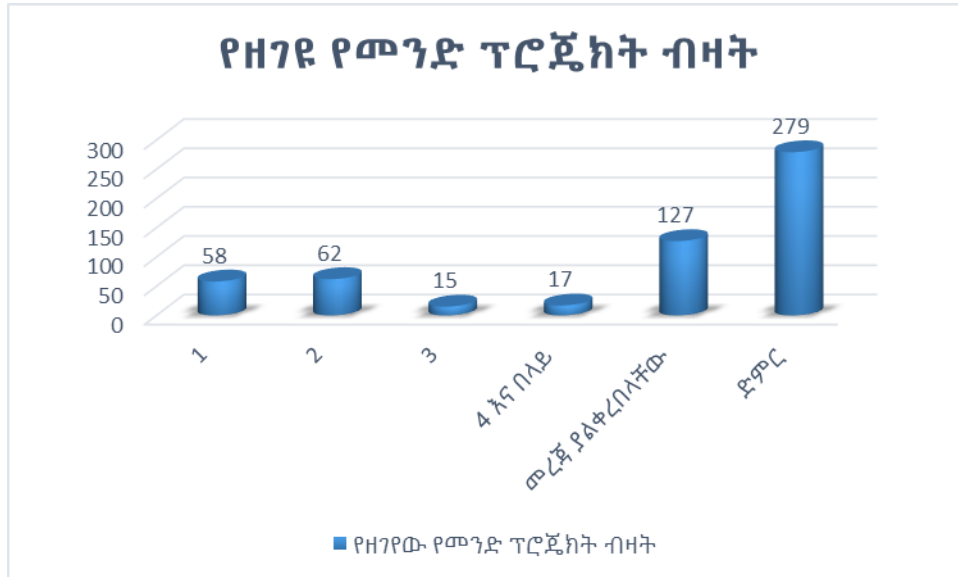

በአዲሱ ወቅት ከተከለሱ ማስረጃዎች፣ የአካል ምልክታዎች እና ከቀረቡ ቃለ-መጠይቆች ለማወቅ ተችሏል፡፡

48. ስለሁኔታው የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ሀላፊዎች ለቀረበላቸው ቃለ መጠይቅ፣ ለነባራዊ ሁኔታ መግለጫ ፣ በረቂቅ ሪፖርት ወቅት እና በመውጫ ስብሰባ በሰጡት ምላሽ

- የተጠቀሱት ፕሮጀክቶች ሁሉም በአዋጅ 1210/2012 ወሰን ውስጥ የማይወድቁ ቢሆንም በተለያዩ ጊዜያት የፕሮጀክቶችን መዘግየት ለማጥናት ባደረግናቸው ጥረቶች ፕሮጀክቶች በእቅድ መሰረት እንዳይጠናቀቁ የሚያደርጉ ዋና ዋና ምክንያቶችን፡

- የካሳ ክፍያና የወሰን ማስከበር ፤
- የተቋራጮች አቅም ማነስ በተለይም የመስኖ ተቋራጮች ይህም ወደ ስራ ከገቡ በሃላ የማሸነፍ አቅርቦት በወቅቱ አለመቅረብ፤
- የፀጥታ ችግር በተለየም ከተወሰኑ አመታት ወዲህ በተለያዩ ቦታዎች በሚነሱ ግጭቶችና አለመግባባቶች የተነሳ ፕሮጀክቶች እንዲቋረጡ እና ጊዜ እንዲወሰድ ማድረግ፤
- የግንባታ ግብዓት በተፈለገው ደረጃ አለመግኘት፤
- የገንዘብ ፍሰት በሚፈለገው ደረጃ አለመሆን፤
- የውጭ ምንዛሬ እጥረት ከውጭ ለሚገቡ እቃዎች ላይ ችግር በመፍጠሩ የተነሳ ጊዜ መውሰድ መቻሉ፤
- የፕሮጀክት አስፈፃሚ አካላት ተገቢውን ትኩረት ሰጥቶ በቅንጅት አለመስራት፤

- የዋጋ ከፍተኛ ጭማሪ መኖር ተቋራጭ ስራቸውን በአግባቡ እንዳይሰሩ ማድረግ እና
- ፕሮጀክቶች በቀደመው አሰራር በአግባቡ ተጠንተው ወደ ስራ የገቡ ባለመሆኑ በትግበራ ወቅት ተጨማሪ ስራዎች የሚፈልጉ የፕሮጀክቱ አካል የሆኑ ወጭዎች/ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው ጊዜ እንዳይጠናቀቁ

ዋና ዋና ምክንያቶች ናቸው፡፡

- በረቂቅ ሪፖርት እና በመውጫ ስብሰባ ወቅት የመንግስት የልማት ፕሮጀክቶችን በታቀደላቸው ጊዜ መጠናቀቃቸውን በተመለከተ በአዋጅ 1210/2012 አንቀጽ 27 በሚለው መሰረት አዋጁ ከመውጣቱ በፊት የተጀመሩ ፕሮጀክቶች በመሆኑ በጀት መልቀቅ በዋነኛነት የገንዘብ ሚኒስቴር ስራ ነው፤ የፕላንና ልማት ሚኒስቴር ባልገመገመው ፕሮጀክት ላይ በጀት እንዲመደብ የማድረግ ስልጣንና ሀላፊነት የለውም ፤ በተግባርም ይህንን እንዲያደርግ አይጠበቅበትም በማለት ሚኒስቴር መ/ቤቱ

ምላሽ ሰጥቶል፡፡

ነገር ግን ኃላፊዩ ይህን ምላሽ ቢሰጡም ሥራው በአዋጅ ቁጥር 1263/2014 ለሚኒስቴር መ/ቤት በመሰጠቱ ሥልጣንና ኃላፊነት የለብንም የሚለውን ምላሽ ለመቀበል ያስቸግራል፡፡

49. የኦዲት ቡድኑ እንደምክንያት ያያቸው ችግሮች የፕላንና ልማት ሚኒስቴር መ/ቤቱ የመንግስት የልማት ፕሮጀክቶችን በሚያስፈጽሙ ተቋማት ክትትልና ቁጥጥር በማድረግ በታቀደላቸው ጊዜ እየተከናወኑ መሆኑን አፈጻጸማቸውን —አለመገምገሙ፤ ፕሮጀክቶች ከመፈቀዳቸው ዝርዝር ጥናትና ዲዛንይን አለመዘጋጀቱና አለመገምገማቸው እና አዋጅ ቁጥር 1210/2012 በፊት የተጀመሩ ፕሮጀክቶችን በተመለከተ ሚኒስቴር መ/ቤቱ በአዋጅ ቁጥር 1210/2012 እና አዋጅ ቁጥር 1263/2014 መሰረት ፕሮጀክቶችን ቅድመ ግምገማ ማድረግ፤ ማጽደቅን እና መከታተልን እንዲሁም መቆጣጠርን በአዋጅ ሥልጣን ሲሰጠው ከዚህ በፊት ይህንን ተግባር ሲሰራ ከነበረው ከገንዘብ ሚኒስቴር ጋር ከፕሮጀክት ጋር የተያያዙ መረጃዎችን አስመልክቶ ርክክብ ያላደረገ በመሆኑና ለፕሮጀክቶች በጀት ሲጠየቅ ከገንዘብ ሚኒስቴር ጋር መረጃ ልውውጥ አለማድረጋቸው በዋናነት ተወስደዋል፡፡

50. ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው በጀት መጠን አለመከናወናቸው አገሪቱ ለሌላ የልማት ሥራ ታውለውን ገንዘብና ሀብት በመያዝ የሌሎች ልማት ሥራዎች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ፈጥሯል፡፡

የመንግስት ፕሮጀክቶች በታቀደላቸው በጀት (ወጪ) መጠናቀቃቸውን በተመለከተ

51. የፕላንና ልማት ሚኒስትር መ/ቤቱ የመንግስት ፕሮጀክቶች በታቀደላቸው ወጭ(በጀት) መጠናቀቃቸውን ክትትልና ቁጥጥር ሊያደረግ ይገባል ፡፡


52. ይሁን እንጂ በኦዲቱ ወቅት፡-

✚ የመንግስት ፕሮጀክቶች በታቀደላቸው በጀት መጠናቀቅ ሲገባቸው በመጀመርያ ከታቀደላቸው እቅድ በላይ ወጪ የወጣባቸው መሆኑን በኦዲቱ ወቅት ለማወቅ ተችሏል ለአብነት ያህል፡- በታቀደላቸው በጀት መጠናቀቅ ሲገባቸው ያልተጠናቀቁ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች፣ የመስኖ ልማት ፕሮጀክቶች እና የዩኒቨርሲቲ ፕሮጀክቶች ተገኝተዋል፡፡

✚ ከ267 ቢሊዮን ብር በላይ ተጨማሪ በጀት የጠየቁ 20 የሚሆኑ የኤሌክትሪክ ኃይል ፕሮጀክቶች መኖራቸው እና ዘጠኙ ፕሮጀክቶች ከ 100% እስከ 200% ተጨማሪ በጀት መጠየቃቸው (አባሪ 3)



በድምሩ ብር መጀመሪያ ከተመደበላቸው በጀት ከ78% እስከ 760% ተጨማሪ ተደርጎ ብር 17,254,150,104 ተጨማሪ ገንዘብ የጠየቁ የመስኖና የዩኒቨርሲቲ ፕሮጀክቶች መኖራቸው፤

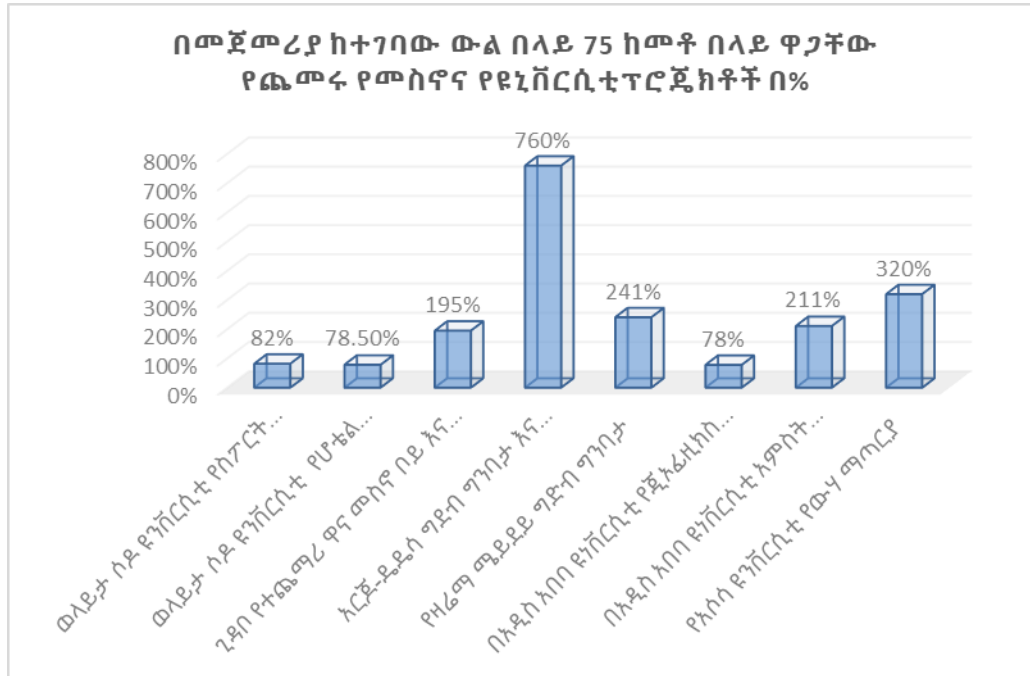


- በወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ
 - የስፖርት ማዘውተርያ ግንባታ በዋናው ውል 60,758,580.06 ብር ውል የተገባ ሲሆን ሁለት የተጨማሪ ስራ አንድ የለውጥ ስራ እና አንድ የዋጋ ማስተካከያ በመጨመር አጠቃላይ ውሉን ወደ 110,692,103.01 ብር በልዩነት 49933522.95 ብር እና በፕሮጀክትም 82% ተጨማሪ ያሳየ መሆኑ ፤
 - የሆቴል ግንባታ በዋናው ውል 93,038,637.45 ብር ውል የተገባ ሲሆን ሁለት የተጨማሪ ስራ አንድ የለውጥ ስራ እና አንድ የዋጋ ማስተካከያ በመጨመር አጠቃላይ ውሉን ወደ ብር 165,739,886.56 በልዩነት 72701249.11 ብር እና በፕሮጀክትም 78.5% ተጨማሪ ያሳየ መሆኑ፡፡

የመስኖ መሰረተ ልማት ግንባታ ፕሮጀክት

- ጊዳቦ የተጨማሪ ዋና መስኖ ቦይ እና ማህበራዊ ተቋማት ግንባታ (ሎት-2፣ የመጀመርያ ውል 273,380,250 የተከለሰ ዋጋ ብር 807,601,282.13 በልዩነት 534,221,032.13 ብር እና በፕሮጀክትም 195% ተጨማሪ ያሳየ መሆኑ፡
- የዛሬማ ሜዶዶይ ግድብ ግንባታ የመጀመርያው ውል 4,261,712,690 የተከለሰው ዋጋ ብር 14,532,594,103.68 በልዩነት ብር 10,270,881,413.68 በፕሮጀክትም 241% ተጨማሪ ያሳየ መሆኑ መሆኑ በመሆኑ በድጋሚ የአዋቂነት ጥናት ግምገማ ሳይዘጋጅላቸው ወደትግበራ የገቡ መሆኑ ፡፡
- በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ

- የጂኦፊዚክስ ቢሮ ግንባታ በመጀመርያ ውል የተገባበት የብር መጠን 217,068,248.14 ሲሆን ዋጋ ማስተካከያ በማለት በድጋሚ ከተስተካከለ በኋላ ጠቅላላ ውል ብር 325,698,152.86 ሲሆን ክለሳ የተሰራበት የብር መጠን 61,643,377.35 በጠቅላላ ውል 387,341,529 በልዩነት 170,273,281ብር እና በፕሮሰንትም 78% ተጨማሪ ያሳየ መሆኑ፤
- አምስት ኪሎ ጂ+8 የቢሮ እና ላብራቶሪ ግንባታ በመጀመርያ ውል የተገባበት የብር መጠን 53,367,054.63 ሲሆን ዋጋ ማስተካከያ በማለት በድጋሚ ከተስተካከለ በኋላ ጠቅላላ ውል ብር 166,038,680.05 በልዩነት 112,671,626ብር እና

✚ በእቅድ ከተያዘ በጀት ብር 13,267.38 ቢሊዮን በላይ ተጨማሪ በጀት የወጣባቸው ከ180 በላይ የመንገድ ፕሮጀክቶች፤ መኖራቸው ከዚህ ውስጥ ከ75% በላይ ተጨማሪ ወጪ የወጣላቸው የመንገድ ፕሮጀክቶች መሆናቸው፤ (ዝርዝር መረጃው በአባሪ 4 እና 5)

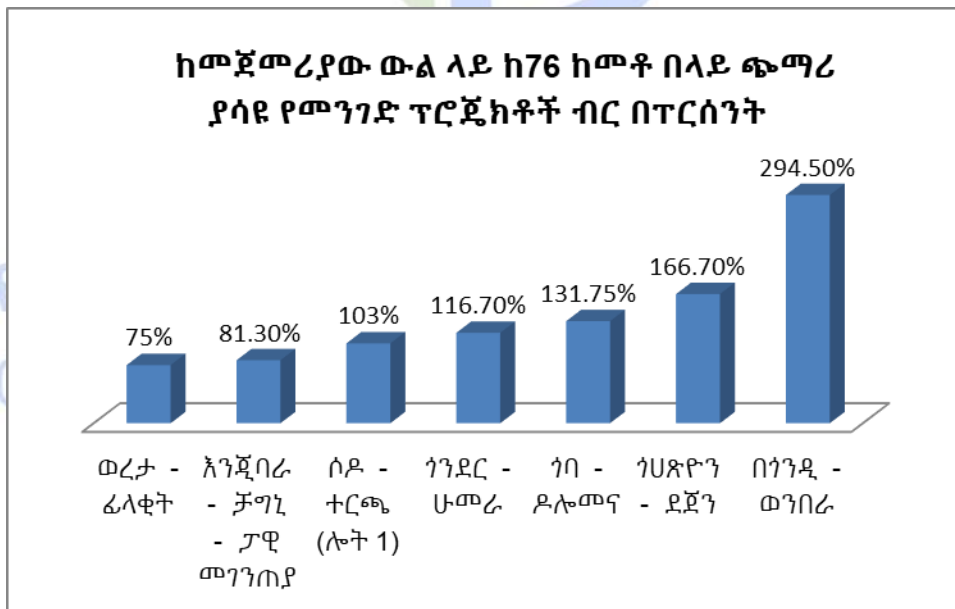

በአዲቱ ወቅት ከተከለሱ ማስረጃዎች፤ እና ከቀረቡ ቃለ-መጠይቆች ለማወቅ ተችሏል፡፡

53. ስለሁኔታው የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ኃላፊዎች ለቀረበላቸው መጠይቅና ለነባራዊ ሁኔታ መግለጫ፤በረቂቅ ርፖርት እና በመውጫ ስብሰባ በሰጡት ምላሽ

- የኃይል ፕሮጀክቶች በተመለከተ እነዚህ ፕሮጀክቶች ከፍተኛ የሆነ የመንግስት ክትትል የሚደረግባቸው ሲሆን በዋናነት የሚዘገዩበት ምክንያት የብድር ቶሎ

አለማግኘት፣ የፀጥታ ችግር፣ የውጭ ምንዛሬ ችግር፣ ከፍተኛ የሆኑ የሀገር ውስጥ የዋጋ ንረት መኖር፣ እና የፋይናንስ ፍላጎት ዋና ዋና መሆናቸውን፤

- ከላይ የቀረቡት የዩኒቨርሲቲ ፕሮጀክቶች በተመለከተ በመስሪያ ቤታችን ቀርበው የተገመገሙ ሳይሆኑ አዋጅ 2210/2012 ከመውጣቱ በፊት በመሆኑ በትክክል ባለመጠናታቸው የስራው ስፋት ስላማይታወቅ በጊዜ ሂደት ከፍተኛ የወጪ ጭማሪ እያስከተሉ የሚገኙ የሀገር ውስጥ የዋጋ ጭማሪም የራሱ የሆነ ተፅዕኖ ያለው መሆኑን፤
- የመስኖ ፕሮጀክቶች የተወሰኑት በፕላንና ልማት ሚኒስቴር አስተያየት የተሰጠበቻቸው ሲሆን የተደረገባቸው ማሻሻያም እስካሁን ድረስ ህግ በሚፈቅደው ወሰን ውስጥ ያለ መሆኑን። ለፕሮጀክቶች መዘግየት ቀደም ብሎ የተገለፁ ነበራዊ ሁኔታዎች አስተዋፅኦ ያደረጉ ሲሆን የእነዚህን ፕሮጀክቶች መዘግየት ከግምት በመስጠት በ2017 በጀት አመት ዝግጅት ወቅት ከገንዘብ ሚኒስቴር አንዲሁም ከመስኖና ቆላማ ልማት ሚኒስቴር ጋር በጋራ በመሆን ፕሮጀክቶችን እንደገና ቅደም ተከተል ማስያዝ እና በፕሮጀክት ትግበራ ላይ የሚታዩ ትግዳሮቶችን ለመፍታት ተግባራዊ አንቅስቃሴ እያደረጉ የሚገኙ መሆናቸውን፤
- የመንገድ ፕሮጀክቶች በተመለከተ የካላና ወሰን ማስከበር ስራዎች በትክክል አለመሰራታቸው ማለትም በወቅቱ ካላ ተከፍሎ ወሰን ማስከበር አለመቻል፤ የፀጥታ ችግር፣ የፋይናንስ ፍላጎት ችግር መኖር፤ መንገዶች የሚያቋርጣቸው ከተሞች የዲዛይን ለውጥ እንዲደረግ መጠየቅ፤ የሀገራዊ ዋጋ ንረት መኖር፤ የውጭ ምንዛሬ እጥረት፤ ተቋራጮች አቅም ማነስ፤ የአስፈፃሚው መስሪያ ቤት በቂ ክትትል አለማድረግ ዋና ዋናዎቹ ምክንያቶች መሆናቸውን፤
- ለረቂቅ ሪፖርት በጽሁፍ እና በመውጫ ስብሰባ በሰጡት ምላሽ ወቅት የመንግስት የልማት ፕሮጀክቶች በታቀደላቸው በጀት መጠናቀቅን በተመለከተ አዋጅ 1210/2012 ከመቋቋሙ በፊት የተጀመሩ ፕሮጀክቶች ናቸው። አዋጅ ቁጥር 1210/2012 ከወጣ በኋላ ህግ ከሚፈቅደው በላይ የዋጋ ማስተካከያ ለፕላንና ልማት ሚኒስቴር ቀርቦ ይሁንታ ሳያገኝ ተከናውኖ ከሆነ የሚመለከታቸው አካላት ተጠያቂ መሆን እንዳለባቸው፤

ገልጸዋል፡፡

54. የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የፕሮጀክቱ ኃላፊዎች ይህንን ቢሉም በአዲቱ ቡድኑ በናሙና በታዩ ተቋማት ከ2013 ዓ.ም ጀምሮ (ከአዋጁ በኋላ የተጀመሩ) 18 የሀይል ማመንጫ

ፕሮጀክት፣ ከ20 በላይ የመስኖ ፕሮጀክቶች፣ 210 የሚሆኑ የመንገድ ፕሮጀክቶች መኖራቸውን ከመብራት ሀይል ፣ከመስኖና ቆላማ ሚኒስቴር እና ከኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር መረጃ ያገኘን በመሆኑ፣ አዋጅ ቁጥር 1210/2012 እና አዋጅ ቁጥር 1263/2014 ከመውጣታቸው በፊት የተጀመሩ ፕሮጀክቶችን ሚኒስቴር መ/ቤቱ ፕሮጀክቶችን ቅድመ ግምገማ ማድረግን፣ ማጽደቅን እና መከታተልን እንዲሁም መቆጣጠርን በአዋጅ ቁጥር 1263/2014 ሥልጣን ሲሰጠው ከዚህ በፊት ይህንን ተግባር ሲሰራ ከነበረው ከገንዘብ ሚኒስቴር ጋር ከፕሮጀክት ጋር የተያያዙ መረጃዎችን አስመልክቶ ርክክብ ማድረግ ስለነበረበት፣ በመሆኑ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የሰጠውን ምላሽ ለመቀበል ያስቸግራል፡

55. የኦዲት ቡድኑ እንደምክንያት ያያቸው ችግሮች የፕላንና ልማት ሚኒስቴር መ/ቤቱ የመንግስት የልማት ፕሮጀክቶችን አዋጅ ቁጥር 1210/2012 በፊት የተጀመሩ ፕሮጀክቶችን በተመለከተ ሚኒስቴር መ/ቤቱ ፕሮጀክቶችን ቅድመ ግምገማ ማድረግን፣ ማጽደቅን እና መከታተልን እንዲሁም መቆጣጠርን በአዋጅ ቁጥር 1263/2014 ሥልጣን ሲሰጠው ከዚህ በፊት ይህንን ተግባር ሲሰራ ከነበረው ከገንዘብ ሚኒስቴር ጋር ከፕሮጀክት ጋር የተያያዙ መረጃዎችን አስመልክቶ ርክክብ ያላደረገ በመሆኑና ለፕሮጀክቶች በጀት ሲጠየቅ በጀት ጥያቄ ሲቀርብ የሚኒስቴር መ/ቤቱ ይሁንታ እና ከገንዘብ ሚኒስቴር ጋር መረጃ ልውውጥ አለማድረጋቸው፣ እና ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ችግሮችን ለመፍታት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመወያየት ለችግሩ መፍትሄ ሊሆኑ ይችላሉ ያላቸውን የመፍትሄ ሀሳብ ያቀረበበት መረጃ ተጠይቆ ባለመቅረቡ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የሰጠውን ምላሽ ለመቀበል ያስቸግራል፡፡
56. በኦዲት ለታዩ ችግሮች የፕላንና ልማት ሚኒስቴር ፕሮጀክቶችን ቅድመ ግምገማ ማድረግን፣ ማጽደቅን እና መከታተልን እንዲሁም መቆጣጠርን በአዋጅ ሥልጣን ሲሰጠው ከዚህ በፊት ይህንን ተግባር ሲሰራ ከነበረው ከገንዘብ ሚኒስቴር ጋር ከፕሮጀክት ጋር የተያያዙ መረጃዎችን አስመልክቶ ርክክብ አለማድረጉ፣ መ/ቤቱ የመንግስት የልማት ፕሮጀክቶችን በታቀደላቸው በጀት እየተከናወኑ መሆኑን አፈጻጸማቸውን አለመገምገሙ እንደዋነኛ መንስኤነት ተወስድዋል፡፡
57. የመንግስት የልማት ፕሮጀክቶች በታቀደላቸው በጀት አለመከናወናቸውና ከታቀደላቸው በጀት በላይ ወጪ በማስወጣት ሌላ ለሀገሪቱ እና ለህብረተሰቡ የሚጠቅሙ ፕሮጀክቶችን በማቀድ ተግባራዊ ከማድረግ ይልቅ የሀገሪቱ በጀት በነባር ፕሮጀክቶች ላይ እንዲውል አድርጓል፡፡

የመንግስት ፕሮጀክቶችን በተመለከተ ክትትል እና ግምገማ ማድረጉን በተመለከተ

58. የፕላንና ልማት ሚኒስቴር የመንግስት ፕሮጀክቶች እና ፕሮግራሞችን በጀት በየአመቱ በጀት ከመለቀቁ በፊት ያለበትን ሁኔታ ማረጋገጥ ይጠበቅበታል፡፡ በተጨማሪም ፕሮጀክቶቹን በዕቅድ ላይ ተመሰረቶ በመከታተል እና በመገምገም ግብረ መልስ ሊሰጥ ይገባል፡፡
59. ይሁን እንጂ በአዲቱ ወቅት በናሙና ከታዩ የመንግስት ፕሮጀክቶችን በመከታተል እና በመገምገም ቢያንስ በአመት እንድ ጊዜ የአፈጻጸም ሪፖርቶች በማዘጋጀት ለሚመለከተው አካል መቅረብ ያለበት መሆኑን የፌዴራል መንግስት አስፈጻሚ አካላትን ስልጣንና ተግባር ለመወሰን የወጣ አዋጅ 1263/2014 ዓ.ም አንቀጽ 18 ንዑስ አንቀጽ 1(ቸ) ላይ የተቀመጠ ሲሆን በአዲት ወቅት በናሙና ባየናቸው አካባቢዎች ለአብነት ያህል፡ በዋቻሞ፣ በድሬዳዋ፣ በሃሮማያ፣ በወላይታ በሶዶ፣ በሃዋሳ፣ እና አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲዎች የፕሮጀክቶችን አፈጻጸም በመገምገም ሪፖርት ያላደረገ መሆኑን ታውቋል፡፡
60. በተጨማሪም በናሙና ከታዩ የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ፕሮጀክቶቹ ውስጥ

➤ በሁለት ዩኒቨርሲቲዎች ፕሮጀክቶቹ ተጠናቀው ሥራ ከጀመሩ በኋላ ብር 2,964,476,085.00 በጀት የተመደበላቸውና የተለቀቀላቸው ፕሮጀክቶች እንዲሁም

➤ በአምስት ዩኒቨርሲቲዎች በጀት ተለቆላቸው ግን ገንዘቡ ለፕሮጀክቶቹ ሥራ ያልዋለባቸው ብር 1,110,208,910.22

በድምሩ ብር 4,074,684,995.22 ተመድቦ የተለቀቀ መሆኑ ታውቋል፡፡ ዝርዝራቸው ከዚህ በታች ቀርቧል፡፡

2013-2016 ከተጠናቀቁ በኋላ በጀት የተመደበላቸው የተለቀቀ እና በጀት ተመድቦና ወደ ሥራ ያልገቡ ፕሮጀክቶች የተለቀቀ የገዘንብ ድርሻ




ከተጠናቀቁ በኋላ በጀት የተመደበላቸው


61. በዋቻዋ የንቨርሲቲ እና በወላይታ ሶዶ የኒቨርሲቲዎች ከ2013-2016 ዓ.ም ከተጠናቀቁ ከአንድ አመት እስከ ሶስት አመት ለሆናቸው ፕሮጀክቶች በድምሩ ብር 2,964,476,085.00 ተመድቦላቸው ለፕሮጀክቶቹ ሥራ ላይ ያልዋሉ እና ገንዘቡም ፈሰስ ያልተደረገ መሆኑ ከገንዘብ ሚኒስቴር እና ከዩንቨርሲቲዎች በተገኘ በየአመቱ ከተመደበ በጀት የአይቤክስ መረጃ፣ የዶክመንት ክለሳ እና በአካል ምልከታ የተገኘ መሆኑ፤

1. በዋቻዋ የንቨርሲቲ ከ2013-2016 ዓ.ም ከተጠናቀቁ ከአንድ አመት እስከ ሶስት አመት ለሆናቸው ፕሮጀክቶች በ2013 በጀት ዓመት ለ4 ፕሮጀክቶች ብር 183, 080,000.00 በ2013 በጀት ዓመት ለ4 ፕሮጀክቶች ብር 183, 080,000.00 በ2014 በጀት ዓመት ለ30 ፕሮጀክቶች ብር 1,183, 565,714.00 በ2015 በጀት ዓመት ለ29 ፕሮጀክቶች ብር 405, 689,805.00 በ2016 በጀት ዓመት ለ10 ፕሮጀክቶች ብር 107,742,016.00 በድምሩ ብር 1,880, 077,535.00 በጀት የተየዘላቸውና የተለቀቀላቸው መሆኑ፤

(ዝርዝሩ በአባሪ 9 ተያይዟል)

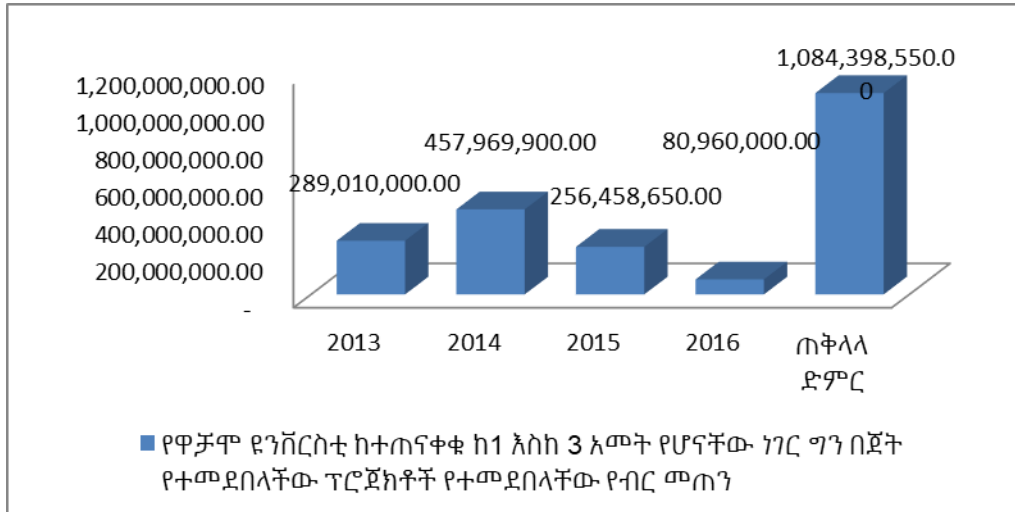

2. በወላይታ ሶዶ የንሽርስቲ ከ2013-2016 ዓ.ም ከተጠናቀቁ ከአንድ አመት እስከ ሶስት አመት ለሆናቸው ፕሮጀክቶች በድምሩ ብር 1,418, 654,681.60 በጀት የተየዘላቸውና የተለቀቀላቸው መሆኑ፤ (ዝርዝሩ በአባሪ 10 ተያይዟል)

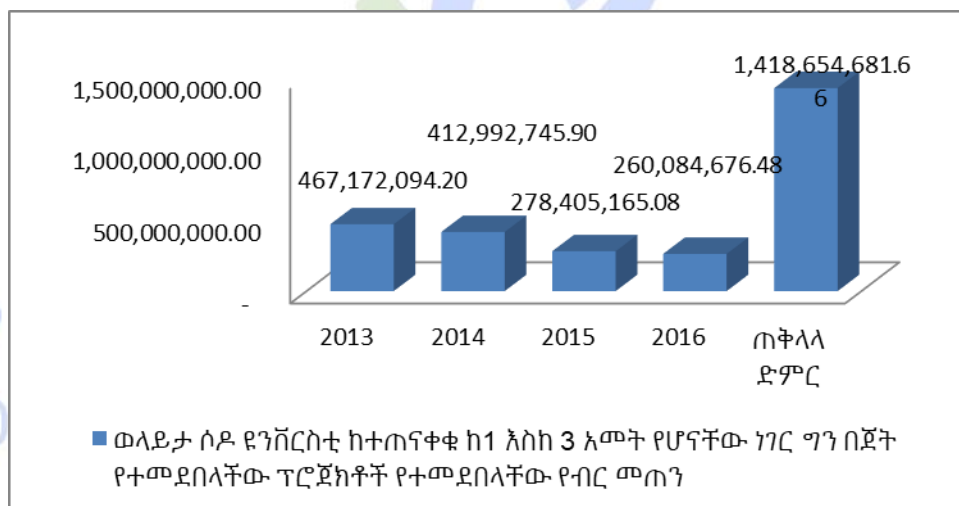


በጀት አስመድበውና ተለቆላቸው ወደ ሥራ ያልገቡ ፕሮጀክቶች

62. በአዲቱ ወቅት በጀት ተመድቦላቸው ያልተከናወኑ የአዲስ አበባ የኒሽርስቲ፣ የድሬዳዋ የንሽርስቲ፣ ሀሮማያ፣ ዋቸዋ እና የወላይታ ሶዶ የኒሽርስቲዎች የሚገኙ 36 የግንባታ ፕሮጀክቶች በድምሩ ብር 1,110,208,910.22 ተመድቦላቸው ለፕሮጀክቶቹ ሥራ ላይ ያልዋሉ እና ገንዘቡም ፈሰሰ ያልተደረገ መሆኑ ከገንዘብ ሚኒስቴር እና ከየንሽርስቲዎች በተገኘ በየአመቱ ከተመደበ በጀት የአይቤክስ መረጃ፣ የዶክመንት ክለሳ እና በአካል ምልክታ የተገኘ መሆኑ፡፡

አዲስ አበባ የኒቨርሲቲ

- ለ13 ፕሮጀክቶች በ2014 በጀት አመት ብር 227,750,000.00 እና በ 2015 በጀት አመት ብር 210,000,000.00 በድምሩ 437,750,000.00 በጀት ተለቆላቸው ፕሮጀክቱ ያልተሰራና በጀቱም ተመላሽ ያልተደረገ መሆኑ ከየኒቨርሲቲው ያገኘው መረጃ ያሟያሳይ መሆኑ፤ (ዝርዝር መረጃ በአባሪ 7 ተያይዟል)

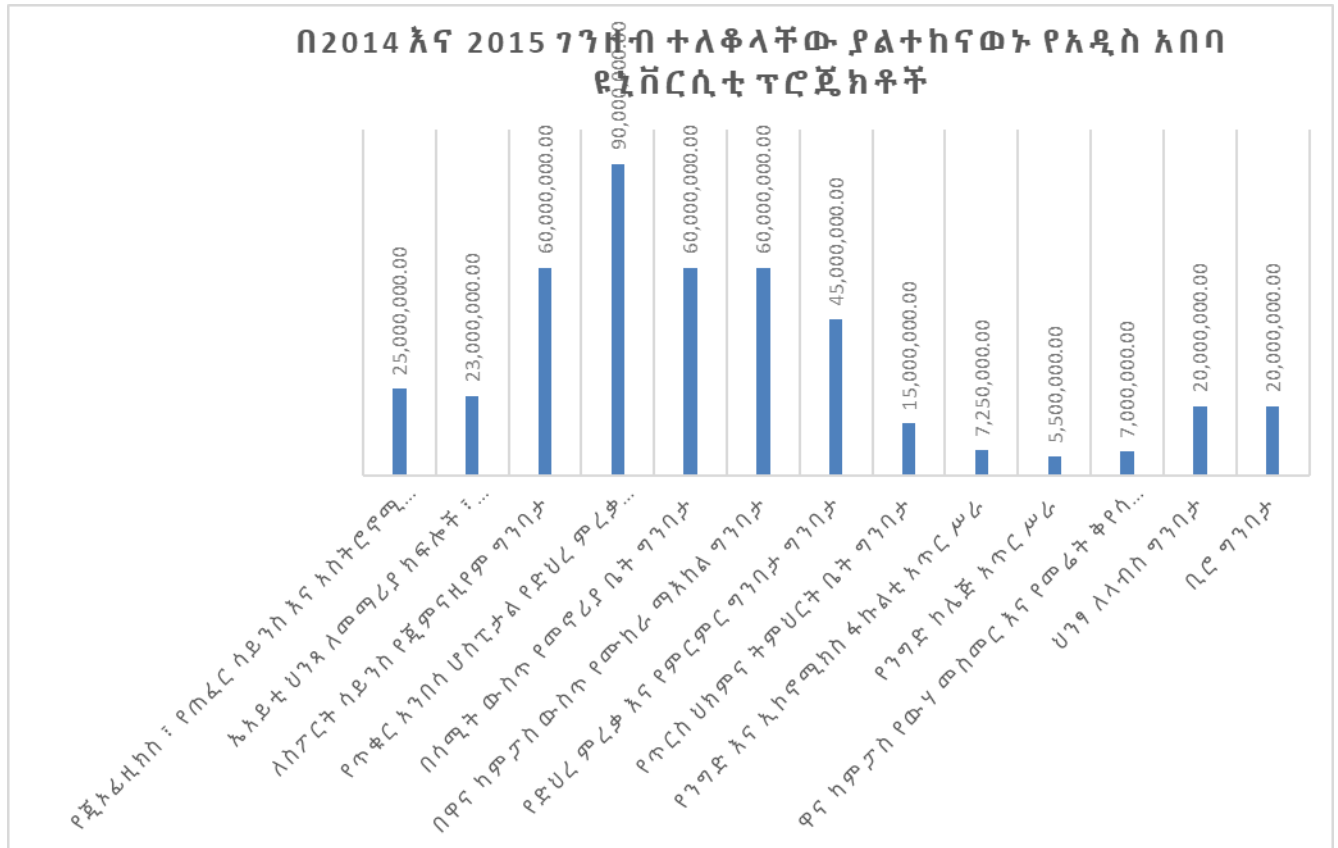


በድሬዳዋ የኒቨርሲቲ

- በየኒቨርሲቲው በኩል ሊገኙ ታቀዱ በጀት ተይዞላቸው ፕሮጀክቶች ውስጥ በ2014 ለ9 ፕሮጀክቶች ብር 182 365 000.00 በ2015 ለ10 ፕሮጀክቶች ብር 198,960,000.00 እና በ2016 ለ12 ፕሮጀክቶች ብር 221,585,829.00 በድምሩ ብር 602,920,829.00 ከተለቀቀላቸው በኋላ ፕሮጀክቶቹ ያልተከናወኑና የተለቀቀው በጀትም ተመላሽ አለመደረጉን ከየኒቨርሲቲው የተገኘ መረጃ ያሟያሳይ መሆኑ፤ (ዝርዝር አባሪ 8 ላይ ተያይዟል)


➤ አንዱ የእንግዳ ማረፊያ ግንባታ ፕሮጀክት ሲሆን የግንባታ ቦታውን ከከተማ አስተዳደሩ ሳይረከብ ውል መግባቱና ለዚህም ብር 11 ሚሊዮን ወይም የፕሮጀክቱን 20 በመቶ በቅድመ ክፍያ የተከፈለ እና

ከ2013 ዓ.ም ጀምሮ አዲቱ እክተከናወነበት ድረስ ግንባታው ያልተጀመረ እና የተለቀቀላቸውንም ገንዘብ ተመላሽ ያልሆነ መሆኑ

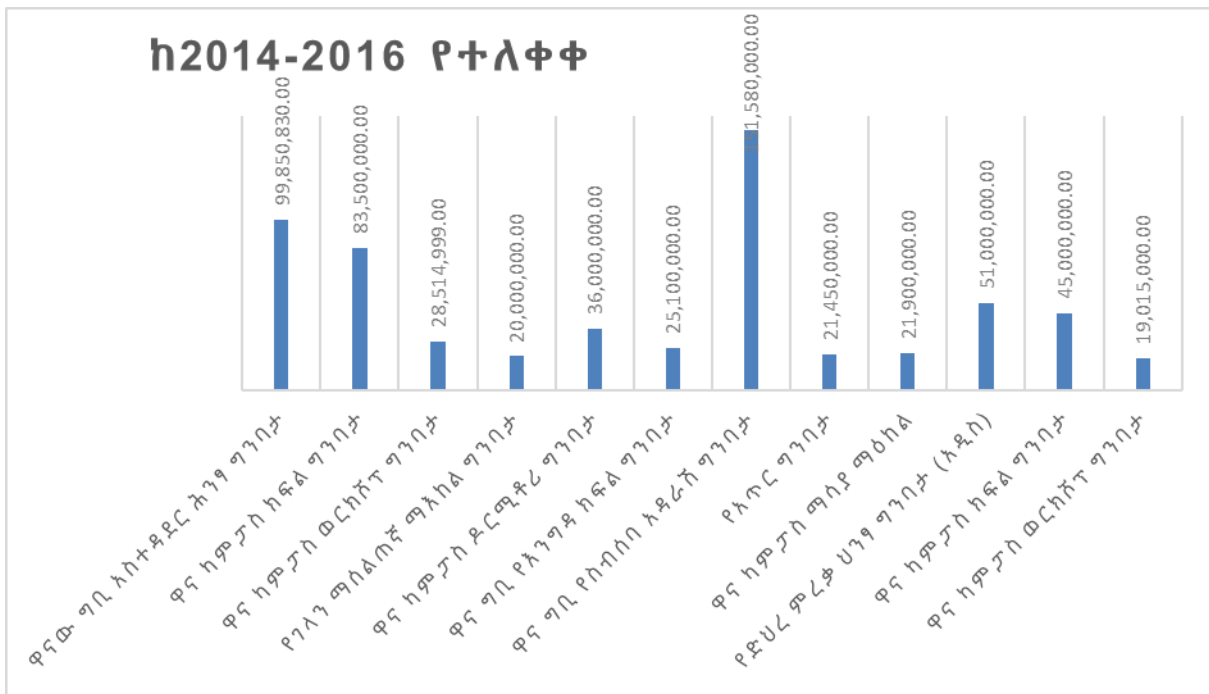


በሀሮማያ ዩንቨርሲቲ

- በሀሮማያ ዩንቨርሲቲ በጀት ከ2013-2016 በጀት አመት ተመድቦላቸው ያልተከናወኑ ፕሮጀክቶች መኖራቸው በጀት የተያዘላቸውና ገንዘቡ ተለቆላቸው ሥራዎቹ ያልተከናወኑና የተለቀቀውንም በጀት ፈሰስ ያላደረጉ መሆኑን፤
- በዋናው ግቢ የአጥርና የመንገድ ስራ ብር 72,793,000.00 በዋናው ግቢ የህጻናት ማቆያ፣ ብር 8,340,000.00 የላብራቶሪ ጥገናና የላይብረሪ የጣርያ ጥገና 1,634,610.00፣ ማዕከላዊ ቤተ-መከራ ህንጻ ጥገና ስራ፣ የዋናው ቤተ-መጽሀፍት ህንጻ ጥገና ስራ፣ የግብርና እና አካባቢ ጥበቃ ኮሌጅ ህንጻ ጥገና ስራ ብር 3,831,920.00፣ የኮዶሚኒየም ጥገና ብር 3,831,920.00 በድምሩ ብር 90,431,450.00 ከተለቀቀላቸው በኋላ ፕሮጀክቶቹ ያልተከናወኑና የተለቀቀው በጀትም ተመላሽ አለመደረጉን፤

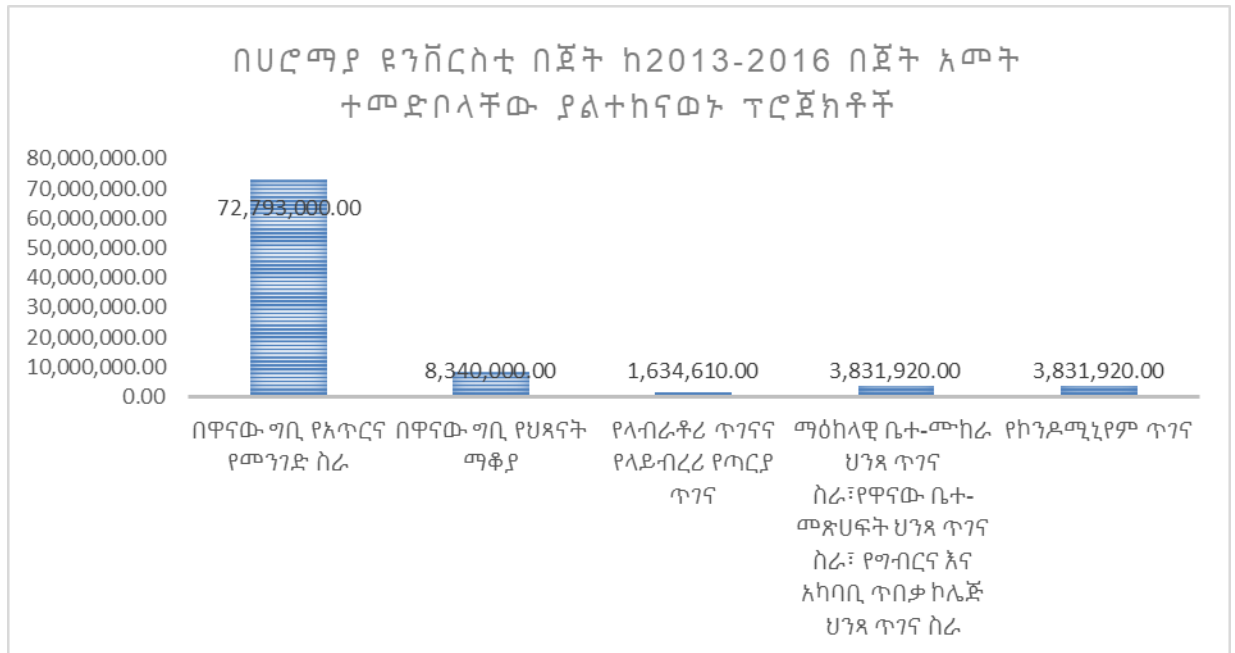

ዋቸሞ የኒቨርሲቲ

- በ2016 በጀት ተለቆላቸው ያልተከናወኑ ነገር ግን ገንዘቡን ፈሰስ ያላደረጉ ፕሮጀክቶች በድምሩ ብር 39,440,000.00 ከተለቀቀላቸው በኋላ ፕሮጀክቶቹ ያልተከናወኑና የተለቀቀው በጀትም ተመላሽ አለመደረጉን

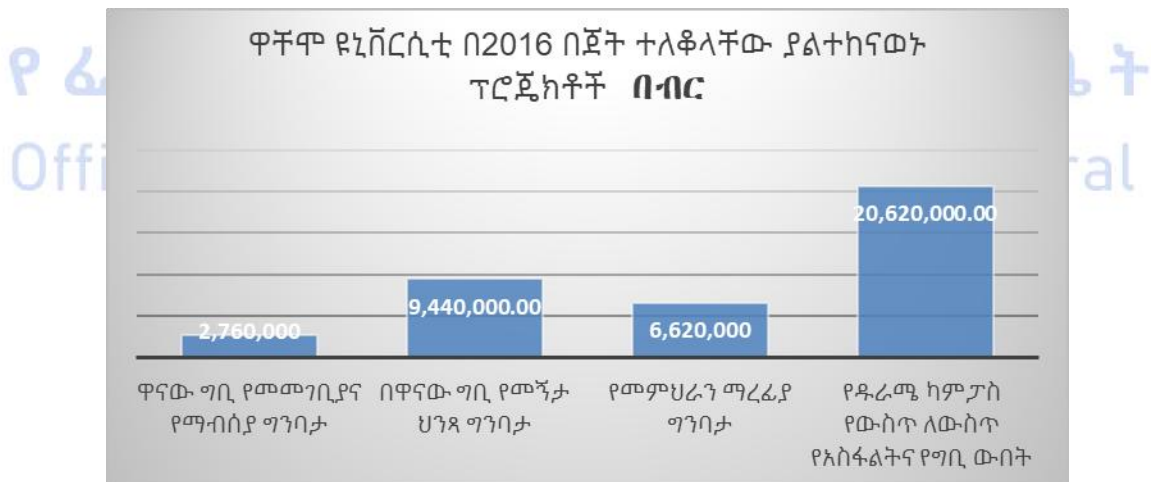


በወላይታ ሶዶ የኒቨርሲቲ

- በወላይታ ሶዶ የኒቨርሲቲ በጀት ተይዞላቸው እና ተለቆ ያልተገነቡ ሁለት ፕሮጀክቶች
 - በአበላ የምርምር ማእከል ብር 131,627,561.38፤

➤ በቦዲቲ የተማሪዎች ማደሪያ ብር 202,014,069.84

በድምሩ ብር 333,641,631.22 በጀት ተለቆ ሥራ ላይ ያልዋለ መሆኑና የተለቀቀው በጀትም ተመላሽ አለመደረጉን

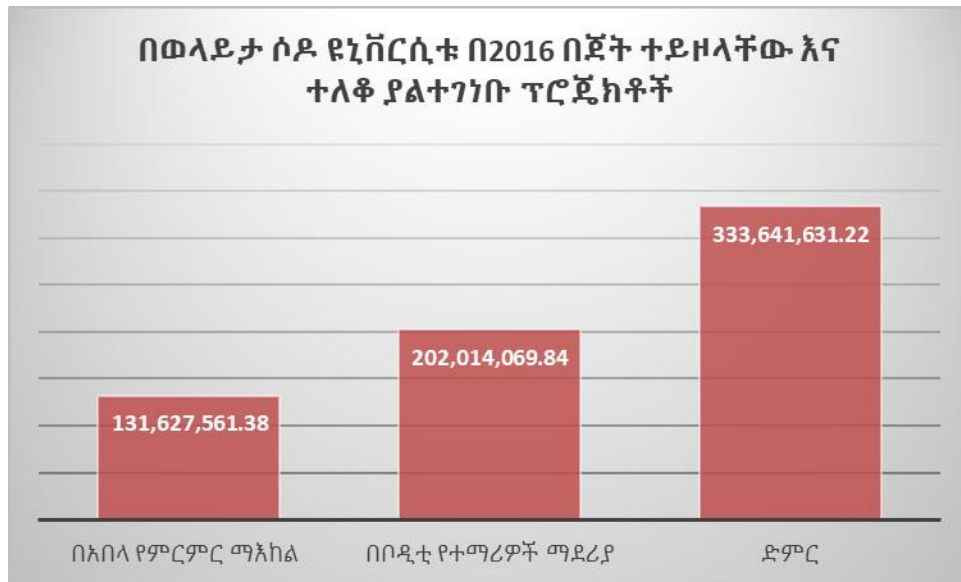

በኦዲቱ ወቅት ከተከለሱ ማስረጃዎች፣ የአካል ምልክታዎች እና ከቀረቡ ቃለ-መጠይቆች ለማወቅ ተችሏል፡፡

63. ስለሁኔታው የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የፕሮጀክቶች አስተባባሪ ለቀረበላቸው መጠይቅና የበላይ ኃላፊዎች ለነባራዊ ሁኔታ መግለጫ ፣ ለረቂቅ ሪፖርቱ በጽሁፍ እና በመውጫ ስብሰባ በሰጡት ምላሽ

- ቀደም ብሎ የፕላንና ልማት ሚኒስቴር ካላቸው ፋይዳ አንፃር በአዋጅ 1210/2012 መሰረት የተጀመሩ ባይሆንም ጠቀሜታቸው የጎላ ፕሮጀክቶች ላይ ያደረጋቸውን የመስክ ግምገማ እና የክትትልና ግምገማ ሪፖርት መቅረቡን፤
- ቀደም ብሎ እንደተገለፀው አዋጁ ተግባራዊ የሚሆነው በዚህ ሂደት አልፈው ተግባራዊ የተደረጉ ፕሮጀክቶች ላይ በመሆኑ እና አዲስ ፕሮጀክቶች ወደ ስራ የገቡ ባለመሆኑ በዚህ ደረጃ በአዲስ ፕሮጀክቶች ላይ በተለይ በአዋጁ መሰረት አልፈው ተግባራዊ የተደረጉ ፕሮጀክቶች ባለመኖራቸው አለመከናወኑን፤
- ለረቂቅ ሪፖርቱ በጽሁፍ በሰጡት ምላሽ የፕላንና ልማት ሚኒስቴር የፕሮጀክት ማናጅመንትን ተክቶ ክትትልና ግምገማ የማድረግ ስልጣን የለውም ይህንን ለማድረግ የሚያስችል አደረጃጀት አለመኖር፤ በማለት ምላሽ ሰጥተዋል፡፡

64. የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ኃላፊዎች ይህንን ቢሉም ከአስፈጻሚ ተቋማት ጋር በጋራ በመሆኑ በበላይነት በመምራት በመከታተልና በመቆጣጠር በመገምገምና ለየፕሮጀክቶች አስፈጻሚ አካላት ግብረመልስ የመስጠት ተግባርና ኃላፊነት የሚኒስቴር መ/ቤቱ በመሆኑ፤ በናሙና በታዩ ፕሮጀክቶች ዙርያ ክትትል እና ግብረመልስ የተደረገበት መረጃ ከ2013 ተጠይቆ ያልቀረበ በመሆኑ፤ በአዲሱ ወቅት በናሙና በታዩ በመስኖ፤ በመንገድ ግንባታ ፕሮጀክቶች፤ በአዋጅ ቁጥር 1210/2012 እና በአዋጅ ቁጥር 1263/2014 መሠረት ሚኒስቴር መ/ቤቱ ፕሮጀክቶችን ቅድመ ግምገማ ማድረግ፤ ማጽደቅን እና መከታተልን እንዲሁም መቆጣጠርን በአዋጅ ሥልጣን ሲሰጠው ከዚህ በፊት ይህንን ተግባር ሲሰራ ከነበረው ከገንዘብ ሚኒስቴር ጋር ከፕሮጀክት ጋር የተያያዙ መረጃዎችን አስመልክቶ ርክክብ ያላደረገ በመሆኑና ለፕሮጀክቶች በጀት ሲጠየቅ ከገንዘብ ሚኒስቴር ጋር መረጃ ልውውጥ አለማድረጋቸው፤ በጀት በሥራ ላይ ያሉና የተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች ያሉበት ደረጃ ምን ላይ እንደሆነ ሥርዓት ዘርግቶ መከታተልና ማረጋገጥ ስለነበረበት፤ በሚኒስቴር መ/ቤቱ የተሰጠውን ምላሽ ለመቀበል ያስቸግራል፡፡
65. የፕላንና ልማት ሚኒስቴር መ/ቤቱ የመንግስት የልማት ፕሮጀክቶችን መቼ ተጀምረው መቼ እንደሚያልቁ እንዲሁም በየጊዜው ያሉበትን የፌዚካልና የፋይናንስ ሁኔታ ለማወቅ የሚያስችል ሥርዓት ዘርግቶ አለመከታተሉ፤ በአዋጅ ቁጥር 1263/2014 እናአዋጅ ቁጥር 1210/2012 በፊት የተጀመሩ ፕሮጀክቶችን በተመለከተ ሚኒስቴር መ/ቤቱ ፕሮጀክቶችን ቅድመ ግምገማ ማድረግ፤ ማጽደቅን እና መከታተልን እንዲሁም መቆጣጠርን በአዋጅ ሥልጣን ሲሰጠው ከዚህ በፊት ይህንን ተግባር ሲሰራ ከነበረው ከገንዘብ ሚኒስቴር ጋር ከፕሮጀክት ጋር የተያያዙ መረጃዎችን አስመልክቶ ርክክብ አለማድረጉ፤ ለፕሮጀክቶች በጀት ሲጠየቅ ከገንዘብ ሚኒስቴር ጋር መረጃ ልውውጥ አለማድረጋቸው እና ከመፈቀዱ በፊት የሚኒስቴር መ/ቤቱን ይሁንታ አለማግኘቱ፤ እንዲሁም የፕሮጀክት በጀት የተለቀቀላቸውም ላይ እና የተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች ላይ ድህረ ግምገማ አለማከናወኑ ለእነዚህ ክፍተቶች በመንስኤነት አስተዋጽኦ አድርገዋል፡፡
66. በመሆኑም የመንግስት የልማት ፕሮጀክቶች ያሉበትን ሁኔታ ለማወቅ የሚያስችል ሥርዓት ሚኒስቴር መ/ቤቱ ተግባራዊ አለማድረጉና አለመከታተሉ ለተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች በጀት እንዲመደብና እንዲለቀቅ እንዲሁም አስፈጻሚ አካላት በጀት ተለቆላቸው አመቱን ሙሉ ምንም የፕሮጀክት ሥራ ሳያከናውኑ የተመደበውን ገንዘብ

ለሌላ ተግባር እንዲያውሉት ያደረገ፤ መንግስትም ያለውን ውስን ሀብት ለሌላ የልማት ሥራ እንዳይውል ያደረገ ከመሆኑም በላይ ለብልሹ አሰራር በር ከፍቷል፡፡

በአስፈጻሚ አካላት ዝቅተኛ አፈጻጸም ያላቸውን የመንግስት ፕሮጀክቶች በመገምገም ግብረመልስ መስጠቱን በተመለከተ

67. የፕላንና ልማት ሚኒስትር መ/ቤቱ የመንግስት ፕሮጀክትና ፕሮግራሞችን በአስፈጻሚ አካላት ዝቅተኛ አፈጻጸም ያላቸውን በመገምገም ግብረመልስ ሊሰጣቸው ይገባል፡፡

68. ይሁን እንጂ በአዲቱ ወቅት

- አዋጅ ቁጥር 1210/2012 ተግባራዊ ለማድረግ የሚያግዝ ረቂቅ ደንብ ተዘጋጅቶ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ያልቀረበ መሆኑ፤
- ፕሮጀክቶች በአዋጁ መሰረት ከፍተኛ፣ መካከለኛ እና ዝቅተኛ ተብለው የሚለዩበት መስፈርት አለመውጣቱ፤
- በአስፈጻሚ አካላት ዝቅተኛ አፈጻጸም ያላቸውን የመንግስት ፕሮጀክቶች ላይ ሚኒስቴር መ/ቤቱ ክትትል በማድረግ አፈጻጸማቸው እንዲሻሻል ግብረ መልስ አለመስጠቱ በአዲቱ ወቅት በናሙና የታዩ በዋቻሞ፣ በወላይታ ሶዶ፣ በድሬዳዋ፣ በሃሮማያ ዩኒቨርሲቲ እና በመስኖ እና በመንገድ ፕሮጀክቶች በመጠጥ ውሃ ፕሮጀክቶች ላይ ያልተሰጠ መሆኑን በአዲቱ ወቅት በዩኒቨርሲቲዎቹ ከተከለሱ ማስረጃዎች፣ የአካል ምልክታዎች እና ከቀረቡ ቃለ-መጠይቆች ለማወቅ ተችሏል፡፡

69. ስለሁኔታው የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ኃላፊዎች ለቀረበላቸው መጠይቅና ለነባራዊ ሁኔታ እንዲሁም በመውጫ ስብሰባ ወቅት በሰጡት መግለጫ በሰጡት ምላሽ

- በአሁን ሰዓት በአንድ እቅድ ሪፖርት አሰራር መሰረት የተተካ ሲሆን ይበልጥ ሀገራዊ ለማድረግ የክትትልና ግምገማ ሀገራዊ ፖለሲ በመዘጋጀት ላይ እንደሚገኝ፤
- ደንቡ ያዘገየበት ምክንያት ከአዋጁ አፈጻጸም አንጻር የሚጻዩ ክፍተቶችን በመለየት ለማካተትና ምላሽ ለመስጠት በማሰብ ያዘገዩት መሆናቸውን
- ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ከአስፈጻሚ መስሪያ ቤቶች ጋር ባለው መደበኛ የእቅድ ዝግጅትና ክትትልና ግምገማ ስራዎች አማካኝነት የፕሮጀክቶችን አፈፃፀም በተመለከተ የተመረጡ ፕሮጀክቶችን ሁሉንም ፕሮጀክቶች በዴስክ እና በመስክ በመገምገም ግብረ መልስ ማለትም ምን ችግሮች አሉ ችግር በማን ይፈታል የሚሉ የመስክ ግምገማ ሪፖርቶች መቅረቡን፤

- በ2016 በጀት አመትም የኃይል ፕሮጀክቶች፣ የመስኖ ፕሮጀክቶች፣ የመንገድ ፕሮጀክቶች፣ ውሀ ፕሮጀክቶች ላይ ባለድርሻ አካላትን በማሳተፍ ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች በተገኙበት በጠቅላይ ሚኒስቴር ጽ/ቤት ግምገማ በማድረግ ግብረ መልስ ሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን ለሚመለከታቸው አካላት ማቅረባቸውን
- ለረቂቅ ሪፖርቱ በጽሑፍ እና በመውጫ ስብሰባ በሰጡት ምላሽ ፕሮጀክቶችን ክትትል ሊያደርግ የሚችለው የፕሮጀክቶቹ ባለቤት እንጂ የፕላንና ልማት ሚኒስቴር በሀገሪቱ የሚተገበሩ ፕሮጀክቶችን በሙሉ ተደራሽ ሊያደርግ የማይችሉ መሆኑን፣ ስለዚህ ስትራቴጂክ ጠቀሜታ ያላቸው እና ከፍተኛ የሆኑ ፕሮጀክቶችን ክትትል በማድረግ ለጠቅላይ ሚኒስቴሩ በየሩብ አመቱ ሪፖርት የሚደረግ መሆኑን፣ በተጨማሪም ዝቅተኛ አፈጻጸም ያለባቸውንም በመስክ ጭምር ግምገማ ተደርጎባቸዋል፡፡

በማለት ገልጸዋል፡፡

70. የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የፕሮጀክቱ ኃላፊዎች ይህንን ቢሉም

- በአዋጅ ቁጥር 1263/2014 አንቀጽ28/ቀ መሰረት አጠቃላይ የመንግስት ፕሮጀክቶችን ሱፐርቪዥን የመመራት አፈጻጸማቸውን የመከታተልና መገምገም፣ የሚኒስቴር መ/ቤቱ ድርሻ በመሆኑ፣
- ከፍተኛ የሚባሉት ፕሮጀክቶችን ለመለየት ሚኒስቴር መ/ቤቱ መስፈርት ያላዘጋጀ በመሆኑ እና መካከለኛና ዝቅተኛ ፕሮጀክቶችን በአስፈጻሚ አካላት ብቻ ግምገማ እንዲደረግ ውክልና እና ኃላፊነት እንዲኖራቸው ለማድረግ የህግ ማዕቀፍ (በደንብም ይሁን በመመሪያ) ያላዘጋጀ በመሆኑ፣
- በኦዲቱ ወቅት በናሙና በታዩ በመስኖ፣ በመንገድ ግንባታ ፕሮጀክቶች፣ በዋቻዎ የኒቨርሲቲ፣ በድሬዳዋ የኒቨርሲቲ፣ በሀሮማያ የኒቨርሲቲ፣ እና በወላይታ ሶዶ የኒቨርሲቲ የግንባታ ፕሮጀክቶች በተደረገ ዶክመንት ክለሳ እና ቃለመጠይቅ በተገኙ መረጃዎች በየአመቱ የፕሮጀክቶችን አፈጻጸም በመከታተል ያለበትን ደረጃ በመገምገም ግብረመልስ በመስጠት በተሰጠው ግብረመልስ ላይ ውይይት የማድረግ ስራ በተወሰኑ ፕሮጀክቶች ላይ የተከናወነ ቢሆንም ያልተከናወነባቸው ፕሮጀክቶች በመኖራቸው

የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የሰጠው ምላሽ ለመቀበል ያስቸግራል፡፡

71. የኦዲት ቡድኑ እንደምክንያት ያያቸው ችግሮች የፕላንና ልማት ሚኒስቴር መ/ቤቱ የመንግስት የልማት ፕሮጀክቶችን በሚያስፈጽሙ ተቋማት በጠቅላላ ለመቆጣጠር

የሰው ኃይል መዋቅሩን በሚሟሉት ባለሞያዎችን በመመደብ በየእሩብ አመቱ ክትትልና ቁጥጥር በማድረግ ዝቅተኛ አፈጻጸም ያላቸውን በመገምገም ፕሮጀክቶችን በሚያስፈጽሙ ተቋማት ላይ በቅርበት ክትትል በማድረግ በተወካዮች ምክር ቤት በወጣው የክትትልና ቁጥጥር መመሪያ መሰረት የእርምት እርምጃ እንዲወስዱ ለሚመለከተው አካል የማሳወቅ ስራ ያልተሰራ በመሆኑ ሁሉንም የልማት ተቋማት ተደራሽ የሚያደርግ የሰው ሀይል እና የክትትልና ቁጥጥር ዕጥረት በመኖሩ ችግሩ እንዲፈጠር አድርጓል

72. ይህ ሊሆን ባለመቻሉ የመንግስት የልማት ፕሮጀክት አስፈጻሚ አካላት በተሰጣቸው ግብረመልስ ተግባራዊ በማድረግ ፕሮጀክቶችን በታለመላቸው አላማ፣ በጀት፣ ጥራት እና ጊዜ ተጠናቀው ለህብረተሰቡ ወይም ለሚመለከተው አካል በተቀላጠፈ ሁኔታ አግልግሎት እንዳይሰጡ አድርጓል

ማንኛውም የፌዴራል መንግስት ፕሮጀክት ከፕሮጀክት ከጽንሰ ሀሳብ ጀምሮ እስከ ሚጠናቀቅበት ድረስ ያለው መረጃ የሚይዝበትና ልውውጥ የሚደረግበት ዘመናዊ የመረጃ አያያዝ ሥርዓትና ቋት መዘጋጀቱን በተመለከተ

73. የፕላንና ልማት ሚኒስትር መ/ቤቱ ማንኛውም የፌዴራል መንግስት ከፕሮጀክት ጽንሰ ሀሳብ ጀምሮ እስከ ሚጠናቀቅበት ድረስ ያለው መረጃ የሚያዝበት እንዲሁም የፕሮጀክቱን አፈጻጸም በተመለከተ የመረጃ የሚለዋወጥበት ሥርዓት ዘርግቶ ተግባራዊ ሊያደርግ ይገባል፡፡ በተጨማሪም መረጃዎቹም በተደራጀ መልክ የሚያዝበት ዘመናዊ መረጃ ቋት (database) ሊያቋቁም ይገባል፡፡

74. ይሁን እንጂ በአዲቱ ወቅት የመንግስት ማንኛውንም ፕሮጀክቶች ከአስፈፃሚ አካላት የሚተላለፈውን ፕሮጀክት ከጽንሰ ሀሳብ ጀምሮ እስከ ትግበራ ድረስ የሚያሳይ ዝርዝር መረጃ የሚይዝበት፣ የመረጃ ልውውጥ የሚደረግበት ዘመናዊ የመረጃ አያያዝ ሥርዓትና የመረጃ ቋት (database) በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አለመኖሩ በአዲቱ ወቅት ከተከለሱ ማስረጃዎች፣ የአካል ምልክታዎች እና ከቀረቡ ቃለ-መጠይቆች ታውቋል፡፡

75. ስለሁኔታው ሁኔታ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የፕሮጀክት አስተባባሪ እና የበላይ ኃላፊዎች ለቀረበላቸው መጠይቅ እና ለነባራዊ ሁኔታ መግለጫ በረቂቅ ሪፖርት በጽሁፍ እና በመውጫ ስብሰባ በሰጡት ምላሽ ከአለም ባንክ ጋር በመተባበበር ስርዓቱ ምን መያዝ እንዳለበት እና ስራውን ፍስት የሚያሳይ ዝርዝር ጥናት መከናወኑን፤

- ስራው ከሚያስፈልገው ሀብት አንፃር በቀጣይ መንግስት በሚመድበው መሰረት ማዕከላዊ የመረጃ ቋቱ ተግባራዊ የሚደረግ መሆኑን።
 - ለጊዜው ግን በፕላንና ልማት ሚኒስቴር በኩል የአጭር ጊዜ እና የረጅም ጊዜ መፍትሄዎችን ለመስጠት እየተሰራ እንደሚገኝ፤
 - የፕሮጀክቶችን አጠቃላይ መረጃ ማለትም ከፅንሰ ሀሳብ ጀምሮ እስከ አገልግሎት መስጠት ድረስ ያለውን ሁኔታ ለመከታተል የሚያስችል አሰራር ለመዘርጋት ከገንዘብ ሚኒስቴር እና አለም ባንክ ጋር በጋራ የልማት ፕሮጀክቶች ኢንቨስትመንት አስተዳደር ኢንፎርሜሽን ሲስትም ልዋቶ ከተጠናቀቀ በኋላ ከኢ.ፌ.ሚስ ጋር አንድ ሞጁል ሆኖ የሚገናኝ ሲሆን ማንኛውንም መረጃ የሚይዝ በመሆኑ መንግስት ፕሮጀክቶች ላይ የሚወስድው ውሳኔ በመረጃ ላይ የተደገፈ እንዲሆን የሚያስችል እንደሚሆን፤ ነገር ግን ይህ እርዓት ከሚፈልገው ከፍተኛ ፋይናንስ አቅም አንፃር በቀጣይ በሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ታይቶ እና ሀገሪቱ ይህንን የመረጃ ስርዓት መዘርጋት የሚያስችላት አቅም መኖሩ ሲረጋገጥ ወደ ትግበራ የሚገባ ይሆናል፤
- በማለት ገልጸዋል፡፡

76. በመሆኑም የመንግስት የልማት ፕሮጀክቶች መረጃዎች ከጽንሰ ሀሳብ ጀምሮ እስከ ሚጠናቀቅበት ጊዜ ያሉ መረጃዎች ወጥ በሆነ መልኩ በዘመናዊ የመረጃ አያያዝ ዘዴ ተደራጅተው አለመያዛቸው የፕሮጀክቶቹን ሁኔታ ያለባቸውን ሁኔታ እንዳይታወቅና አፋጣኝ ግብረ መልስና ክትትል ማድረግን አዳጋች አድረጎታል፡፡
የመንግስት ፕሮጀክቶችንና ፕሮግራሞችን የሚመለከታቸውን ባለድርሻ አካላትን በማቀናጀትና በማሳተፍ በጋራ ሊገመግምና ግብረመልስ መስጠቱን በተመለከተ
77. የፕላንና ልማት ሚኒስትር መ/ቤቱ የመንግስት ፕሮጀክቶችንና ፕሮግራሞችን የሚመለከታቸውን ባለድርሻ አካላትን በማቀናጀትና በማሳተፍ በጋራ ሊገመግምና ግብረመልስ ሊሰጥ ይገባል፡፡
78. ይሁን እንጂ በኦዲቱ ወቅት የመንግስት ፕሮጀክቶችን በተመለከተ የሚመለከታቸውን ባለድርሻ አካላትን በማቀናጀትና በማሳተፍ በጋራ በመገምገም ግብረ መልስ እንዲሰጥ የፌደራል መንግስት አስፈጻሚ አካላትን ስልጣንና ተግባር ለመወሰን የወጣ አዋጅ 1263/2014 ዓ.ም አንቀጽ 18 ንዑስ አንቀጽ 1(ቀ) እና -የፌደራል መንግስት አስፈጻሚ አካላት አዋጅ ቁጥር 1263/2014 ገጽ 13792//አገራዊ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን

እቅድ የሚኒስትሮች ምክርቤት የአፈጻጸም ክትትልና ግምገማ መመሪያ ጥር 9.2018 ገጽ 29 የሚያገዝ ቢሆንም በአዲቱ ወቅት በናሙና በታዩ የመንግስት ፕሮጀክቶችን በሚያስፈጽሙ ተቋማት ለአብነት ያህል፡- በዋቻሞ፣ በወላይታ ሶዶ፣ በሀዋሳ፣ በድሬዳዋ ፣ በሃሮማያ ዩንቨርሲቲዎች፣ የመጠጥ ውሃ ግንባታ ፕሮጀክቶች፣የግብርና ፕሮጀክቶች፣የጤና ተቋማት ፕሮጀክቶች፣ የመንገድ ፕሮጀክቶችን ከባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት በጋራ በመገምገም ግብረመልስ ያልተሰጠ መሆኑን በአዲቱ ወቅት ከተከለሱ ማስረጃዎች፣ የአካል ምልከታዎች እና ከቀረቡ ቃለ-መጠይቆች ለማወቅ ተችሏል፡፡

79. ስለሁኔታው የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ሀላፊዎች በማጠቃለያ ጥያቄ፣ በነባራዊ ሁኔታ መግለጫ እና ለረቂቅ ሪፖርቱ በጽሑፍ እና በመውጫ ስብሰባ በሰጡት ምላሽ
 - የልማት ፕሮጀክቶችን አቀናጅቶ ከመምራት አንፃር እንደ ፕላንና ልማት ሚኒስቴር በተለያዩ ጊዜያት ባለድርሻ አካትን በማሳተፍ ክትትል በተለይም በመስክ ክትትል በሚደረግበት ወቅት የሚመለከታቸውን አካላት በማሳተፍ ግምገማ ያካሂዱ መሆኑን፣ የንፁህ ውሀ መጠጥ ፕሮጀክቶች በተመለከተ፡ በየሩብ አመት ያላቸውን አፈፃፀም በዴስክ ሪቪው ክትትል የሚያደርጉ መሆኑን በተለይ ሁሉም አስፈፃሚ አካላት ወጥ በሆነ መንገድ የፕሮጀክቶች አፈፃፀም ሪፖርት ማቅረብ እንዲችሉ ወጥ የሆነ ፎርማት በማዘጋጀት እንዲልኩ የማድረግ ስራዎች መሰራታቸውን፣
 - መንገድ ፕሮጀክቶችም እንዲሁ የደረሱበት አፈፃፀም በየሩብ አመቱ የሚልኩበት ሁኔታ ያለ መሆኑን
 - በመስክ ተገኘቶ ከመገምገምም አንፃር የፕላንና ልማት ሚኒስቴር በአዋጅ 1210/2012 በተሰጠው ስልጣንና ተግባር መሰረት ስትራቴጂክ የሆኑ ፕሮጀክቶችን ከሚመለከታቸው አካት ጋር በመሆን ግምገማ በማድረግ የመንግስት ከፍተኛ አመራሮች በተገኙበት የሪፖርትን ውጤት የማቅረብ ስራዎችን መሰራቱን፣ ለአብነት በ2016 ዓ.ም ከተለያዩ ፌደራል መስሪያ ቤቶች የተዉጣጡ አካላት በመንገድ ፕሮጀክቶች፣በውሀ ፕሮጀክቶች ፣በሀይል ፕሮጀክቶች ፣በመስኖ ፕሮጀክቶች ላይ በዴስክና በመስክ በመገኘት ፕሮጀክቶችን እንዲገመገሙ በማድረግ ለከፍተኛ አመራሩ እንዲቀርብ እና አቅጣጫ እንዲሰጥባቸው መደረጉን፣
 - አሁንም የፕላንና ልማት ሚኒስቴር የሀገሪቱ ፕሮጀክቶች ከመነሻ ጀምሮ እስከ አገልግሎት ወይም ምርት እስኪሰጡ ባለው ሂደት ውስጥ ውጤታማነታቸውን ለማሻሻል የሚያስችል አሰራር ስርዓትን መዘርጋት ላይ አተኩሮ እንደሚሰራ፤

- ነገር ግን በገነባነው ስርዓት ልክ ፕሮጀክቶች እየተተገበሩ መሆኑን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን አስፈላጊውን የእርምት እርምጃ እንዲወሰዱ ለማድረግ ተገቢ መሆኑን፤

80. የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የፕሮጀክቱ ኃላፊዎች ይህንን ቢሉም በአዲቱ ወቅት በናሙና ባየናቸው በመስኖ፣ በመንገድ ግንባታ ፕሮጀክቶች፣በዋቻዋ ፣በድሬዳዋ ፣በሀረር፣ በወላይታ ሶዶ እና በሀዋሳ ዩንቨርሲቲ እና በክልሉ ልማትና ፕላን ኮሚሽን የግንባታ ፕሮጀክቶች በተደረገ ዶክመንት ክለሳ እና ቃለመጠይቅ በተገኙ መረጃዎች ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በጋራ በመሆን ፕሮጀክቶች ያሉበትን ደረጃ በየሩብ አመቱ የማይገመገም መሆኑ፤ በ2016 ዓ.ም ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በጋራ በመሆን በቅንጅት ክትትል የተደረገበት መረጃ ያልቀረበ በመሆኑ የሰጠውን ምላሽ ለመቀበል ያዳግታል፡፡
81. የአዲት ቡድኑ በአዲቱ ወቅት ለችግሩ ምክንያት ነው በማለት የተረዳው የልማት ፕሮጀክቶችን ከሚያስፈጽሙ ተቋማት ጋር በጋራ በመሆን በቅንጅት በየእሩብ አመቱ ያሉበትን ደረጃ በመገምገም አፈጻጸማቸውን በመለየት ለያንዳንዱ ተቋማት በጋራም ሆነ በተናጥል ግብረመልስ የሚሰጥበት እቅድ በማቀድ ተግባራዊ ያልተደረገ በመሆኑ ችግሩ ሊከሰት ችሏል፡፡
82. ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት ባለመሰራቱ አስፈጻሚ አካላት ያለባቸውን ችግር በመለየት የመፍትሄ ሀሳብ እዳያቀርቡ አድርጓል፤ የመንግስት የልማት ፕሮጀክቶች በታቀደለት ጊዜና በጀት በጥራት ተጠናቀው ለህብረተሰቡ አገልግሎት እዳይሰጡ ተጽእኖ አድርጓል፤ የባለድርሻ አካላት የመንግስት የልማት ፕሮጀክቶች ለታለመላቸው አላማ ለማዋል እንዲቻል ችግሮቻቸው ምን እደሆነ ከተለያዩ ባለሞያዎች ጋር በመቀናጀት የመፍትሄ ሀሳብ እንዳይሰጡ አድርጓል፡፡

ክፍል ሶስት

መደምደሚያ ሀሳብ

83. የመንግስት ፕሮጀክቶች ዝግጅት፣ ክትትልና ቁጥጥር ሥርዓት አፈጻጸም ዙሪያ የተስተዋሉ የአሠራር ክፍተቶችን መሰረት በማድረግ የሚከተሉት መደምደሚያ ሃሳቦች ላይ ተደርጏል፡-

- የፕላንና ልማት ሚኒስቴር የፕሮጀክቶችን አፈጻጸም የሚመለከቱ ተግባራትን በአዋጅ ቁጥር 1263/2064 እና አዋጅ ቁጥር 2010/2012 ወደ እርሱ ሲተላለፍ ከገንዘብ ሚኒስቴር ፕሮጀክትን የሚመለከቱ ሰነዶችን ርክክብ አላደረገም፤
- ለሚያከናውኗቸው የግንባታ ፕሮጀክቶች የአዋቂነት ጥናት ያላከናወኑ አስፈጻሚ ተቋማት አሉ፤
- የፕሮጀክቶቹ አዋቂነት ለፕላን ሚኒስቴር ቀርቦ ይሁንታ አግኝተው በጀት እንዲመደብላቸው ለገንዘብ ሚኒስቴር ስለመተላለፋቸው ማሰረጃ ያልቀረበላቸው ፕሮጀክቶች ተገኝተዋል፤
- ከፕላን ሚኒስቴር ይሁንታ ሳያገኝ እና ቅደም ተከተል ውስጥ ሳይገቡ ነገር ግን ከገንዘብ ሚኒስቴር በጀት ተመድቦላቸው ወደ ትግበራ የገቡ ፕሮጀክቶች ተገኝተዋል፤
- ለእያንዳንዱ ፕሮጀክት ተግባራዊ ከመደረጉ በፊት በአስፈጻሚ ተቋማት የአካባቢና የማህበራዊ ተጽዕኖ ግምገማ ሳይከናውን እና የተከናወኑትም መደረጉን በሚመለከተው ባለሥልጣን ተቀባይነት ማግኘቱ የማይረጋግጥ መሆኑ፤
- አዋቂነታቸው ተረጋግጦ፣ ተመርጠው እና ቅደም ተከተል ተይዞላቸው በበጀት ላይ እንዲካተቱ የተመረጡ ፕሮጀክቶች በበጀት ከመካተታቸው በፊት የፌዚካልና ፋይናንሺያል እቅድ በፕሮጀክት አስፈጻሚ አካል የተዘጋጀ መርሀ ግብር የፕሮጀክት አስፈጻሚዎች የማዘጋጃ እና መዘጋጀታቸውንም የፕላንና ልማት ሚኒስትር መ/ቤቱ የማይረጋግጥ መሆኑ፤
- በታቀደላቸው ጊዜ የማይጠናቀቁ እና ከአንድ አመት እስከ 7 አመት የዘገዩ የመንግስት ፕሮጀክቶች መኖራቸው፤

- የመንግስት ፕሮጀክቶች በታቀደላቸው ወጭ(በጀት) የማይጠናቀቁ እና እስከ 200% ተጨማሪ በጀት የጠየቁ የኤሌክትሪክ ኃይል፣ የዩኒቨርሲቲዎች፣ የመስኖ እና የመንገድ ፕሮጀክቶች መኖራቸው፤
 - ተጠናቀው ሥራ ለጀመሩ ፕሮጀክቶች በጀት የሚመድብና የሚለቀቅላቸው እንዲሁም በጀት ተመድቦና ተለቆላቸው የማይከናወኑ የዩኒቨርሲቲ ፕሮጀክቶች መገኘታቸው፤
 - ሚኒስቴር መ/ቤቱ አዋጅ ቁጥር 1210/2012 ተግባራዊ ለማድረግ የሚያግዝ ረቂቅ ደንብ ተዘጋጅቶ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ያልቀረበ መሆኑ፤
 - ሚኒስቴር መ/ቤቱ ፕሮጀክቶች በአዋጁ መሰረት ከፍተኛ፣ መካከለኛ እና ዝቅተኛ ተብለው የሚለዩበት መስፈርት አለመውጣቱ፤
 - የፕላንና ልማት ሚኒስትር መ/ቤቱ የመንግስት ፕሮጀክትና ፕሮግራሞችን በአስፈጻሚ አካላት ዝቅተኛ አፈጻጸም ያላቸውን በመገምገም ግብረመልስ መሰጠቱን ክትትልና ቁጥጥር የማያደርግ መሆኑ
 - በአገሪቱ ውስጥ የሚከናወኑ የፌዴራል መንግስት ፕሮጀክቶች ከጽንሰ ሀሳብ ጀምሮ እስከ ትግበራ ድረስ የሚያሳይ ዝርዝር መረጃ የሚይዝበት ዘመናዊ መረጃ ሥርዓትና ቋት (database) የለም፤
 - የፕላንና ልማት ሚኒስትር መ/ቤቱ የመንግስት ፕሮጀክቶችና ፕሮግራሞችን የሚመለከታቸውን ባለድርሻ አካላትን በማቀናጀትና በማሳተፍ በጋራ የሚገመገምበትና ግብረመልስ የሚሰጥበት የአሰራር ስርአት ያልዘረጋ መሆኑ፡፡
- ታውቋል፡፡

84. በመሆኑም በአዲቱ ወቅት የተገኙትን ድክመቶች እና ችግሮች ለማስወገድ ወይም ለማቃለል አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ብለን ያመንባቸውን የማሻሻያ ሃሳቦች በሚቀጥለው የሪፖርቱ ክፍል አቅርበናል፡፡

የማሻሻያ ሀሳብ

85. የመንግስት ፕሮጀክቶች ዝግጅት፣ ክትትልና ቁጥጥር ሥርዓት አፈጻጸም ዙሪያ ጋር በተያያዘ ከላይ የተጠቀሱ የአሰራር ክፍተቶችን ያሻሽላል ብለን ያመንባቸውን የሚከተሉትን የማሻሻያ ሀሳቦች አቅርበናል፡፡


- የፕላንና ልማት ሚኒስቴር አዋጅ ቁጥር 1210/2012 እና አዋጅ ቁጥር 1263 ከመውጣታቸው በፊት የተጀመሩ ፕሮጀክቶችን የሚመለከቱ መረጃዎችን ከገንዘብ ሚኒስቴር ሊረከብና አደራጅቶ በመያዝ ተገቢውን የክትትልና የቁጥጥር ተግባር ማከናወን ይጠበቅበታል፡፡ በተጨማሪም ወደፊት የታቀዱ የመንግስት ፕሮጀክቶች የአዋቂነት ጥናት እና የአካባቢ ተጽዕኖ ግምገማ በአስፈጻሚ ተቋማት መከናወናቸውን በማረጋገጥ የቀረበውን ጥናት በዝርዝር በመገምገም ውሳኔ ሊሰጥ ይገባል፡፡ በተጨማሪም እንዲተገበሩም የተመረጡ ፕሮጀክቶች የፊዚካል እና የፋይናንሻል የትግበራ መርሃ ግብር ማዘጋጀታቸውን ሊያረጋግጥ እና በመርሃ ግብሩ መሰረት እየተገበረ መሆኑን ሊከታተል ይገባል፡፡ በተጨማሪም የፕሮጀክት አስፈጻሚ ተቋማት በህግ በተቀመጠው መሰረት ለማከናወን ለሚፈልጓቸው ፕሮጀክቶች ከጽንሰ ሃሳብ ጀምሮ የአዋቂነት ጥናት ሊያዘጋጁ፣ ለፕላንና ልማት ሚኒስቴር በማቅረብ ሊያስገመገሙ እና የሚኒስቴር ይሁንታን ሲያገኙና በሚያስቀምጠው ቅደም ተከተል መሰረት ለገንዘብ ሚኒስቴር እየቀረበ በጀት ሊያዝላቸው ይገባል፡፡ የገንዘብ ሚኒስቴርም የፕላንና ልማት ሚኒስቴር ይሁንታና ቅደም ተከተልን መሰረት በማድረግ ብቻ ለአዳዲስ ፕሮጀክቶች በጀት ሊፈቅድ ይገባል፡፡

- * ሚኒስቴር መ/ቤቱ አሁን በመከናወን ላይ ያለ የመንግስት ፕሮጀክቶች ሆኑ ወደፊት የሚጀመሩ ፕሮጀክቶች በታቀደላቸው ጊዜ እና በጀት መሰረት መከናወናቸውንና መጠናቀቃቸውን ክትትልና ቁጥጥር በመደረግ ጠንካራ ፊሲካል ዲሲፕሊን የሚሰፍንበትን አሠራር ተግባራዊ ሊያደርግ ይገባል፡፡ በተለያዩ ምክንያት የዘገዩ እና ተጨማሪ ወጪ የጠየቁ ፕሮጀክቶችንም ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን ችግራቸው ተፈቶ የሚጠናቀቁበትንና ወደ ትግበራ የሚገቡበትን ስልት በመቀየስ ሊተገብር ይገባል፡፡

- ሚኒስቴር መ/ቤቱ ከገንዘብ ሚኒስቴር እና ከዘርፍ መ/ቤቶች ጋር በመሆን የፕሮጀክቶች ክትትልና ቁጥጥር ግምገማን በማጠናከር ፕሮጀክቶች ያለበትን ወቅታዊ ደረጃ የሚታወቅበትን ሥርዓት ሊዘረጋ፤ በየዓመቱ በጀት የሚመደብላቸው ፕሮጀክቶች በእርግጥ በሥራ ላይ መኖራቸውን ሊረጋገጥና የተመደበውም ገንዘብ ለፕሮጀክቶቹ መዋላቸውን ሊያረጋግጥ ይገባል፡፡ ከዚህ በተጨማሪም ለፕሮጀክቶች የተመደበ በጀትን ለሌላ ተግባር የሚያውሉት ላይ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን የተጠያቂነት ሥርዓት በመዘርጋት ተግባራዊ ሊያደርግ ይገባል፡፡
- የፕላንና ልማት ሚኒስቴር ከፍተኛ፣ መካከለኛ እና ዝቅተኛ ፕሮጀክቶች ተብለው የሚመደቡበትን መስፈርት ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን መስፈርት ሊያወጣ እና በእያንዳንዱ ደረጃ የተመደቡ ፕሮጀክቶችን ማን እንዴት መከታተል እንዳለበት ረቂቅ ደንብ በማዘጋጀትና በማጸደቅ ወደ ተግባር ሊገባ ይገባል፡፡ የመንግስት ፕሮጀክትና ፕሮግራሞችን ከዘርፍ መ/ቤቶችና ከገንዘብ ሚኒስቴር ጋር በመሆን በፕሮጀክት አስፈጻሚ አካላት ዝቅተኛ አፈጻጸም ያላቸውን ፕሮጀክቶችን በጋራ በመገምገምና ግብረመልስ በመሰጠት አፈጻጸማቸው የሚሻሻልበትን ሁኔታ ማመቻቸት ይጠበቅበታል፡፡
- ሚኒስቴር መ/ቤቱ በአዋጅ ቁጥር 1210/2012 በኋላ ለሚኒስቴር መ/ቤቱ የቀረቡ ፕሮጀክቶችን እንዲሁም ከአዋጁ በፊት በገንዘብ ሚኒስቴር በኩል የተጀመሩ ማንኛውም ፕሮጀክት የሚመለከቱ ከጽንሰ ሀሳብ ጀምሮ እስከ ትግበራ ድረስ የሚያሳይ ዝርዝር መረጃ የሚያዘበት ዘመናዊ መረጃ አያያዝና ልውውጥ ሥርዓት በመዘርጋት ተግባራዊ ሊያደርግና መረጃዎቹ የሚያዘበት ቋት (database) ማቋቋም ይጠበቅበታል፡፡
- የመንግስት ፕሮጀክቶችና ፕሮግራሞችን የሚመለከታቸውን ባለድርሻ አካላትን በማቀናጀትና በማሳተፍ በጋራ የሚገመግሙበትንና ግብረመልስ የሚሰጥበት የአሰራር ስርአት በመዘርጋት ተግባራዊ ማድረግ አለበት፡፡

በመጨረሻም በአዲሱ ወቅት የፕላንና የልማት ሚኒስቴር የበላይ ሥራ ኃላፊዎች እና ሠራተኞች እንዲሁም መረጃ የሰበሰብንባቸው የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት የስራ ኃላፊዎችና ሠራተኞች ለአዲሱ ሥራ መሳካት ላደረጉልን የሥራ ትብብር እና መሰግናለን፡፡

አባሪ አንድ፡ የመስሪያ ቤቱ ድርጅታዊ መዋቅር

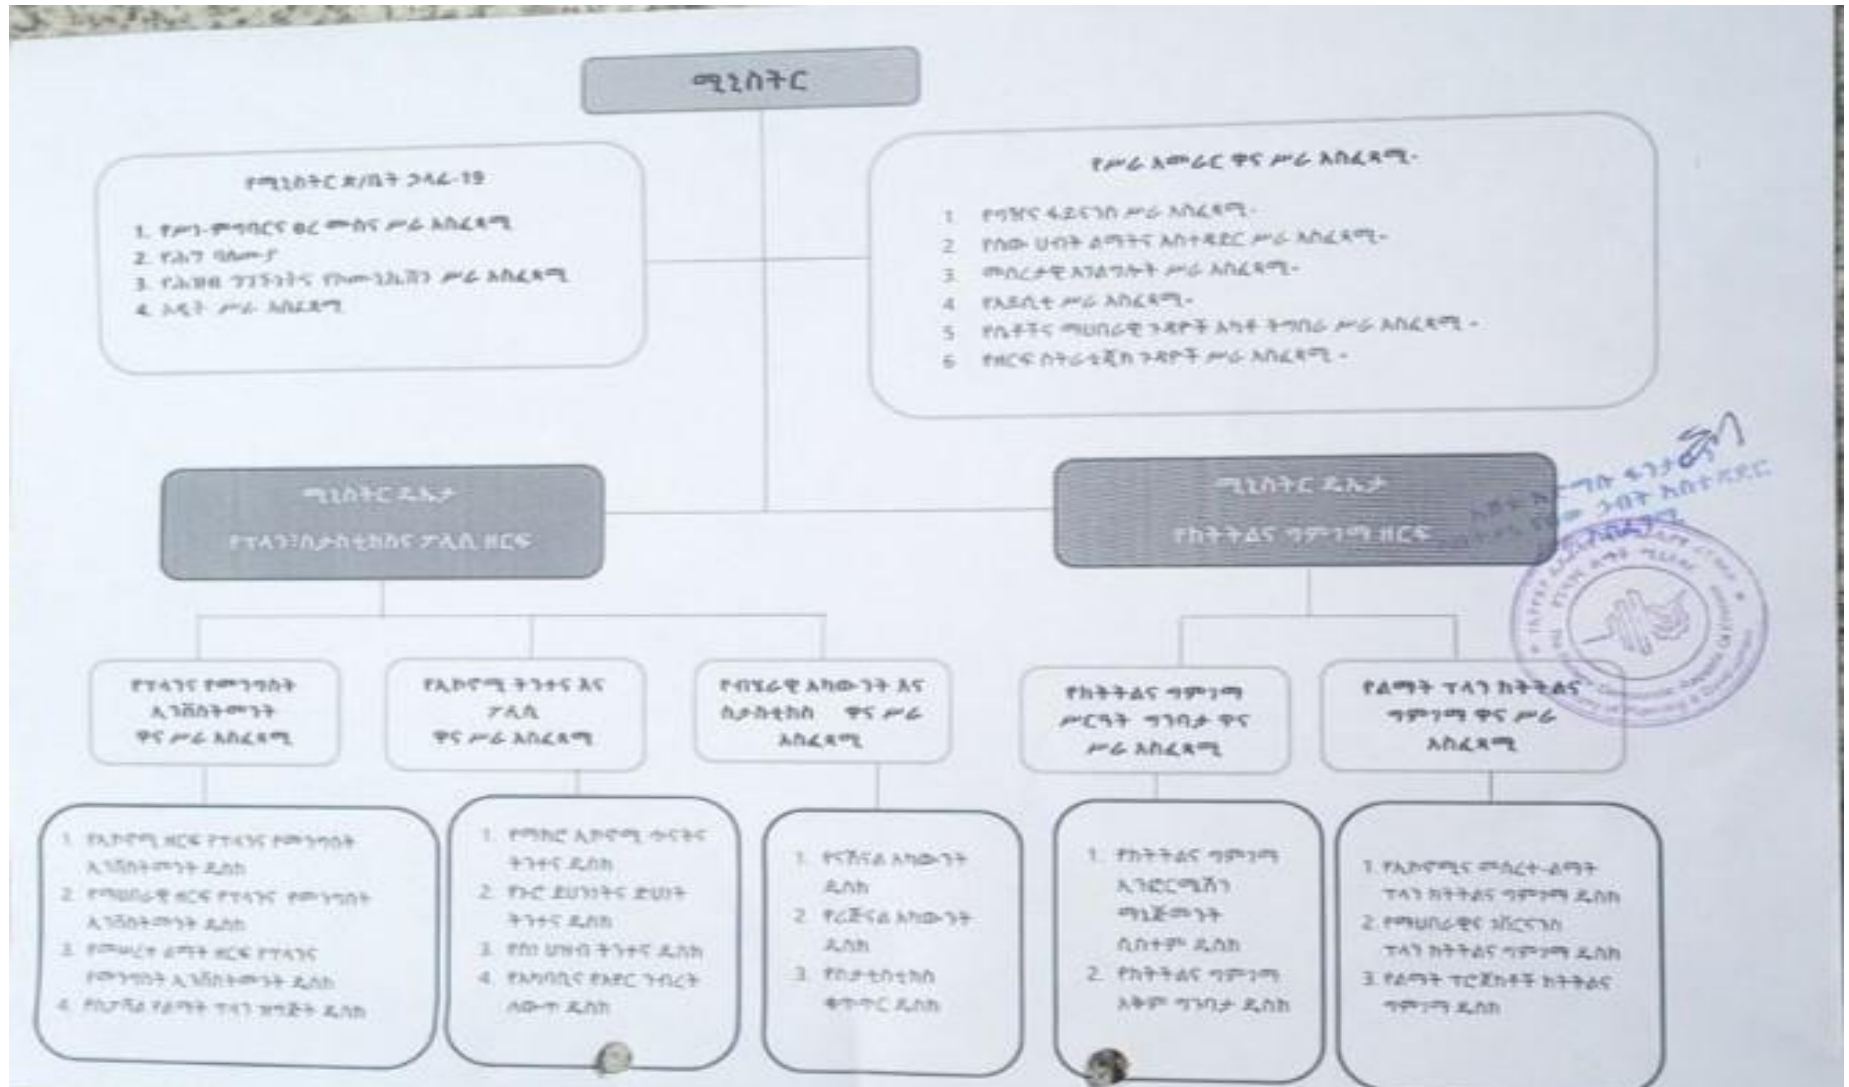

አባሪ ሁለት: የመመዘኛ መስፈርቶች (Evaluative Criteria)

ተ.ቁ	የአዲት ችግሮች (Audit issues)	የመመዘኛ መስፈርት (Evaluating criteria)
1	ሚኒስቴር መ/ቤቱ የመንግስት ፕሮጀክቶችና ፕሮግራሞች ወደ ትግበራ ከመግባታቸው በፊት የቅድመ አዋቂነት ጥናት እና አዋቂነት ጥናት ፣ በገለልተኛ አካል እንዲጠና እና ፕሮጀክቶች በቅደም ተከተላቸው መሰረት በጀት የተለቀቀላቸው መሆኑን ማረጋገጥ የሚያስችል የአሰራር ስርአት የዘረጋ እና ተግባራዊ ያደረገ መሆኑን መገምገም፡፡	1.1. የፕላንና ልማት ሚኒስትር መ/ቤቱ በጀት ተመድቦላቸው እንዲተገበሩ ጥያቄ የሚቀርብላቸው የመንግስት ፕሮጀክቶች የፍላጎት፣ ለአገር እና ለተጠቃሚዎች የሚያስገኘው ዝርዝር ፋይዳን የሚያሳይ ዝርዝር የአዋቂነት ጥናት እና ግምገማ ሊከናወን ይገባል ምንጭ:-የፌዴራል መንግስት ፕሮጀክቶች አስተዳደር እና አመራር ስርአት አዋጅ 1210/2012 ገፅ 12713 (16)
		1.2. ለእያንዳንዱ ፕሮጀክት ተግባራዊ ከመደረጉ በፊት የአካባቢና የማህበራዊ ተጽዕኖ ግምገማ መከናወኑ ሊረጋገጥ ይገባል፡፡ ምንጭ:-የፌዴራል መንግስት ፕሮጀክቶች አስተዳደር እና አመራር ስርአት አዋጅ 1210/2012 ገፅ 12713(16)
		1.3. የፕላንና ልማት ሚኒስቴር መ/ቤቱ የመንግስት ፕሮጀክቶች በውል ግዜያቸው መሰረት ተጠናቀው ርክክብ ያልተደረጉ ከሆነ የዘገየበትን በውሉ መሰረት ቅጣት መቀጣቱን እና ለመንግስት ገቢ መሆኑን ክትትል ሊያደርግ ይገባል፡፡ ምንጭ:-የመንግስት ፕሮጀክቶች የውል ስምምነት ሰነድ
		1.5. የፕላንና ልማት ሚኒስትር መ/ቤቱ አዋቂነታቸው የተረጋገጠ አዳዲስ የመንግስት ፕሮጀክቶች ከዓመታዊ በጀት ፍላጎትና አቅርቦት አንፃር ቅድሚያ የሚያገኘውን ለመምረጥ እና ለማጽደቅ የሚያስችል መስፈርት ተዘጋጅቶ ተግባራዊ ሊደረግ ይገባል፡፡ ምንጭ:- የፌዴራል መንግስት ፕሮጀክቶች አስተዳደር እና አመራር ስርአት አዋጅ 1210/2012 ገፅ 12707
		1.6 .የፕላንና ልማት ሚኒስትር መ/ቤቱ አዋቂነታቸው ተረጋግጦ፣ ተመርጠው እና ቅደም ተከተል ተይዞላቸው በበጀት ላይ እንዲካተቱ የተመረጡ ፕሮጀክቶች በበጀት ከመካተታቸው በፊት የፌዚካልና ፋይናንሺያል እቅድ በፕሮጀክት አስፈጻሚ አካል የተዘጋጀ መርሀ ግብር ያላቸው ስለመሆኑ ሊያረጋግጥ ይገባል፡፡ ምንጭ:-የፌዴራል መንግስት ፕሮጀክቶች አስተዳደር እና አመራር ስርአት አዋጅ 1210/2012 ገፅ 12710/የፕላንና ልማት ሚኒስቴር ስልጣንና ተግባር የፌዴራል መንግስት አስፈፃሚ አካላት መወሰኛ አዋጅ 1263/2014 ገጽ 13792
		1.7. የፕላንና ልማት ሚኒስትር መ/ቤቱ የፕሮጀክቶች የሚያቀርቡት ዋጋ ክለሳ ከተፈቀደው የገንዘብ መጠን በመቶኛ በላይ የዋጋ ጭማሪ የሚያስፈልገው ከሆነ በድጋሚ የአዋቂነት ግምገማ ሊዘጋጅላቸው እና ለውሳኔ ሰጪ አካል ቀርቦ እንዲጸድቅ ሊያደርግ ይገባል፡፡ ምንጭ:- የፌዴራል መንግስት ፕሮጀክቶች አስተዳደር እና አመራር ስርአት አዋጅ 1210/2012 ገፅ 12714
2	የፕላንና ልማት ሚኒስትር መ/ቤቱ በመንግስት	2.1 የፕላንና ልማት ሚኒስትር መ/ቤቱ የመንግስት ፕሮጀክቶች በታቀደላቸው ግዜ መጠናቀቃቸውን ክትትልና ቁጥጥር ሊያደርግ

ተ.ቁ	የአዲት አቅጣጫዎች (Audit issues)	የመመዘኛ መስፈርት (Evaluating criteria)
	ፕሮጀክቶች የታቀዱ ተግባራት በታቀደው ጊዜ ውጭ መጠን መከናወናቸውን ለማረጋገጥ ወቅታዊ ወይም ተከታታይ የትግበራ አፈፃፀም ክትትል የሚደረግበት የአሰራር ስርዓት መዘርጋቱን እና ተግባራዊ መደረጉን መግምገም	ይገባል፡፡ ምንጭ፡- የፌዴራል መንግስት አስፈጻሚ አካላት አዋጅ ቁጥር 1263/2014 ገጽ 13792/አገራዊ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ የሚኒስትሮች ምክርቤት የአፈጻጸም ክትትልና ግምገማ መመሪያ ጥር 9.2018 ገጽ 11 2.2. የፕላንና ልማት ሚኒስትር መ/ቤቱ የመንግስት ፕሮጀክቶች በታቀደላቸው ውጭ(በጀት) መጠናቀቃቸውን ክትትልና ቁጥጥር ሊያደረግ ይገባል ፡፡ ምንጭ፡-የፌዴራል መንግስት አስፈጻሚ አካላት አዋጅ ቁጥር 1263/2014 ገጽ 13792/አገራዊ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ የሚኒስትሮች ምክርቤት የአፈጻጸም ክትትልና ግምገማ መመሪያ ጥር 9.2018 ገጽ 11 2.3. የፕላንና ልማት ሚኒስትር መ/ቤቱ የመንግስት ፕሮጀክቶች እና ፕሮግራሞችን በመከታተል እና በመገምገም ቢያንስ በየዓመት ውሩ የአፈጻጸም ሪፖርቶች በማዘጋጀት ለሚመለከተው አካል ሊቀርብ ይገባል፡፡ ምንጭ፡-የፌዴራል መንግስት አስፈጻሚ አካላትን ስልጣንና ተግባር መወሰኛ አዋጅ 1263/2014 ገጽ 13793 2.4. የፕላንና ልማት ሚኒስትር መ/ቤቱ የመንግስት ፕሮጀክቶች ከተጠናቀቁ በኋላ የድህረ ትግበራ ግምገማ ሊደረግባቸውና ለሚመለከታቸው አካላት ሪፖርት መቅረቡን ክትትልና ቁጥጥር ሊያደርግ ይገባል ፡፡ ምንጭ፡- የፌዴራል መንግስት ፕሮጀክቶች አስተዳደር እና አመራር ስርዓትን ለመደንገግ የወጣ አዋጅ ቁጥር 1210/2012 ገጽ 12714 2.6. የፕላንና ልማት ሚኒስትር መ/ቤቱ የፕሮጀክቶች ክትትልና ግምገማ መመሪያ ሊዘጋጅና በሚመለከታቸው አካላት ሁሉ ተግባራዊ ሊደረግ ይገባል፡፡ ምንጭ፡- የፌዴራል መንግስት ፕሮጀክቶች አስተዳደር እና አመራር ስርዓትን ለመደንገግ የወጣ አዋጅ ቁጥር 1210/2012 ገጽ 12713 2.7. የፕላንና ልማት ሚኒስትር መ/ቤቱ የፕሮጀክቶች አዋጭነት ጥናት መመሪያ ሊዘጋጅና በሚመለከታቸው አካላት ሁሉ ተግባራዊ መደረጉን ክትትልና ቁጥጥር ሊያደረግ ይገባል፡፡ ምንጭ፡- የፌዴራል መንግስት ፕሮጀክቶች አስተዳደር እና አመራር ስርዓትን ለመደንገግ የወጣ አዋጅ ቁጥር 1210/2012 ገጽ 12713 2.8. የፕላንና ልማት ሚኒስትር መ/ቤቱ የፕሮጀክቶች የትግበራ ዕቅድ፣ ክለሳና ድህረ ትግበራ መመሪያ በማውጣት በፈጻሚ ተቋማት ተግባራዊ መደረጉን ክትትልና ቁጥጥር ሊያደርግ ይገባል፡፡ ምንጭ፡- የፌዴራል መንግስት ፕሮጀክቶች አስተዳደር እና አመራር ስርዓትን ለመደንገግ የወጣ አዋጅ ቁጥር 1210/2012 ገጽ 12713 2.9. የፕላንና ልማት ሚኒስትር መ/ቤቱ የመንግስት ፕሮጀክትና ፕሮግራሞችን በአስፈጻሚ አካላት ዝቅተኛ አፈጻጸም ያላቸውን በመገምገም ግብረመልስ ሊሰጣቸው ይገባል፡፡ ምንጭ፡- የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ የሚኒስትሮች ምክርቤት የአፈጻጸም ክትትልና ግምገማ መመሪያ ጥር 9.2018

ተ.ቁ	የአዲት አቅጣጫዎች (Audit issues)	የመመዘኛ መስፈርት (Evaluating criteria)
		ገጽ 27 2.10. ፕላንና ልማት ሚኒስትር መ/ቤቱ ለአስፈጻሚ ተቋማት በየደረጃቸው የአቅም ግንባታ እና የቴክኒክ ድጋፍ ሊያደርግላቸው ይገባል፡፡ ምንጭ:- የፌደራል መንግስት አስፈጻሚ አካላት አዋጅ ቁጥር 1263/2014 ገጽ 13792
	3. የፕላንና ልማት ሚኒስትር መ/ቤቱ የመንግስት ፕሮጀክቶችና ፕሮግራሞች መረጃዎችን በቴክኖሎጂ የታዘዘ የመረጃ አያያዝ ስርዓት ከባለድርሻ አካላት (አስፈጻሚ አካላት) ጀምሮ ወጥ የሆነ የመረጃ አያያዝ እና ስርዓት ቀልጣፋና ውጤታማ አፈፃፀም እንዲኖራቸው ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር ተቀናጅተው ለመስራት የሚያስችል የአሰራር ስርዓት መዘርጋቱን እና ተግባራዊ መደረጉን መገምገም	3.1 የፕላንና ልማት ሚኒስትር መ/ቤቱ ማንኛውም ፕሮጀክት አስፈፃሚ አካል የሚተላለፈውን ፕሮጀክት ከጽንሰ ሀሳብ ጀምሮ እስከ ትግበራ ድረስ የሚያሳይ ዝርዝር መረጃ የሚይዝበት ዘመናዊ መረጃ ቋት ውስጥ መያዛቸውን ሊያረጋግጥ ይገባል፡፡ ምንጭ:- የፌደራል መንግስት ፕሮጀክቶች አስተዳደር እና አመራር ስርዓትን ለመደንገግ የወጣ አዋጅ ቁጥር 1210/2012 ገፅ 12714 3.2. የፕላንና ልማት ሚኒስትር መ/ቤቱ አስፈጻሚ ተቋማት የመንግስት ፕሮጀክቶችና ፕሮግራሞችን የሚመለከቱ መረጃዎች በየጊዜው በተለያዩ የመገናኛ ብዙሀንና ድረገጽን በመጠቀም ለሀብረተሰቡ ተደራሽ ሊደረግ ይገባል፡፡ ምንጭ:- የፌደራል መንግስት ፕሮጀክቶች አስተዳደር እና አመራር ስርዓትን ለመደንገግ የወጣ አዋጅ ቁጥር 1210/2012 ገፅ 12714 3.4. የፕላንና ልማት ሚኒስትር መ/ቤቱ የመንግስት ፕሮጀክቶችና ፕሮግራሞችን የሚመለከታቸውን ባለድርሻ አካላትን በማቀናጀትና በማሳተፍ በጋራ ሊገመግምና ግብረመልስ ሊሰጥ ይገባል፡፡ ምንጭ:- የፌደራል መንግስት አስፈጻሚ አካላት አዋጅ ቁጥር 1263/2014 ገጽ 13792//አገራዊ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ የሚኒስትሮች ምክርቤት የአፈጻጸም ክትትልና ግምገማ መመሪያ ጥር 9.2018 ገጽ 29.

Office of the Federal Auditor General

አባሪ 3 : የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት ከእቅድ በላይ የተከለሰ

ተ.ቁ	የፕሮጀክቱ ስም	የሚገኝበት ቦታ (ክልል፣ ዞን እና ልዩ ቦታ)	ፕሮጀክቱ የተጀመረበት ጊዜ	ፕሮጀክቱ የሚጠናቀቅበት ጊዜ	መጀመሪያ ለፕሮጀክቱ የተመደበ ገንዘብ (በቢሊየን ብር)	ከተከለሰ በኋላ አጠቃላይ የተመደበ ገንዘብ (በቢሊየን ብር)	ከውል በላይ የተከለሰ የብር መጠን በቢሊየን ብር	ከውል በላይ የተከለሰ የብር መጠን በፕሮጀክት
1.	ታለቁ ህዳሴ የውሃ ኃ/ማ/ፕሮጀክት	ቤንሻንጉል ጉምዝ	12/30/2010	9/8/2025	78.27	235	156.7	200
2.	ኮይሻ የውሃ ኃ/ማ/ፕሮጀክት	ደቡብ (ኮይሻ ኮንታ)	3/28/2016	5/18/2028	59.43	143.9	84.47	151
3.	አይሻ-2 የንፋስ ኃ/ማ/ፕሮጀክት	ሱማሌ (አይሻ)	2/25/2016	9/27/2025	5.54	10.32	4.78	86
4.	አሉቶ የእንፋሎት ኃ/ማ/ፕሮጀክት	ኦሮሚያ አዳሚቱ	10/1/2014	9/30/2024	2.39	5.91	3.52	147
5.	አሰላ የንፋስ ኃይል ማመንጫ	ኦሮሚያ ኢተያ	12/17/2020	1/13/2025	5.5	8.08	2.58	47
6.	በቆጂ እና ደብረታቦር 230 ኪ.ቮ. የማከፋፈያ እና የማስተላለፊያ ፕሮጀክት	ኦሮሚያና አማራ	3/3/2023	7/7/2024	1.55	1.94	0.39	25.2
7.	የጫካ ፓርክ የኃይል አቅርቦት ፕሮጀክት	አዲስ አበባ	7/4/2023	6/30/2024	0.2	0.38	0.18	90
8.	የኮተቤ ግቢ ፕሮጀክት	አዲስ አበባ	10/5/2022	11/16/2024	0.65	0.74	0.09	14
9.	የባህርዳር- ወልዲያ ኮምቦልቻ የኃይል ማከፋፈያ እና የማስተላለፊያ ፕሮጀክት	አማራ ክልል	8/30/2019	12/31/2024	5.25	13.47	8.22	157
10.	ቡታጀራ ወራቤ 132 ኪ.ቮ የኃይል ማስተላለፊያ ፕሮጀክት	ማዕከላዊ ኢትዮጵያ (ቡታጀራ ወራቤ)	6/20/2022	12/30/2023	0.52	0.64	0.12	23
11.	አዘዞ ጭልጋ፣ መቱ ማሻ፣ ፊንጫ ሻንቡ	ደቡብ፣ አማራ እና ኦሮሚያ ክልሎች	2/25/2016	8/31/2024	1.14	2.97	1.83	160
12.	የአዋሽ - ወልድያ ባቡር መስመር ኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት ፕሮጀክት	አፋር እና አማራ	4/28/2021	6/30/2024	1.08	1.32	0.24	22

13.	ደብረማርቆስ-ቡሬ 230 ኪ.ሾ አግሮ ኢንዱስትሪ የኃይል አቅርቦት ፕሮጀክት	አማራ	4/15/2021	12/20/2023	1.66	1.83	0.17	10
14.	ገንዳርባ አግሮ ኢንዱስትሪ ኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት ፕሮጀክት	ኦሮሚያ	4/17/2021	3/1/2025	0.4	1.08	0.68	170
15.	ወይናንታ አግሮ ኢንዱስትሪ ኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት ፕሮጀክት	ሲዳማ (ይርጋለም)	4/17/2021	3/1/2025	0.32	0.49	0.17	53
16.	ደጀን-ደብረማርቆስ-አሸጎዳ- ደሴ-ሆርማት የኃይል ማስተላለፊያ ፕሮጀክት	አማራ፣ ትግራይ እና ኦሮሚያ (አምቦ)	4/15/2021	12/20/2023	0.92	1.04	0.12	13
17.	መቀሌ - ዳሎል 230 ኪሎ ቮልት የኃ.ማ.ፕ	ትግራይ እና አፋር	11/30/2018	12/20/2023	0.78	2	1.22	156
18.	ቱሉ-ካፒ የኃ.ማ.ፕ	ኦሮሚያ	10/27/2020	2/1/2025	0.11	0.29	0.18	163
19.	የማሰልጠኛ ኢንስቲትዩት እና አቅም ግንባታ ፕሮጀክት	ሐረሪ	11/1/2023	7/31/2028	1.53	2.37	0.84	55

የ ፌዴራል ዋና ኮዲተር መ / ቤት
Office of the Federal Auditor General

አባሪ 4: ከመጀመሪያው ውል በላይ ተጨማሪ በጀት የተመደበላቸው መስኖ ፕሮጀክቶች

ተ. ቁ.	የመስኖ መሰረተ ልማት ግንባታ ፕሮጀክቶች ስም እና ዝርዝር ተግባራት	ፕሮጀክቱ የሚገኝበት ቦታ	የፕሮጀክቱ ጠቅላላ ወጪ		ከውል በላይ የተከለሰ የብር መጠን	ከውል በላይ የተከለሰ የብር መጠን በፕሮጀክት
			በመጀመሪያው ፅቅድ/Original Plan/	በተከለሰው ፅቅድ/Revised Plan/		
1	የመገጭ ግድብ ግንባታ ፕሮጀክት	አማራ	2,451,953,780.00	6,434,127,429.82	3,982,173,649.82	162
2	የጊዳቦ ግድብና መስኖ ግንባታ ፕሮጀት		መረጃ አልቀረበም	መረጃ አልቀረበም	0.00	0
3	ጊዳቦ የተጨማሪ ዋና መስኖ ቦይ እና ማህበራዊ ተቋማት ግንባታ (ሎት-2)	ኦሮሚያ እና ሲዳማ	273,380,250.00	807,601,282.13	534,221,032.13	195.4
4	የጊዳቦ የመስኖ መሬት ዝግጅት(ሁለተኛ አና ሦስተኛ ቦይ) አዲስ	ኦሮሚያ እና ሲዳማ	3,600,000,000.00	መረጃ አልቀረበም	3,600,000,000.00	0
5	አርጅ-ዴዴሳ ግድብ ግንባታ እና መስኖ ልማት ፕሮጀክት	ኦሮሚያ	755,461,980.84	6,500,929,958.97	5,745,467,978.13	760
6	አርጅ ዴዴሳ ግድብ እና ተያያዥ ግንባታ	ኦሮሚያ	መረጃ አልቀረበም	መረጃ አልቀረበም	0.00	0
7	ለአርጅ ዴዴሳ ለሠፋሪዎች የመሠረተ ልማት ግንባታ	ኦሮሚያ	መረጃ አልቀረበም	መረጃ አልቀረበም	0.00	0
8	አርጅ-ዴዴሳ የመስኖ መሬት ዝግጅት	ኦሮሚያ	መረጃ አልቀረበም	መረጃ አልቀረበም	0.00	0
9	አርጅ ዴዴሳ የውሃ ማስተንፈሻ ውቅር ግንባታ		መረጃ አልቀረበም	መረጃ አልቀረበም	0.00	0
10	የዛሬማ ሜዶዴይ ግድብ ግንባታ	ትግራይ	መረጃ አልቀረበም	መረጃ አልቀረበም	0.00	0
11	የኢትዮጵያ ናይል መስኖና ድሬይቴጅ የመስኖ አውታሮች ግንባታ ፕሮጀክት		መረጃ አልቀረበም	መረጃ አልቀረበም	0.00	0
12	የታችኛው ርብ መስኖና ድሬይቴጅ አውታር ግንባታ	አማራ	1,236,634,703.45	1,236,634,703.45	0.00	0
13	የወልመል የመስኖ ልማት ፕሮጀክት		መረጃ አልቀረበም	መረጃ አልቀረበም	0.00	0
14	የወልመል የመስኖ ልማት ፕሮጀክት (ሎት-1)	ኦሮሚያ	1,440,785,901.10	1,722,099,316.82	281,313,415.72	20
15	የወልመል የመስኖ ልማት ፕሮጀክት (ሎት-2)	ኦሮሚያ	መረጃ አልቀረበም	1,882,436,901.11	0.00	0
16	የጨልጨል የመስኖ ልማት ፕሮጀክት		መረጃ አልቀረበም	መረጃ አልቀረበም	0.00	0
17	የጨልጨል የመስኖ ልማት ፕሮጀክት (ሎት-1)	ኦሮሚያ	1,640,032,348.00	3,941,164,145.05	2,301,131,797.05	141
18	የጨልጨል የመስኖ ልማት ፕሮጀክት (ሎት-2)	ኦሮሚያ	1,117,290,701.38	1,124,845,884.71	7,555,183.33	0.7
19	የላይኛው ጉደር የመስኖ ልማት ፕሮጀክት		መረጃ አልቀረበም	መረጃ አልቀረበም	0.00	0
20	የላይኛው ጉደር የመስኖ ልማት ፕሮጀክት (ሎት-1)	ኦሮሚያ	935,636,792.53	1,100,414,741.91	164,777,949.38	18
21	የላይኛው ጉደር የመስኖ ልማት ፕሮጀክት (ሎት-2)	ኦሮሚያ	2,354,915,199.96	2,801,536,555.07	446,621,355.11	19

22	የላይኛው ርብ የመስኖ ልማት ፕሮጀክት	አማራ	2,132,888,738.37	2,498,800,875.13	365,912,136.76	18
23	የካህ መስኖ ልማት ፕሮጀክት		4,257,204,608.61	መረጃ አልቀረበም	4,257,204,608.61	0
24	የካህ መስኖ ልማት ፕሮጀክት (ሎት-1)	ትግራይ	1,769,362,465.75	መረጃ አልቀረበም	1,769,362,465.75	0
25	የካህ መስኖ ልማት ፕሮጀክት (ሎት-2)	ትግራይ	2,487,842,142.86	መረጃ አልቀረበም	2,487,842,142.86	0
26	የካሊድ ጂጆ መስኖ ልማት ፕሮጀክት	ደቡብ	1,195,278,795.76	1,490,308,983.64	295,030,187.88	25
27	የአጂማ ጫጫ የመስኖ ልማት ፕሮጀክት		መረጃ አልቀረበም	መረጃ አልቀረበም	0.00	0
28	የአጂማ ጫጫ የመስኖ ልማት ፕሮጀክት (ሎት-1)	አማራ	1,265,010,979.67	1,265,010,979.67	0.00	0
29	የአጂማ ጫጫ የመስኖ ልማት ፕሮጀክት (ሎት-2)	አማራ	2,567,128,054.29	2,567,128,054.29	0.00	0
30	የአጂማ ጫጫ ግድብ እና ተያያዥ ግንባታ ሥራዎች ፕሮጀክት (Lot-3)	አማራ	1,480,395,150.21	1,466,632,864.27	-13,762,285.94	0
31	አንገር የመስኖ ልማት ፕሮጀክት		መረጃ አልቀረበም	10 ቢ.ሊ.ዮን	0.00	0
32	አንገር የመስኖ ልማት ፕሮጀክት (ሎት-1)	ኦሮሚያ	5,990,684,893.42	መረጃ አልቀረበም	- 5,990,684,893.42	0
33	አንገር የመስኖ ልማት ፕሮጀክት (ሎት-2)	ኦሮሚያ	3,997,293,805.54	መረጃ አልቀረበም	3,997,293,805.54	0
34	ኬጦ መስኖ ልማት ፕሮጀክት	ኦሮሚያ	915,701,573.72	መረጃ አልቀረበም	-915,701,573.72	0
35	የመገጭ መስኖ ልማት (የመሬት ዝግጅት) ፕሮጀክት	አማራ	መረጃ አልቀረበም	መረጃ አልቀረበም	0.00	0
36	የወይቦ መስኖ ልማት ፕሮጀክት		መረጃ አልቀረበም	መረጃ አልቀረበም	0.00	0
37	የወይቦ የመስኖ ልማት ፕሮጀክት (ሎት-1)	ደቡብ	1,404,113,759.02	መረጃ አልቀረበም0	1,404,113,759.02	0
38	የወይቦ የመስኖ ልማት ፕሮጀክት (ሎት-2)	ደቡብ	1,031,374,587.03	መረጃ አልቀረበም0	1,031,374,587.03	0
39	የጎዴ መስኖ አውታር መልሶ ግንባታ		መረጃ አልቀረበም	መረጃ አልቀረበም	0.00	0
40	የጎዴ መስኖ አውታር መልሶ ግንባታ phase-1 (2000 ሄክታር)	ሶማሊ	2,233,982,503	መረጃ አልቀረበም0	- 2,233,982,503.00	0
41	የጎዴ መስኖ አውታር መልሶ ግንባታ phase-2 (4000ሄክታር)	ሶማሊ	መረጃ አልቀረበም	መረጃ አልቀረበም	0.00	0
42	የበለስ መስኖ ልማት ማጠናቀቂያ ፕሮጀክት	አማራ	1,706,733,787.92	መረጃ አልቀረበም0	1,706,733,787.92	0
43	የአሞ-ኩራዝ መ/ል/ማጠናቀቂያ ፕሮጀክት	ደቡብ ብ/ብ/ሕ እና ደቡብ ምዕራብ	1,300,464,524.71	1,490,500,452.07	190,035,927.36	15
44	የከሰም መስኖ ልማት ማጠናቀቂያ ፕሮጀክት	አፋር	1,524,289,376.22	1,524,289,376.22	0.00	0
45	የተንዳሆ መስኖ ልማት ማጠናቀቂያ ፕሮጀክት		መረጃ አልቀረበም	መረጃ አልቀረበም	0.00	0

አባሪ 5 : በናሙና በታዩ ከመጀመሪያው ውል በላይ ተጨማሪ በጀት የተመደበላቸው የመንገድ ፕሮጀክቶች ከእቅድ በላይ የተከፈለ

	የፕሮጀክቱ ስም	በመጀመሪያው ዕቅድ በሚሊየን ብር	በተከለሰ ዕቅድ በሚሊየን ብር	ከእቅድ በላይ የተከለሰ ብር በሚሊየን	ጭማሪ የታቀደ ብር በፐርሰንት
1	ሳንሱሲ - ታጠቅ ኬላ	736.91	825.07	88.16	12%
2	የነባር መንገዶች ደረጃ ማሻሻል	168,239.81	169,775.40	1,535.59	1%
3	ፓዊ መገንጠያ - ፈንዲቃ - አይማ	1,337.72	1,543.65	205.93	16%
4	ጨከ - ይርጋጨፌ	889	894.04	5.04	0.6%
5	ይርጋጨፌ - ሀገረማሪያም	995	1,079	84.00	8.4%
6	ድሬዳዋ - ደወሌ	4,584.27	5,226.80	642.53	14%
7	ቦንጋ - ፈለገሰላም	843	904	61.00	7%
8	ጋሸና - ቢልቢላ	1,602.59	1,722.78	120.19	7.5%
9	ደጀን/ጢቅ/ - ፈለገ-ብርሃን	528	562	34.00	6.4
10	ፈለገ-ብርሃን - ዜማወንዝ ድልድይ	1,131	1,214	83.00	7.3%
11	ባህርዳር - ዜማ ወንዝ	1,237	1,333	96.00	7.8
12	አምቦ - ወሊሶ	1,264.91	1,282.45	17.54	1.2
13	እንጂባራ - ቻግኒ - ፓዊ መገንጠያ	49.64	90	40.36	81.3
14	ሙከጦሪ - ኮከብ መስክ (ሎት 1)	768.62	812.34	43.72	5.7
15	ኮንሶ - ያቤሎ	1,192.53	1,221.10	28.57	2.4
16	ፈለገሰላም - ጭዳ	834.55	902.64	68.09	8.2
17	ዱርጊ - ጊቤ ወንዝ (ሎት 2)	474.66	522.76	48.10	10.2
18	ጅንካ - መንድር	1,214.21	1,373.27	159.06	13.2
20	መንድር - ሐና (ሎት 2)	1,665	1,669	4.00	0.2
21	ቱሉ ቦሎ - ኬላ	1,309.80	1,317.69	7.89	1
22	ኢቴያ - ሮቤ	1,324.23	1,413.53	89.30	7
23	የሆሳዕና ከተማ መንገድ	304.85	380.9	76.05	25.4
24	የወልድያ ከተማ መንገድ	304.85	380.9	76.05	25.4
25	ጊንጨ- ሽኩቴ-ጨሉጤ (ሎት1፡ጊንጨ- ሽኩቴ)	898.27	1,028.30	130.03	15
26	ድንቄ - ሳውላ	1,020.18	1,037.90	17.72	2
27	ማዞሪያ - ሐዴሮ	288.25	400.45	112.20	39.5
28	ባህርዳር - ጢስእሳት	767.05	957.93	190.88	25
29	የአዲስ መንገዶች ግንባታ	415,247.47	417,349.84	2,102.37	0.6
30	ዝዋይ - አርሲ ነገሌ	3,182.98	3,308.24	125.26	4
31	አርሲ ነገሌ - ሀዋሳ	4,857.36	5,149.06	291.70	6
32	የአባይ ድልድይ መዳረሻ መንገድ እና የአባይ ድልድይ (ሎት1፡ የአባይ ድልድይ ግንባታ)	1,437.00	1,439.45	2.45	1
33	አቢአዲ - ሐውዜን - ፍሬወይኒ	874.32	968.43	94.11	11

34	ቧሂት - ድልይብዛ	947.92	958.55	10.63	2
35	አቡስ - አለም ከተማ	915.29	1,277.81	362.52	40
36	አርባምንጭ - በልታ*	562.95	581.63	18.68	3.4
37	በልታ - ኦቶሎ	511.76	689.36	177.60	35
38	ሳዉላ - ላስካ	697.73	1,079.14	381.41	54.8
39	ላስካ - ሳላይሽ	690	692	2.00	
40	አንኮበር - ዱላቻ	858.76	893.61	34.85	4
41	በጎንዲ - ወንበራ	400.6	1,578.42	1,177.82	294.5
42	አዳባ - አንገቶ	1,249.68	1,261.85	12.17	
43	አርበረከቲ - ገለምሶ	1,012.10	1,037.53	25.43	3
44	ቆቃ - አዱላላ - ደ/ዘይት	613.17	712.51	99.34	16
45	ሶዶ - ተርጫ (ሎት 1)	1,338	1,383.40	1,382.07	103
46	ገለምሶ - ሚጨታ	972.76	998.04	25.28	2.5
47	መነቤኛ - ፊንጫ - ሻምቡ	999.35	1,038.00	38.65	2.7
48	ዳዬ - ጭሪ - ናንሴቦ	1,682.28	1,771.34	89.06	5.3
49	ዶጎሎ - ከለላ	1,299.85	1,523.81	223.96	17.5
50	አሶሳ - ዳለቲ (ሎት 2)	731.58	782.77	51.19	7.1
51	አቦቦ ሚጢ ሎት(2) ኪ.ሜ76 ሚጢ - ኩቢቶ ማዞሪያ	1,298.03	1,321.51	23.48	2
52	ባቢሌ - ፊቅ (ሎት1: ባቢሌ ከተማ - ኪ.ሜ 36)	408.48	432.48	24.00	5.8
53	ባቢሌ - ፊቅ (ሎት2: ኪ.ሜ 36 - ኪ.ሜ 66)	451.21	461.42	10.21	2.1
54	ባቢሌ - ፊቅ (ሎት4: ኪ.ሜ 93 - ፊቅ ከተማ)	447.94	463.05	15.11	3.5
55	ፊቅ - ሐመሮ - ኢሚ (ሎት1: ፊቅ - ኪ.ሜ 81)	819.13	849.05	29.92	3.7
56	መካነሰላም ከተማ አስፋልት መንገድ	49.85	76.1	26.25	52.7
57	አሳይታ - አፋምቦ - ጅቡቲ ድንበር	1,518.68	1,660.42	141.74	9.4
58	ቢሾፍቱ - ጨፌ ዶንሳ - ሰንዳፋ	942	978	36.00	3.8
59	ሞጆ - መቂ	3,669.60	4,225.01	555.41	15.2
60	መቂ - ዝዋይ	2,009.63	2,132.55	122.92	6.15
61	ደብረብርሃን - አንኮበር	1,083.57	1,623.19	539.62	49.6
62	ዱለቻ - አዋሽአርባ	693.52	729.17	35.65	5.2
63	ሚዛን - ዲማ	1,031.24	1,304.44	273.20	26.5
64	ደሴ - ኩታበር - ተንታ መገንጠያ	1,545.56	1,691.79	146.23	9.5
65	ፓዌ መገንጠያ - ኪ.ሜ.69 (ሎት 1)	887.76	993.38	105.62	12
66	ሶዶ - ተርጫ (ሎት 2)	1,674.38	1,806.50	132.12	9
67	ጎንደር - ቡመራ	60	130	70.00	116.7
68	ወረታ - ፊላቂት	80	140	60.00	75
69	ጎሽጽጎን - ደጀን	60	160	100.00	166.7
70	ጎባ - ዶሎመና	20	46.35	26.35	131.75
	መቅላላ ድምር(በሚሊየን ብር)	655,639.39	667,570.10	13,267.38	27%

አባሪ 6፡ ከመጀመሪያው ውል በላይ ተጨማሪ በጀት የተመደበላቸው አዲስ አበባ ዩንቨርሲቲ የግንባታ ፕሮጀክት

	የፕሮጀክቱ ስም	የኮትራክተሩ ስም	የአማካሪ ስም	ዋና ውል	ጠቅላላ ውል	ክለሳ የተደረገበት የብር መጠን	
1	የያሬድ መብቃ ትምህርት ቤት ቀሪ የግንባታ ስራ	ኤል ኬ ኤም ኮንስትራክሽን		29,001,464.00	29,011,464.00	10,000.00	
2	የአራት ኪሎ እና የኤፍቢኤ ካፍቴርያ እድሳት	ኤል ኬ ኤም ኮንስትራክሽን		2,220,875.91	2,637,351.56	416,475.65	18.8
3	በአዲስ አበባ 2B+G+12የተማሪዎች ማደርያ	የቴክ ኮንስትራክሽን	ቦንፖዬጅ	607,996,936.13	744,798,973.85	136,802,037.72	22.5
4	የጂኦፊዚክስ ቢሮ ግንባታ	ከኤፍኤ ኮንስትራክሽን	የኢትዮጵያ እንጅነሪንግ ኮርፖሬሽን	217,068,248.14	325,698,152.86	108,629,904.72	50
5	ወክሉን የመምህራን ማደርያ ግንባታ	ቦክራ	ቦንፖዬጅ	174,453,720.45	375,766,378.07	201,312,657.62	115
6	የጥቁር አንበሳ የድገተኛ የግንባታ፣ የኤሌክትሪክ፣ የሳንቴሪ እና የመካኒካል ማጠቃለያ ስራ	ሆማ	በረከት ተስፋ	279,619,946.58	334,454,822.18	54,834,875.60	20
7	አካዳሚክ ኮፕሌክስ ግንባታ	የቴክ	በረከት ተስፋዬ	849,092,788.63	1,559,363,318.26	710,270,529.63	83.7
10	ቆሻሻ ውሃ ማስወገጃ	ኢልናፍ		33,850,000.00	45,195,220.87	11,345,220.87	33.5
11	አምስት ኪሎ ጂ+8 የቢሮ እና ለብራቶሪ ግንባታ	ጋድ	ቢይቦኔ	53,367,054.63	166,038,680.05	112,671,625.42	211
12	የጋዜጠኝነትና ማስተማሪያ ስራ ህንጻ ግንባታ	ሳቲኮን	የኢትዮጵያ እንጅነሪንግ ኮርፖሬሽን	813,827,805.95	908,191,188.05	94,363,382.10	11.6
	ጠቅላላ ድምር			3,060,498,840.42	4,491,155,549.75	1,430,656,709.33	47

አባሪ 7: ሳይከናወኑ ነገር ግን በጀት የተያዘላቸው የአዲስ አበባ የኒሽርሲቲ የግንባታ ፕሮጀክቶች ዝርዝር

ከ2014-2015ዓ.ም ለአዲስ አበባ የንሲቲ የተመደበ የብር መጠን				
		2015	2014	ጠቅላላ ደመር
1	የጂኦሌዚክስ ፣ የጠፈር ሳይንስ እና አስተራሮች ቢሮ እና የምርምር ማዕከል ግንባታ	15,000,000.00	10,000,000.00	25,000,000.00
2	ኤአይቲ ህንጻ ለመማሪያ ክፍሎች ፣ ላቦራቶሪዎች እና የቢሮ ግንባታ	15,000,000.00	8,000,000.00	23,000,000.00
3	ለስፖርት ሳይንስ የጂዎፍዚየም ግንባታ	30,000,000.00	30,000,000.00	60,000,000.00
4	የጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የድህረ ምረቃ ዶርሚቶሪ ግንባታ	40,000,000.00	50,000,000.00	90,000,000.00
5	በሳሚት ውስጥ የመኖሪያ ቤት ግንባታ	10,000,000.00	50,000,000.00	60,000,000.00
6	በዋና ካምፓስ ውስጥ የሙከራ ማእከል ግንባታ	20,000,000.00	40,000,000.00	60,000,000.00
7	የድህረ ምረቃ እና የምርምር ግንባታ ግንባታ	30,000,000.00	15,000,000.00	45,000,000.00
8	የጥርስ ህክምና ትምህርት ቤት ግንባታ	10,000,000.00	5,000,000.00	15,000,000.00
9	የንግድ እና ኢኮኖሚክስ ፋኩልቲ አጥር ሥራ	3,000,000.00	4,250,000.00	7,250,000.00
10	የንግድ ኮሌጅ አጥር ሥራ	3,000,000.00	2,500,000.00	5,500,000.00
11	ዋና ካምፓስ የውሃ መስመር እና የመሬት ቅየሳ ስራ	4,000,000.00	3,000,000.00	7,000,000.00
12	ህንፃ ለላብስ ግንባታ	15,000,000.00	5,000,000.00	20,000,000.00
13	ቢሮ ግንባታ	15,000,000.00	5,000,000.00	20,000,000.00
	ድምር	210,000,000.00	227,750,000.00	437,750,000.00

አባሪ 8

የድሬዳዋ የንብርስቲ ከ2014-2016 ዓ.ም ያልተከናወኑ ነገር ግን በጀት የተመደበላቸው የግንባታ ፕሮጀክቶች ብዛት

	የፕሮጀክት ስም	2016	2015	2014	ጠቅላላ
1	ዋና ግቢ አስተዳደር ሕንፃ ግንባታ	30,180,830.00	64,670,000.00	5,000,000.00	99,850,830.00
2	ዋና ካምፓስ ክፍል ግንባታ	10,000,000.00	28,500,000.00	45,000,000.00	83,500,000.00
3	ዋና ካምፓስ ወርክሾፕ ግንባታ	4,999,999.00	4,500,000.00	19,015,000.00	28,514,999.00
4	የገላን ማሰልጠኛ ማእከል ግንባታ	5,000,000.00	4,000,000.00	11,000,000.00	20,000,000.00
5	ዋና ካምፓስ ዶረሚቶሪ ግንባታ	15,000,000.00	7,000,000.00	14,000,000.00	36,000,000.00
6	ዋና ግቢ የእንግዳ ክፍል ግንባታ	8,100,000.00	6,000,000.00	11,000,000.00	25,100,000.00
7	ዋና ግቢ የሰብሰባ አዳራሽ ግንባታ	50,790,000.00	50,790,000.00	50,000,000.00	151,580,000.00
8	የአጥር ግንባታ	5,000,000.00	5,000,000.00	11,450,000.00	21,450,000.00
9	ዋና ካምፓስ ማሳያ ማዕከል	3,000,000.00	3,000,000.00	15,900,000.00	21,900,000.00
10	የድህረ ምረቃ ህንፃ ግንባታ (አዲስ)	25,500,000.00	25,500,000.00		51,000,000.00
11	ዋና ካምፓስ ክፍል ግንባታ	45,000,000.00			45,000,000.00
12	ዋና ካምፓስ ወርክሾፕ ግንባታ	19,015,000.00			19,015,000.00
	ጠቅላላ	221,585,829.00	198,960,000.00	182,365,000.00	602,910,829.00

አባሪ 9

ከ2013-2016 ዓ.ም ከተጠናቀቁ ከአንድ አመት እስከ ሶስት አመት ለሆናቸው በጀት በየአመቱ የሚያዝላቸው የዋቻዎ የንሸርስቲ የግንባታ ፕሮጀክቶች ዝርዝር

ተ.ቁ	የፕሮጀክቶች ስም	2013	2014	2015	2016	ጠቅላላ ድምር
1.	002 - Construction of Residential Buildings Started in 2007	75,680,000.00	110,680,000.00			186,360,000.00
2.	003 - Classroom and Seminar Hall Construction Started in 2007	30,930,000.00	36,819,900.00			67,749,900.00
3.	004 - Workshop, Laboratory and Library Construction Started in 2007	40,720,000.00	6,720,000.00			47,440,000.00
4.	005 - Administration and Office Building Started in 2007	35,750,000.00	15,750,000.00	42,300,000.00		93,800,000.00
5.	007 - Durame Campus Building	105,930,000.00				105,930,000.00
6.	011 - Seminar Hall Construction Started in 2007		15,000,000.00			15,000,000.00
7.	012 - Laboratory Construction Started in 2007		7,000,000.00			7,000,000.00
8.	013 - Library Construction Started in 2007		7,000,000.00			7,000,000.00
9.	014 - Office Building Started in 2007		15,000,000.00			15,000,000.00
10.	015 - Durame Campus Construction of Dormitory		10,000,000.00			10,000,000.00
11.	016 - Durame Campus Construction of Laundry		10,000,000.00			10,000,000.00
12.	017 - Durame Campus Construction of Classrooms		10,000,000.00			10,000,000.00
13.	018 - Durame Campus Construction of Laboratory		10,000,000.00			10,000,000.00
14.	019 - Durame Campus Construction of Dining Hall		5,000,000.00			5,000,000.00
15.	020 - Durame Campus Construction of Kitchen		5,000,000.00			5,000,000.00
16.	021 - Durame Campus Construction of Administration Building		10,000,000.00			10,000,000.00
17.	022 - Durame Campus Construction of Lounge		15,000,000.00	542,260.00		15,542,260.00
18.	023 - Durame Campus Construction of Seminar Hall		10,000,000.00			10,000,000.00
19.	024 - Durame Campus Construction of Commercial Building		10,000,000.00			10,000,000.00
20.	025 - Durame Campus Construction of General Store		5,000,000.00			5,000,000.00
21.	026 - Durame Campus Construction of Auditorium		5,000,000.00			5,000,000.00

22.	027 - Construction of Dormitories in Main Campus		100,000,000.00			100,000,000.00
23.	028 - Main Campus Construction of Seminar Hall		10,000,000.00			10,000,000.00
24.	030 - Main Campus Construction Student Lounge		5,000,000.00			5,000,000.00
25.	031 - Main Campus Construction Teachers Lounge		5,000,000.00			5,000,000.00
26.	035 - Main Campus Construction Laundry		3,000,000.00			3,000,000.00
27.	036 - Main Campus Construction Lecture Hall		5,000,000.00			5,000,000.00
28.	038 - Main Campus Construction of Administration Building		11,000,000.00			11,000,000.00
29.	010 - Treatment Plant Construction			11,773,380.00	10,380,000.00	22,153,380.00
30.	011 - Fountain & Land Scape Works			45,380,620.00		45,380,620.00
31.	012 - Batana River Bridge Work			2,043,710.00	1,710,000.00	3,753,710.00
32.	015 - Durame Campus Student Bedroom Drainage and Septic Tank			8,568,680.00	4,940,000.00	13,508,680.00
33.	016 - Construction of Durham Campus Stadium and Volleyball Stadium		400,000.00			400,000.00
34.	027 - Construction of Dormitories in Main Campus			1,900,000.00	4,940,000.00	6,840,000.00
35.	032 - Main Campus Construction Auditorium			18,940,000.00	2,940,000.00	21,880,000.00
36.	034 - Main Campus Construction General Store			18,940,000.00		18,940,000.00
37.	035 - Construction of G + 2 building and hospital site work			5,940,000.00		5,940,000.00
38.	036 - Kitchen, toilet and water tank for doctors on duty in Health Science			6,660,000.00	1,110,000.00	7,770,000.00
39.	037 - Construction of Agricultural Research Station in the main compound			4,000,000.00	1,050,000.00	5,050,000.00
40.	038 - Main Campus Construction of Administration Building			4,100,000.00	6,130,000.00	10,230,000.00
41.	039 - Construction of a student dormitory building at Durham Campus			16,940,000.00		16,940,000.00
42.	046 - Construction of a teachers' quarters in Hosanna (new)			13,650,000.00	6,620,000.00	20,270,000.00
43.	047 - Construction of dining hall and kitchen in the main campus (new)			15,620,000.00	2,760,000.00	18,380,000.00
44.	048 - Emergency and Outpatient Building Construction (New)			23,760,000.00	20,940,000.00	44,700,000.00
45.	050 - Construction of a dormitory building on the main campus (new)			15,000,000.00	9,440,000.00	24,440,000.00
46.	038 - Main Campus Construction of Administration Building				8,000,000.00	8,000,000.00

አባሪ 10

ከ2013-2016 ዓ.ም ከተጠናቀቁ ከአንድ አመት እስከ ሶስት አመት ለሆናቸው በጀት በየአመቱ የሚያዝላቸው የወላይታ ሶዶ ዩንቨርሲቲ የግንባታ ፕሮጀክቶች ዝርዝር

ተ.ቁ	ወላይታ ሶዶ ዩንቨርሲቲ የፕሮጀክቱ ስም	2013	2014	2015	2016	ጠቅላላ ድምር
1.	035 - Main Campus Teachers and Student Cafeteria		10,000,000.00			10,000,000.00
2.	015 - Construction of Otona Campuse Administration Building	10,300,000.00				10,300,000.00
3.	028 - Main Campus Student Recreation Center Construction		3,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	13,000,000.00
4.	016 - Otona Campus Clinic Construction	13,220,000.00				13,220,000.00
5.	027 - Slougher House Construction For Teaching Purpose		5,794,373.50		10,000,000.00	15,794,373.50
6.	029 - Main Campus Presidents Residence Construction		4,058,300.00	15,000,000.00		19,058,300.00
7.	017 - Main Campus Fuel Station Construction			10,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00
8.	020 - Main Campus Road Construction		21,275,000.00	11,500,000.00	7,108,289.28	39,883,289.28
9.	019 - Bodity Research Center Clss room Construction		19,994,200.00	20,000,000.00	10,000,000.00	49,994,200.00
10.	002 - Otona Campus Research Laboratory Construction		51,840,090.01			51,840,090.01
11.	013 - Main Campuse Dining Hall	44,975,820.00	8,000,000.00			52,975,820.00
12.	016 - Construction of Teachers Resident inOtona Campuses			33,000,000.00	20,000,000.00	53,000,000.00
13.	002 - Main Campus Laboratory Construction	55,896,891.50				55,896,891.50
14.	012 - Tercha Campus Construction	88,211,520.57				88,211,520.57
15.	002 - Otona Campus Research Laboratory Construction		51,840,090.01	30,000,000.00	10,000,000.00	91,840,090.01
16.	014 - Research Centers in Abela	31,400,000.00	46,227,561.38	39,000,000.00	15,000,000.00	131,627,561.38
17.	007 - Main Campus Class Rooms and Library Construction	62,142,033.18	35,730,800.00	35,000,000.00	32,283,913.56	165,156,746.74
18.	009 - Construction of Teachers Resident in Main and Otona Campuses	113,625,828.95	67,245,131.00	34,905,165.08	34,905,165.08	250,681,290.11
19.	008 - Main Campus Dormitory and Student and Teacher Lounge Construction	47,400,000.00	87,987,200.00	45,000,000.00	105,787,308.56	286,174,508.56
20.		802,812,094.20	980,668,145.90	637863815.1	480227986.3	2,901,572,041.50

አባሪ 11: መጠናቀቅ ከሚገባቸው ግዜ በላይ ከ 1 እስከ 7 **አመት የፈጁ የመንገድ ፕሮጀክቶች**

	Project Name	Implementation egion(specific area)	Started month and year	End month and year	de
1	shashemene-bishanguracha - hawassa	oromia/sidama	november,2017	march,2020	5
2	sansusi-tatek-kella	oromia	november,2017	april,2022	3
3	jimma-agaro-dedesa river	oromia	january,2019	july,2023	2
4	addis-sebeta-holetta	oromia	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
5	addis-chancha-fiche	oromia	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
6	Upgrading existing roads				
7	shashemene-halaba	oromia/snnp	february,2021	february,2024	1
8	aseb Corridor (Meldon Intersection - Manda - Bure)	afar	october,2020	june,2024	1
9	ginir-gode(lote-1;ginir-boqol)	oromia	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
10	alemgena-botajjira-sodo(lote- 1;alemgena-botajjira)	oromia/snnp	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
11	alemgena-botajjira-sodo(lote- 2;botajjira-areka-sodo)	SNNP	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
12	arbaminch-wozeka-konsso-jinka(lote- 1;arbaminch-konsso)	SNNP	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
13	arbaminch-wozeka-konsso-jinka(lote- 2;konsso-jinka)	SNNP	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
14	robe-goro-sofumer-ginir intersection	oromia	january,2023	january,2024	0
15	meqenejo-nejjo-mendi-assosa(lote- 1;meqenejo-mendi)	oromia	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
16	ginir-godie(lote-2:bokole-qerude)	oromia/somalia	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
17	meqenejo-nejjo-mendi-assosa(lote- 2;mendi-assosa)	oromia/benishang ul	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
18	ginir-gode(lote-3:qerude-godie	oromia/somalia	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
19	Gedo — Menebegna	oromia	october,2019	december,2023	0
20	mintamir-metehbila-metehara	amhara/oromia	october,2017	may,2023	2
21	bedele-metu(lote-1)	oromia	september,2017	september,2024	1
22	durgi-gibie river(lote-1)	SNNP	may,2021	may,2023	2
23	ambo-woliso	oromia	november,2019	february,2023	1
24	aefeson-mehalmeda	amhara			
25	muketuri-kokobe mesk(lote-1)	oromia/amhara	april,2017	june,2023	2
26	konsso-yabelo	oromia/snnp	january,2015	on renewale	
27	melkasa-sodere-nurahera-metehara intersection	oromia	june ,2018	november,2024	1
28	bilbila-sekota	amhara	june,2015	december,2021	4
29	durgi-gibie river(lote-2)	SNNP	august,2017	december,2022	3
30	jinka-mender	SNNP	january,2016	april,2023	3
31	Nekempte - Bure (Lot 1)	oromia	december,2020	december,2023	2

32	Nekempte - Bure (Lot 3)	oromia/amhara	december,2020	july,2024	1
33	diredawa-melkajebdu	dire dawa			0
34	tulubolo-kela	oromia/snnp	october,2017	october,2023	2
35	Hamusit — Estie	amhara	february,2020	march,2024	1
36	eteya-robe-seru(lote-1:eteya-robe)	oromia	november,2017	june,2023	2
37	robe-gasera-ginir;(lote-1:robe-gasera)	oromia	november,2017	on renewale	0
38	hossaina town road	SNNP	january,2023	august,2024	1
39	woldiya town road	amhara	fabruary,2017	may,2024	
40	Gore - Masha — Tepi	oromia/snnp	january,2019	march,2024	1
41	tepi-mizan	southwest	january,2018	june,2023	2
42	drie-masha(lote-1:gimbo-k.m62)	SNNP			0
43	ginchie-shekute	oromia	april,2017	may,2022	3
44	Sodo — Dinke	SNNP	may,2018	march,2023	2
45	Jimma - Chida	oromia	march,2021	march,2025	2
46	azezo gonder	amhara	october,2017	february,2023	2
47	kokob mesk-alemketema	amhara	august,2019	september,2023	2
48	mekaneyesus/este-smada	amhara	february,2019	february,2023	2
49	shekute-chulutie(lote-2)	oromia	december,2019	september,2022	3
50	dembi dolo-mugi-gambela (lote-1)	oromia	june,2021	may,2024	1
51	robe-gassera-ginir(lote-2:gassera-ginir)	oromia			0
52	harar-kombolcha-aejersa goro-fugnanbira-bombas	dire dawa	january,2019	february,2022	3
53	merewa-somodo-seka and somodo limu intersection spur	oromia	september,2019	september,2023	3
54	adele-girawa	oromia	february,2020	february,2023	3
55	tercha-woldehana-werebo(lote-1)	southwest	june,2021	september,2023	2
56	tercha-weldehana-omonada intersection(lote-2:werebo-gona-omonada)	oromia/snnp	february,2020	february,2024	1
57	diredawa-shnlie and Dredawa city alternative road	dire dawa/somalia	october,2020	october,2023	2
58	bahirdar-tis esat	amhara	december,2019	september,2024	
59	Gonji-Kolella/Tore-adisalem	amhara	april,2020	december,2022	2
60	Diri Masha (Lot 2: KM 62-Masha)	SNNP	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	
61	Negele Borena-Doloodo - Melka Suftu(Lot 1:Negele Borena -KM 60)	oromia/somalia	march,2021	march,2024	1
62	Saka - Atnago - Alge - Seyo - Shenen - Guder (Lot 2: Seyo - Shenen - Guder)	oromia	december,2020	december,2023	2
63	Nejo-Jarso-Begi - Yayo / South Sudan border (Lot 1: Nejo- 70 km)	oromia	december,2020	december,2024	1
64	kombolcha-mekaneselam	amhara	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
65	Mekaneselam-Abay River Bridge-Gindwein	amhara	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	1

66	Saka - Atnago - Alge-Syo - Shenen - Guder (Lot 1: Saka - Atnago - Syo)	oromia	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	
67	Nejo-Jarso-Begi-Yayo/South Sudan border (Lot 2: 70 km - Yayo/South Sudan border)	oromia	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
68	Negele Borena-Doloodo - Melka Suftu (Lot 2: Hagle - Filtu)	somalia	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
69	Negele Borena-Doloodo - Melka Suftu (Lot 3: Filtu - Km. 93)	somalia	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
70	Saka-Atnago-Alge-Syo-Shenen-Guder (Lot 3: Ambo City and Ambo-Guder City Road)	oromia	march,2021	marche,2024	1
71	Agaro-gera-medabo	oromia	february,2021	february,2025	1
72	Wacha-Maji (Lot 1: Wacha-Jemu)	SNNP	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
73	gilgel beles-dibate-wombera	amhara	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
74	Goba-Dolomena-Ngele Borena/Biteta/ (Lot 1: Goba-km.-130)	oromia	january,2023	january,2027	0
75	Goba-Dolomena-Ngele Borena/Biteta/ (Lot 2: Km. 130 - Km. 200)	oromia	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
76	New Road Construction and Expressways				
77	Zeway-Arsi- Negelle-10035290	oromia	february,2018	october,2024	1
78	Arsi-Negelle-Hawassa-10035291	oromia	february,2018	march,2023	2
79	Abay-Briedge-Distenation- AbayBridge.Lot.1-10035437	amhara	july,2019	23-Jun	2
80	Adama -Awash-Express way Lot.2	oromia	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
81	Awash-Meiso-10035531	oromia	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
82	Meiso-Dire-Dawa	oromia/diredawa	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
83	Awash-Arba-Semera-Express way	afar	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
84	Con.1: Awash forty-km118))				
85	Semera-Elidar-Belho Expressway (con. 1: Semera-km90)	afar	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
86	Abay-Briedge-Distenation- AbayBridge.Lot.2	amhara	september, 2022	march, 2024	1
87	Adura-Akobo and Adura-Burbe	gambela	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
88	Sawla-kako (con 2)	SNNP	april ,2022	march, 2024	1
89	Dabat-Ajre-Karaqar-Mutalangus (con. 1 Dabat-Ajre)	amhara	september, 2017	november, 2023	6
90	Debark-Buhit	amhara	may, 2021	january,2023	2
91	Salaish — Omo	SNNP	october, 2021	october, 2023	2
92	Omo/Sai-Maji	southwest	february, 2017	february,2023	2
93	Bojaber-Werabe	SNNP	september,2020	september,2023	2
94	Ankober — Dulecha	amhara	february,2016	april,2019	2
95	Isid-Kong/kuba -Begondi	benshangul	june,2020		2

96	Debrebirhan — Ankober	amhara	september,2019	december,2023	6
97	Shebele — Emi	somali	july,2021	on contract extension	0
98	Asphalting-Roads-That-Passes-Towns	all regions	october,2013	to be continued	0
99	Gambela - Abebo -KM-100	gambela	october,2018	january,2023	6
100	Dulecha-Awash-Arba	amhara/afar	augest,2016	may,2023	5
101	Assosa - Daleti- Cont.1	benshangul	december,2017	april,2020	4
102	Adaba-Angeto	oromia	november,2014	november,2023	5
103	Arberekti - Gelemso	oromia	may,2015	እየታደሰ ነው	2
104	Omo - Turmi	SNNP	augest,2017	augest,2020	5
105	Sodo Tercha Lot.1	SNNP	may,2015	november,2018	7
106	Gelemso-Micheta	oromia	november,2016	እየታደሰ ነው	0
107	Belese-River-Mekanebirhan	amhara	may,2016	እየታደሰ ነው	0
108	Sodo-Tercha Lot.2/OmoRiver-Tercha /	southwest	may,2015	እየታደሰ ነው	0
109	Menebegna - Finca — Shamb	oromia	june,2017	december,2023	2
110	Quiha — Maymekden	tigray		december,2020	
111	Alem-Ketema — Degolo	amhara	march,2017	december,2024	5
112	Degolo — Kelela	amhara	march,2017	april,2023	4
113	Asosa - Daleti- Cont.2	benishangul	july,2017	march,2022	4
114	Abobo-Mite lot.2 Km.76 Mite Kubito-Junction	southwest	october,2019	february,2025	2
115	Abomsa - Asko - Dibu Rive	oromia	august,2022	may,2025	1
116	Afdera - Erbeti- Junction-Km.48 Con.1	afar	may,2017	february,2023	4
117	KM.48-Ertale- Junction-Ahemedela Con.2	afar	may,2017	december,2022	3
118	warder-qebridgehar	somali	may,2019	june,2023	2
119	Kunzela Junction - Flora-Zega-Holticulture	amahara	january,2018	january,2025	3
120	Bole -Abomsa-Junction - Wterdino-Horticulture	oromia	october,2017	እየታደሰ ነው	0
121	Debat-Ajiry-Keraker-Ketema-ngus-Con.2	amhara	september,2018	february,2023	4
122	Aikel - Zufan- Angereb-Km-69-Con.2	amhara	june,2017	october,2020	5
123	Metema-Abirahajira	amhara	october,2017	april,2021	4
124	Gngnang - Gikawo- Lare	gambela	may,2019	may,2023	2
125	Mekaneselam -Town- By Pass-Road	amhara	october,2016	june,2024	1
126	Hayq - Bitsema — Chifra	amhara/afar	december,2019	march,2024	1
127	Kelela — Aqista	amhara	january,2019	january,2021	4
128	Debre Markos-Elias — Kuch	amhara	september,2019	may,2023	2
129	Dermi — Shakiso	oromia	october,2019	october,2023	2
130	Edo - Surafeta — Warka	oromia	january,2021	december,2022	3
131	Bilalo - Qersa - Arisi-Negele	oromia	august,2021	may,2023	2
132	Shishinda — Tepi	southwest	october,2018	february,2024	2

133	Hawela - Tula - Welerares-Yayo-Werachc	sidama/oromia	october,2020	april,2024	1
134	Koshe - Mito - Werabe -Tere-Bilalo-Lot.1	SNNP	october,2020	october,2023	2
135	Fisaha-Genet-Kele-Soyama-Segen-Gebel-Beno-Lot.2	SNNP	may,2020	may,2023	2
136	Yabelo-Town- ByPass-Road	oromia	december,2019	march,2022	3
137	Itang - Wankey — Mera	gambela			0
138	Jijiga-Fefen-Gelalesh-Deghemed-Km.55-165+220-Lot.2	somali	september,2020	march,2024	1
139	Gode - Hargele -Km.100-Lot.1	somali	april,2017	october,2024	1
140	Assayita-Afambo-Djibouti-Border	afar	august,2019	may,2023	1
141	Tarmaber - Mehalmeda-Sup.-Different.2	amhara	november,2018	february,2023	1
142	Gihur-Zemero-Degolo- Were Eilu-Guguftu-Lot.2	amhara	august,2018	january,2023	2
143	Gimba — Tenta	amhara	september,2020	september,2023	2
144	Morka - Girka — Chenchä	SNNP	march,2019	september,2023	2
145	Kemir Dengay-Guna	amhara	october,2020	january,2023	2
146	Gishen-Junction - Km.14	amhara	may,2020	february,2023	2
147	Bishoftu - Chefe Donsa-Senedafa	oromia	november,2019	may,2023	2
148	Jigjiga - Tuli — Lowanja	somali	october,2018	january,2023	2
149	Musel - Koru - Teru-Lot.1	afar	february,2019	december,2022	3
150	Omorate - Omo- Kangaken	SNNP	january,2019	february,2023	2
151	Addis Alem-Mygeba-Mytemen	tigray			0
152	Gamebela-Abobo-Gog-Dima-Km.72-Km.100-Lot.2	gambela	july,2020	july,2023	2
153	Fik-Segeg-Gerbo-Denen-Lot.3	somali	july,2020	january,2024	1
154	Fik-Hamero-Imi-Km.81-Imi-Lot.2	somali	october,2018	january,2023	2
155	Gode - Qelafo-Lot.1	somali	march,2020	september,2023	2
156	Tenta-Junction -Wegelten-Kurba	amhara	february,2019		2
157	Dengoro - Kingi — Mekebel	oromia	january,2019	november,2022	3
158	Deberberhan -Deneba-Lami	amhara/oromia	october,2020	november,2023	2
159	jigiga-fafen-gelalshe-Degehamedo-Segeg-Con.4	somali	july,2019	december,2023	2
160	Cherti-Hagera-Mkore-Kundi-Goredamole-Lot.3	somali	january,2022	january,2024	1
161	Nekemt-Soge-Kamashi-Konco-Km.105-160-Lot.2	oromia/benishangul	march,2021	march,2024	1
162	Pawe Junction-Hidassee Gideb (Lot 2: k.m 69-Hidassee Gideb	benishangul	december,2020	december,2023	2
163	Gode - Hargele -Km.100-Lot.1	somali			0
164	Holti- Culture-Dev't- Junction- Road	oromia/snnp/amhara	noveember,2020	november,2023	2
165	Musel-Kuru-Turu-Lot.2	afar	february,2019	march,2023	2

166	Debremarkos-Degutzion-Mota (Lot 1 Debremarkos-km60)	amhara	january,2023		0
167	Arsi-Robe- Agarfa Ali Lot.2	oromia	september,2021	september,2025	0
168	Omo-Maji -Omo-Sayi-Lot.2	SNNP	december,2020	december,2023	0
169	Yaso-Galaso-Dibate-Cageni-Km.100-Lot.2	benishangul/amhara	november,2020	november,2024	0
170	Nekmet-Soge-Kamash-Concho (Lot 1 Nekmet-km105)	oromia	november,2020	february,2025	1
171	Tenta-Gashena (lot2:-Kurba Junction-Chegoma-gashena)	amhara	december,2020	october,2024	1
172	Debremarkos-De/Elias-Temcha-kuch-Ayehu-Zegem-Chagni (lot3:-Kuch - Ayehu-Ambela)	amhara	may,2021	may,2024	1
173	Hamosha- Hedase- Gedebe-Lot.1	benishangul	july,2021	january,2025	1
174	Shke-Husen-Jara-delo-sebro	oromia	october,2021	march,2025	1
175	Guliso-Chalia-Dila-Khandila-Begi (Lot 1: Guliso - 70 km)	oromia	february,2021	february,2025	1
176	Wolde- Hana-Durgi	SNNP	january,2023		0
177	Kobo-Kulmusk-Lalibela(Lot 2: Lalibela-Muja)	amhara	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
178	Dembcha-Fresbet-Adet-Lot.1	amhara	january,2021	october,2023	2
179	Desi City Alternate Road	amhara			0
180	Metu-Town-Alternative-Road	oromia	february,2021	february,2023	2
181	Mehalmeda-Gasherabel-Mekoy-Milamile-Km.64-Lot.1	amhara	july,2021	july,2024	1
182	Durbete-Kunzela-Gelago-Metma-Km.85-Lot.1	amhara	august,2021	february,2025	1
183	Durbete-Kunzela-Gelago-Metma-Km.170-Lot.3	amhara	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
184	Durbete-Kunzela-Gelago-Metma (lot 3: Gelago genda wha)	amhara	july,2021	january,2025	1
185	Dangela — Jawi	amhara	june,2021	december,2024	1
186	Banasha- Achamo	SNNP	april,2021	may,2023	2
187	Dima-Bero-Kibish/km 90/-F4F6 road junction/ (Lot1: Dima-Bero-Kibish/km 90)	sidama	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
188	Daye-Gircha-Melka Desta and Meleya-Mojo	sidama	december,2020	december,2023	2
189	Alaba Angecha Wato	SNNP	december,2020	december,2023	2
190	Tewodros City-Galego-Guba (Lot 1: Galego-km60)	amhara	march,2021	march,2024	1
191	Jega-Kuarite-Arebe-Gebya-Gesh-Abaye-Tilili-Lot.2	amhara	november,2020	november,2023	2
192	Tongo-asosa	benishangul	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0

193	Bulehora-Shakiso-Shakiso (Lot 1: Shakiso-Km 70)	oromia	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
194	Jigjiga-City- ByPass-Road	somali	may,2021	may,2023	2
195	Jhur-Zemero-Degolo-Wareilu-Guguftu (Lot 1:- Jhur-Zemero-Degolo)	amhara	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
196	Metema-Abirahajira-Masero-Dembi-Sanja-Lot.2	amhara	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
197	Durgi-Gibe River-Omo Nada (Lot 3:- Gibe River-Omo Nada)	oromia	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
198	Teodoros City-Gelago-Guba (Lot 2: Teodoros City-Gelago-100 km)	amhara	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
199	Fik-Segeg-Gerbo-Denan-Lot.1	somali	may,2021	october,2024	1
200	Fik-Segeg-Gerbo-Denan-Lot.2	somali	june,2021	december,2024	1
201	Dubti-Arisa-Adigala-Biyogobob-Con.2	afar/somali	may,2021	may,2024	1
202	Dubti-Arisa-Adigala-Biokbob Con.3	afar			0
203	Dembi Dolo- Gambella Lot 2	oromia/gambele	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
204	Zalambesa-Alitena and Marwa-Edegahamus (Lot 2: Marwa-Edegahamus)	tigray	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
205	Dembecha-Feresbet-Adet-Lot.2	amhara	july,2021	july,2024	1
206	Mahalmada-Gasherabel-Mekoi-Milamile (Lot 2: Tor mesria/Km 64-Milamile)	amhara	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
207	Dima-Bero-Kibish/Km 90-F4F6 Road Intersection/ (Lot 2: Kibish/Km 90-F4F6 Road Intersection)	SNNP	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
208	Fisehagenet-Kele-Soyama-Segen-Gebelbeno-Lot.3	SNNP	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
209	Dila-Bule-Harwecho-Shakiso (Lot 2: Harwecho-Shakiso)	oromia	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
210	Homosha - Hadase Dam - Guba/Mankush City (Lot 2: 70 km - Hadase Dam - Guba/Mankush City)	benishangul	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
211	Guliso - Chalia - Dila - Kandila - Begi (Lot 2)	oromia	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
212	Alamata-Chelena-Merewa-Tsetre-Dela (Lot 2: 65 km--Tsetre-Dela)	amhara/tigray	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
213	Gimbi - Gui - Alge - Mettu (Lot 2: KM 70-Metu)	oromia	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
214	Gog - Jor - Akobo (Lot 2)	gambela	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
215	Bulehora - Shakiso - Bulehora (Lot 2: km 72/Bule Kero-Bulehora)	oromia	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
216	Sodo Tercha Lot.3	SNNP	january,2023	january,2024	1
217	Morka - Gircha - Xencha-Kano (Lot 2: Xencha-Kano and Girchi - Izo Spur Road)	SNNP	january,2023	january,2024	1
218	Hamusit — Este	amhara	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0

19	Hagaio-Sigmo-Sylem-Leka-Becho-Metu (Lot 1: Hagayo-Sigmo-Sylem)	oromia	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
220	Halaba-Siraro-Shamana-Irba intersection	oromia	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
221	Gerhusenai-Ahrom/Siro	tigray	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
222	Sekota-Amdework-Tekeze-Ebnat-Addis Era (Lot 1: Ebnat-Addis Era-72)	amhara	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
223	Bati-Medina-Harawa-Bora-Kemise	amhara	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
224	Kasa-Treasury-Azena-Ambla	amhara	november,2021	december,2024	1
225	Hawasa-Loke-Hantacho-Chkoko	SNNP	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
226	Aleta Wondo- Feferi Kela-Dila	SNNP	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
227	Hosanna- Jajura-Gimbchu-Jacho	SNNP	january,2023	january,2024	1
228	Filtu-moyale	somali	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
229	Ibantu/Hindi/-Ayana-Galila-Haro Limu-Yasso	oromia	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
230	Phnom Penh-Giko-Dobrar-Rek	gambela	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
231	Tolta-Galilea-Lasca and Excursion-Wubhamer Sp	SNNP	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
232	Adola-Melka Sadata- Harenfama	oromia	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
233	Gendesheno-Ejere-Gundomesres-Woleka-Kaydshini (Lot 1: Gendesheno-Ejere-Gundomesres)	oromia	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
234	Maksenet-Balsa-Kola Hamusit-Shaha-Abadi Intersection (Lot 1: Maksenet-Balsa-Kola Hamusit)	amhara	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
235	Chobera-Chherchera-Gudumu (Lot1)	southwest	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
236	Bure-Gomer Road Project and Bure Industrial Park Access Road	amhara	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
237	Hodja Dure-Goro-Kenate	oromia	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
238	Kofele-Kore- Bokoji and RC Negele-Karsa junction	oromia	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
239	Deghamedo-Deghabur	somali	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
240	Adigudem-Dengolat-Geget-Yechla	tigray	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
241	Birki-Haikmashaal-Astbi Megdeni	tigray	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
242	Nyngang-Too/Ongonge/	gambela	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
243	Semera-Yalo-Mhoni-Daghsagh (Lot 1: Semera-Yalo - KM 172)	afar	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
244	Chobera-Churchura-Gudumu-Bale-Waka (Lot 2: Bale-Waka)	SNNP	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
245	Gog-Jor-Akobo (Lot 3: Angela-Janka-Akobo)	gambela	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
246	Maksenet-Balsa-Kola Hamusit-Shaha-Abadi Intersection (Lot 2: Kola Hamusit-Km 180)	amhara	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0

247	Sekota-Amdework-Tekeze-Ebnat-Addis Mezma (Lot 2: km 72-Tekeze-km 140)	amhara	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
248	Entoto Observatory Center	oromia/a.a	22-Dec	december,2024	0
249	New				
250	Ethio-Sudan Road Corridor Development		መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
251					
252	(Phase 1: Construction of Paloch-Matang-Mayut-Pagak Road)				
253	Asgori-Dondi				0
254	Heavy maintenance of roads				
255	Gibe — Jimma	oromia/snnp	october,2018		0
256	Debremarkos-Bahardar (Lot 1: Debremarkos-Fnote Selam)	amhara	july,2022	july,2024	1
257	Meqi-shashemene	oromia/snnp	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
258	Modernization of road signs (standardization in important places and road safety works)	all regions	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
259	qore - Gibe River (Lot 3)	oromia/snnp	august,2021	august,2024	1
260	Woldya — felaqit	amhara	november,2019	january,2024	1
261	Awash-qulbi-Diredewa (Km 00-Km 69) (Lot 1)	diredawa	april,2021	april,2024	1
262	Awash-qulbi-Diredewa (Km 139-Km 222) (Lot 3)	oromia	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
263	Dedesa Bridge 1-Yembero-Bedele	oromia	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
264	Gedo-Nekmet-Meqenejo	oromia	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
265	Tongo-gidami	oromia	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
266	Mile-galafi	afar	january,2020	january,2024	1
267	Kombolcha town alternate road	amhara	june,2021	december,2023	2
268	Dodola-sebsbe -washa-robe	oromia	june,2020	april,2023	2
269	Aposto-Agresalam	sidama		መረጃው አልቀረበም	0
270	Bonga-Bure-Gambela-Itang-Jikao	gambela	july,2021	መረጃው አልቀረበም	0
271	Metu - Bure — Bonga	oromia/snnp		መረጃው አልቀረበም	0
272	Reconstruction of the destroyed road near the towns of yetnora and Wojel	amhara	july,2022	july,2024	1
273	Addis-qore/Sebeta-qore/qon 2	oromia	august,2021	august,2024	1
274	Awash-qulbi-Diredewa (Km 69-Km 139) (Lot 2)	oromia	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
275	Awash-qulbi-Harar-Diredewa (Kkm 222-M 290) (Lot 4)	oromia/diredawa	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
276	Gohetsion-Dejen	oromia/amhara	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
277	Wacha — mizan	southwest	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
278	Debremarkos-Bahardar (Lot 2: Fnote Salam-Dangla)	amhara	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0

279	Debremarkos-Baherdar (Lot 3: Dangla-Baherdar)	amhara	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
280	aweragodana — bole	oromia	december,2021	december,2022	3
281	Dessie-Waja (LOT 1 Dessie-Hayek -Wechale)	amhara			0
282	Butajira-Zeway	snnp/oromia	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
283	Mendi-Dalati	oromia/benishangul	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
284	Meno-Fejej	snnp	september,2022	september,2024	1
285	Wukro-Adigrat-Zalambasa	tigray	2022		0
286	Hagemariam — Yabelo	oromia	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
287	New		መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	
288	Dese-Waja (Lot 2: Wuchale-Waja)	amhara	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
289	Asosa-Kurmuk	oromia/benishangul	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
290	Gidami — Mugi	oromia	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
291	Gojeb River — Bonga	southwest	መረጃው አልቀረበም	መረጃው አልቀረበም	0
292	Building and strengthening bridges				
293	Qubi Bridge	somali	april,2022	april,2023	
294	Dawa Bridge	somali	2021	መረጃው አልቀረበም	0
295	Tekeze River Bridge/Humera/	tigray	2021	መረጃው አልቀረበም	0
296	Mreb River Bridge / Adiabun - Mreb /	tigray	2021	መረጃው አልቀረበም	0

የፌዴራል ዋና ኮዲተር መ/ቤት
Office of the Federal Auditor General

አባሪ 12: የመስኖ ፕሮጀክት መጠናቀቅ ከሚገባቸው ጊዜ በላይ የፈጁ እና መረጃ ያልቀረበ ፕሮጀክቶች ዝርዝር መረጃ

ተ.ቁ.	የመስኖ መሰረተ ልማት ግንባታ ፕሮጀክቶች ስም እና ዝርዝር ተግባራት	ፕሮጀክቱ የሚገኝበት ቦታ	የተጀመረበት ጊዜ/የመነሻ ውል ጊዜ	የሚጠናቀቅበት ጊዜ (መጨረሻ በፀደቀ የውል ማራዘሚያ ጊዜ)	መጠናቀቅ በሚገባው ጊዜ ሳይጠናቀቅ የቆየበት ጊዜ በአመት
1	የመገጭ ግድብ ግንባታ ፕሮጀክት	አማራ	መጋቢት 2005 ዓ.ም	ህዳር 2018 ዓ.ም.	መረጃ አልቀረበም
2	የጊዳቦ ግድብና መስኖ ግንባታ ፕሮጀት		የካቲት 2011 ዓ.ም	ታህሳስ 2015 ዓ.ም.	2
3	ጊዳቦ የተጨማሪ ዋና መስኖ ቦይ እና ማህበራዊ ተቋማት ግንባታ (ሎት-2)	አሮሚያ እና ሲዳማ	የካቲት 2011 ዓ.ም	ታህሳስ 2015 ዓ.ም.	2
4	የጊዳቦ የመስኖ መሬት ዝግጅት(ሁለተኛ እና ሦስተኛ ቦይ) አዲስ	አሮሚያ እና ሲዳማ	ታህሳስ 2023 (2016 E.C)	ታህሳስ 2025 ዓ.ም. (2018 E.C)	መረጃ አልቀረበም
5	አርጅ-ዴዴሳ ግድብ ግንባታ እና መስኖ ልማት ፕሮጀክት	አሮሚያ	የካቲት 2003 ዓ.ም.	ሰኔ 2017 ዓ.ም.	1
6	አርጅ ዴዴሳ ግድብ እና ተያያዥ ግንባታ	አሮሚያ	የካቲት 2003 ዓ.ም.	ሰኔ 2017 ዓ.ም.	1
7	ለአርጅ ዴዴሳ ለሠፋሪዎች የመሠረተ ልማት ግንባታ	አሮሚያ	መረጃ አልቀረበም	መረጃ አልቀረበም	መረጃ አልቀረበም
8	አርጅ-ዴዴሳ የመስኖ መሬት ዝግጅት	አሮሚያ	መረጃ አልቀረበም	መረጃ አልቀረበም	መረጃ አልቀረበም
9	አርጅ ዴዴሳ የውሃ ማስተንፈሻ ውቅር ግንባታ		መረጃ አልቀረበም	መረጃ አልቀረበም	መረጃ አልቀረበም
10	የዛሬማ ሜዶዴይ ግድብ ግንባታ	ትግራይ	ጥቅምት 2004ዓ.ም.	ሚያዝያ 2017 ዓ.ም.	1
11	የኢትዮጵያ ናይል መስኖና ድሬይኔጅ የመስኖ አውታሮች ግንባታ ፕሮጀክት		መረጃ አልቀረበም	መረጃ አልቀረበም	መረጃ አልቀረበም
12	የታችኛው ርብ መስኖና ድሬይኔጅ አውታር ግንባታ	አማራ	ጥቅምት 2008 ዓ.ም	ሰኔ 2016 ዓ.ም.	2
13	የወልመል የመስኖ ልማት ፕሮጀክት		መረጃ አልቀረበም	መረጃ አልቀረበም	መረጃ አልቀረበም
14	የወልመል የመስኖ ልማት ፕሮጀክት (ሎት-1)	አሮሚያ	መስከረም 2012 ዓ.ም.	ሰኔ 2015 ዓ.ም.	2

15	የወልመል የመስኖ ልማት ፕሮጀክት (ሎት-2)	ኦሮሚያ	መስከረም 2012 ዓ.ም.	ሰኔ 2015 ዓ.ም.	2
16	የጨልጨል የመስኖ ልማት ፕሮጀክት		መረጃ አልቀረበም	መረጃ አልቀረበም	መረጃ አልቀረበም
17	የጨልጨል የመስኖ ልማት ፕሮጀክት (ሎት-1)	ኦሮሚያ	መስከረም 2012 ዓ.ም.	ሰኔ 2017 ዓ.ም.	1
18	የጨልጨል የመስኖ ልማት ፕሮጀክት (ሎት-2)	ኦሮሚያ	መስከረም 2012 ዓ.ም.	መስከረም 2016 ዓ.ም.	1
19	የላይኛው ጉደር የመስኖ ልማት ፕሮጀክት		መረጃ አልቀረበም	መረጃ አልቀረበም	መረጃ አልቀረበም
20	የላይኛው ጉደር የመስኖ ልማት ፕሮጀክት (ሎት-1)	ኦሮሚያ	መስከረም 2012 ዓ.ም.	ሰኔ 2016 ዓ.ም.	1
21	የላይኛው ጉደር የመስኖ ልማት ፕሮጀክት (ሎት-2)	ኦሮሚያ	መስከረም 2012 ዓ.ም.	ሰኔ 2016 ዓ.ም.	1
22	የላይኛው ርብ የመስኖ ልማት ፕሮጀክት	አማራ	መስከረም 2012ዓ.ም.	ሰኔ 2017 ዓ.ም.	1
23	የካዛ መስኖ ልማት ፕሮጀክት		ግንቦት 2020/2012	to be determined	መረጃ አልቀረበም
24	የካዛ መስኖ ልማት ፕሮጀክት (ሎት-1)	ትግራይ	መረጃ አልቀረበም	መረጃ አልቀረበም	መረጃ አልቀረበም
25	የካዛ መስኖ ልማት ፕሮጀክት (ሎት-2)	ትግራይ	መረጃ አልቀረበም	መረጃ አልቀረበም	መረጃ አልቀረበም
26	የካሌድ ጂጆ መስኖ ልማት ፕሮጀክት	ደቡብ	ጥቅምት 2013 ዓ.ም.	ሰኔ 2016 ዓ.ም.	1
27	የአጂማ ጫጫ የመስኖ ልማት ፕሮጀክት		መረጃ አልቀረበም	መረጃ አልቀረበም	መረጃ አልቀረበም
28	የአጂማ ጫጫ የመስኖ ልማት ፕሮጀክት (ሎት-1)	አማራ	ህዳር 2014 ዓ.ም.	ህዳር 2017 ዓ.ም.	1
29	የአጂማ ጫጫ የመስኖ ልማት ፕሮጀክት (ሎት-2)	አማራ	ሚያዚያ 2014 ዓ.ም.	ሰኔ 2016 ዓ.ም.	1
30	የአጂማ ጫጫ ግድብ እና ተያያዥ ግንባታ ሥራዎች ፕሮጀክት (Lot-3)	አማራ	ጥቅምት 2013 ዓ.ም.	ሰኔ 2016 ዓ.ም.	1
31	አንገር የመስኖ ልማት ፕሮጀክት		መረጃ አልቀረበም	መረጃ አልቀረበም	
32	አንገር የመስኖ ልማት ፕሮጀክት (ሎት-1)	ኦሮሚያ	ህዳር 2015 ዓ.ም.	ሰኔ 2017 ዓ.ም.	1
33	አንገር የመስኖ ልማት ፕሮጀክት (ሎት-2)	ኦሮሚያ	ህዳር 2015 ዓ.ም.	ሰኔ 2017 ዓ.ም.	1
34	ኬጦ መስኖ ልማት ፕሮጀክት	ኦሮሚያ	ጥቅምት 2014 ዓ.ም.	ሰኔ 2016 ዓ.ም.	2
35	የመገጭ መስኖ ልማት (የመሬት ዝግጅት) ፕሮጀክት	አማራ	መረጃ አልቀረበም	መረጃ አልቀረበም	መረጃ አልቀረበም
36	የወይቦ መስኖ ልማት ፕሮጀክት		መረጃ አልቀረበም	መረጃ አልቀረበም	መረጃ አልቀረበም

37	ወይቦ የመስኖ ልማት ፕሮጀክት (ሎት-1)	ደቡብ	ጥቅምት 2014 ዓ.ም.	ሰኔ 2017 ዓ.ም.	1
38	የወይቦ የመስኖ ልማት ፕሮጀክት (ሎት-2)	ደቡብ	ጥቅምት 2014 ዓ.ም.	ሰኔ 2016 ዓ.ም.	2
39	የጎዴ መስኖ አውታር መልሶ ግንባታ		መረጃ አልቀረበም	መረጃ አልቀረበም	መረጃ አልቀረበም
40	የጎዴ መስኖ አውታር መልሶ ግንባታ phase-1 (2000 ሄክታር)	ሶማሊ	ህዳር 2014 ዓ.ም.	ህዳር 2016 ዓ.ም.	2
41	የጎዴ መስኖ አውታር መልሶ ግንባታ phase-2 (4000ሄክታር)	ሶማሊ	ህዳር 2014 ዓ.ም.	ህዳር 2016 ዓ.ም.	2
42	የበለስ መስኖ ልማት ማጠናቀቂያ ፕሮጀክት	አማራ	ሚያዝያ 2014 ዓ.ም.	ታህሳስ 2017 ዓ.ም.	1
43	የኦሞ-ኩራዝ መ/ል/ማጠናቀቂያ ፕሮጀክት	ደቡብ ብ/ብ/ሕ እና ደቡብ ምዕራብ	ሚያዝያ 2014 ዓ.ም.	ሰኔ 2017 ዓ.ም.	1
44	የከሰም መስኖ ልማት ማጠናቀቂያ ፕሮጀክት	አፋር	ግንቦት 2014 ዓ.ም.	ሰኔ 2016 ዓ.ም.	2
45	የተንዳሆ መስኖ ልማት ማጠናቀቂያ ፕሮጀክት		መረጃ አልቀረበም	መረጃ አልቀረበም	መረጃ አልቀረበም
46	የተንዳሆ መስኖ ልማት ማጠናቀቂያ ፕሮጀክት	አፋር	ሰኔ 2015 ዓ.ም.	ሰኔ 2017 ዓ.ም.	መረጃ አልቀረበም
47	ዱብቲ ዳይክና የመስኖ አውታር ጥገና	አፋር	ነሐሴ 2012 ዓ.ም.	ሰኔ 2016 ዓ.ም.	2
48	የሎጊያ ግድብና መስኖ ልማት ፕሮጀክት	አፋር	መረጃ አልቀረበም	መረጃ አልቀረበም	መረጃ አልቀረበም

የ ፌዴራል ዋና ኮዲተር መ / ቤት
Office of the Federal Auditor General

አባሪ አስራ ሦስት የአሰራር ሥርዓት መግለጫ /Process Description/

ለዘመናዊ የክትትልና ግምገማ መረጃ አያያዝና አስተዳደር ስርዓት ለመዘርጋት የሚያስፈልጉ መረጃዎችን ይሰበስባል፡፡



የመረጃ አጠቃቀም ፕሮቶኮል ዝግጅት ላይ ይሳተፋል፡፡



በተጠቃሚዎች ፍላጎት መሰረት የመረጃ ክፍተት በሚታይባቸው መስኮች መረጃዎችን ይሰበስባል፡፡



መረጃ የሚያቀርቡ መ/ቤቶች ወቅቱንና ጥራቱን የጠበቀ መረጃ ማቅረባቸውን ለማረጋገጥ የመረጃ ማቅረቢያ ቅጾችና የአሞላል መመሪያ ዝግጅት ላይ ይሳተፋል፡፡

የ ፌዴራል ዋና ኮዲተር መ / ቤት
Office of the Federal Auditor General



ለአገራዊ የልማት ዕቅድ ክትትልና ግምገማ የሚያግዙ መረጃዎች ወደ መረጃ ቋት ኮድ በማድረግ ያስገባል፡፡



የግል ዘርፉን ለመከታተል የሚያስችሉ መረጃዎችን ይሰበስባል፡፡



በክትትልና ግምገማ ዙሪያ የተጠኑ ጥናቶችን ይሰበስባል፡፡



የሌሎች አገሮች የክትትልና ግምገማ የመረጃ ምንጭና አጠቃቀም እንዲሁም የመረጃ አያያዝ ልምዳቸውን ተግባራዊ ለማድረግ መረጃዎችን ይሰበስባል፡፡



ተቀምረው በተተገበሩ መልካም ተሞክሮዎች መረጃ አያያዝና አስተዳደር ስርዓቱ መሻሻሉን ለመረጋገጥ የሚረዱ መረጃዎችን ይሰበስባል፡፡



በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ እና በልማት ፕሮጀክቶች አስፈፃሚ መስሪያ ቤቶች የልማት ፕሮጀክቶችን የክትትልና ግምገማ መረጃዎችን ይሰበስባል፡፡



የመንግስት ፕሮጀክቶችን ክትትል እና ቁጥጥር ያደርጋል



በልማት ፕሮጀክቶች ክትትልና ግምገማ ዙሪያ የተጠኑ ጥናቶችን ይሰበስባል፡፡

Office of the Federal Auditor General

አባሪ 14: የተከለሱ ዶክመንቶች

- የ3 አመት የመስሪያ ቤቱ እቅድ ክንውን ሪፖርት
- መስሪያ ቤቱ የተቋቋመበት ስልጣንና ተግባር
- ከገንዘብ ሚኒስቴር፣ከመንገዶች አስተዳደር፣ከመስኖና ቆላማ ሚኒስቴር፣ በናሙና ከተወሰዱ አራት የንሸርስቲዎች ያሉ የፕሮጀክት ሰነዶችን
- በተወካዮች ምክር ቤት የወጡ የፕሮጀክቶች ክትትልና ቁጥጥር መመሪያ
- የመንግሥት የልማት ፕሮጀክቶችን ለመከታተልና ለመቆጣጠር የወጡ አዋጆችን
- በተለያዩ ሀገራት ፕሮጀክቶችን ለመቆጣጠርና ለመከታተል የሚጠቀሙትን ልምድ ተሞክሮ በመዳሰስ ወ.ዘተ



የ ፌዴራል ዋና ኮዲተር መ / ቤት
Office of the Federal Auditor General
